

INFORME PRELIMINAR

“COMISIÓN INVESTIGADORA MULTIPARTIDARIA QUE INVESTIGA LAS IRREGULARIDADES EN LAS LICITACIONES Y OBRAS REALIZADA POR EMPRESAS CHINAS”

(MOCIONES DE ORDEN DEL DÍA 2104, 2151 Y 2128)

Comisión Investigadora de todas las licitaciones públicas y contratos de obra convocadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Provías Nacional, Provías Descentralizado, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, así como el estado de ejecución de las obras contratadas, el análisis de la selección que debe contemplar la elaboración de los términos de referencia, la formación de comisión de selección, la actuación de la OSCE, y los funcionarios y exfuncionarios del Poder Ejecutivo y sus relaciones con postores y contratistas de empresas chinas, para que en el informe respectivo se determinen las presuntas irregularidades y las responsabilidades a que hubiera lugar.

MIEMBROS DE LA COMISIÓN:

CONGRESISTAS

- **Héctor Valer Pinto (PRESIDENTE)**
- **José Enrique Jerí Oré (VICEPRESIDENTE)**
- **Diego Alfonso Fernando Bazán Calderón (SECRETARIO)**
- **Miguel Ángel Ciccía Vásquez**
- **Pedro Edwin Martínez Talavera**
- **Cesar Manuel Revilla Villanueva**
- **Cheryl Trigos Reátegui**
- **Janet Milagros Rivas Chacara**

10 DE MARZO DEL 2023



INDICE

I.- INTRODUCCIÓN.....	3
II.- OBJETO DE INVESTIGACIÓN POR LA COMISIÓN INVESTIGADORA.	4
2.1 Hechos que motivaron la creación de la comisión y el inicio de la investigación	4
2.2 Conformación y reorganización de la Comisión.....	5
2.3 Periodo de la Investigación.....	6
2.4 Objetivos de la Investigación.....	6
2.5. Metodología de la Investigación.	7
2.6. Marco Legal.....	8
III.- ACTOS ADMINISTRATIVO.....	10
3.1 Oficios remitidos por la comisión investigadora.....	10
3.2 Oficios recibidos por la comisión investigadora	10
3.3 Oficios sin respuesta.....	10
IV.- ACTOS REALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR.....	10
4.1 Desarrollo de las actividades de la comisión investigadora.....	10
4.2 Sesiones ordinarias y extraordinarias realizadas	12
V.- RESUMEN DE LOS AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN	13
5.1 Proyecto/obras Contratadas por el MTC con empresas chinas y/o consorciadas con empresas Peruanas:.....	13
5.2 Proyecto/obras contratadas por Gobiernos Regionales y Locales con empresas chinas y/o consorciadas Chino- Peruanas:	15
5.3 Empresas Chinas identificadas que han contratado con el estado entre el 2018 y 2022.....	17
VI.- AUDIENCIAS Y SESIONES	13
6.1 Inicio de las Citaciones.....	18
6.2 Lunes 06 de marzo del 2023.....	19



6.3 Martes 07 de marzo del 2023.....	20
6.4 Miércoles 08 de marzo del 2023.....	21
6.5 Jueves 09 de marzo del 2023.....	21
6.6 Viernes 10 de marzo del 2023.....	22
VII.- PROYECTOS ANALIZADOS A LA FECHA	22
7.1 PROYECTO EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CASTROVIRREYNA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA.....	22
7.2 “MEJORAMIENTO CARRETERA CA-103: EM. PE-06B (SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA)-ROMERO CIRCA-LA LAGUNA-TOGOD-CATILLUC-EMP. PE-06 C (EL EMPALME)-CAJAMARCA”-SALDO DE OBRA”.....	29
7.3 SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA EMP PE 32A DV QUEROBAMBA DV SAN SALVADOR DE QUIJE PAICO SANTIAGO DE PAUCARAY ATIHUARA AUTAMA SORAS SAN PEDRO DE LARCAY EMP PE 30B SAN PABLO DE CHICHA EMP PE 30B SAN JUAN DE AYAPAMPA TOROHUICHCCAÑA PUCAHUASI SAÑAYCA EMP PE 30A DV CHACAPUENTE POR NIVELES DE SERVICIO DISTRITO DE QUEROBAMBA PROVINCIA DE SUCRE DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y APURÍMAC.....	36
7.4 SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: CHAMAYA (DV. OLMOS) - JAÉN - SAN IGNACIO - PUENTE INTEGRACIÓN (FRONTERA CON ECUADOR) / SONADOR - TABACONAS - DV. SAN JOSÉ DEL ALTO - TAMBORAPA (EMP. PE-5N) / CANCHAQUE - HUANCABAMBA.....	42
7.5 SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) - CUMBA - DV. YAMÓN - LONYA GRANDE - CAMPO REDONDO - OCALLI - PROVIDENCIA - COHECHAN - LONYA CHICO - EMP. AM-108 (DV. LUYA) / CHACHAPOYAS - RODRÍGUEZ DE MENDOZA - ABRA LAJAS / EL DORADO - SELVA ALEGRE - SORITOR - EMP. PE-5N (LA CALZADA).....	47
VIII. LIMITACIONES Y ACTOS PENDIENTES DE REALIZAR POR LA COMISIÓN.....	51
8.1 LIMITACIONES.....	51
8.2 OTROS ACTOS ADMINISTRATIVOS PENDIENTES A REALIZAR.....	52
8.3 LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DATOS A CONSIDERAR.....	53
8.4 LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS PÚBLICAS.....	53
8.5 REALIZAR LA VALORACIÓN ACUMULADA FÍSICO, ECONÓMICO Y FINANCIERO DE LOS 186 CONTRATOS.....	53
IX.- CONCLUSIONES.....	54
X.- PEDIDO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE LA COMISIÓN	55
XI.- ANEXOS.....	57



INFORME PRELIMINAR

I.- INTRODUCCIÓN

El 31 de marzo del 2022 , el Pleno del Congreso conformó la “*Comisión Investigadora de todas las licitaciones públicas y contratos de obras convocadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Provías Nacional, Provías Descentralizado, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales; así como el estado de ejecución de las obras contratadas, el análisis de la selección que debe contemplar la elaboración de los términos de referencia, la formación de comisión de selección, la actuación de la OSCE, y los funcionarios y exfuncionarios del Poder Ejecutivo y sus relaciones con postores y contratistas de empresas chinas, para que en el informe respectivo se determinen las presuntas irregularidades y las responsabilidades a que hubiera lugar*” mediante texto sustitutorio de las Mociones de Orden del Día 2104, 2151 y 2128 presentada e integrada por los congresistas Héctor Valer Pinto, quien a la fecha preside desde el 27 de diciembre del 2022, José Enrique Jerí Oré, vicepresidente, Diego Alfonso Fernando Bazán Calderón secretario, Miguel Ángel Ciccía Vásquez, Pedro Edwin Martínez Talavera, Cesar Manuel Revilla Villanueva, Cheryl Trigoso Reátegui y Janet Milagros Rivas Chacara.

Este informe preliminar está referido, a la labor que ha desarrollado la comisión desde su instalación, que fue el 05 de octubre del 2022, hasta la fecha, la cual se ha realizado de acuerdo con el plan de trabajo aprobado por la comisión en su primera sesión ordinaria realizada el día 25 de noviembre de 2022.

Así mismo informamos que pese a los múltiples factores, entre ellos la poca disposición por parte de las entidades estatales como Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Provías Nacional, Provías Descentralizada, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, a facilitar información, sumado a esta situación los cambios de gestión de los gobiernos regionales y de los gobiernos municipales que en algunos casos han conllevado a una lenta respuesta a los pedidos de información; al mismo tiempo que, la falta de personal, la carencia de oficinas adecuadas, aunado a ello, la paralización de las actividades laborales, a consecuencia de las marchas y protestas de coyuntura nacional que han impedido el normal desarrollo de las investigaciones; esta comisión, a pesar de lo anterior, ha venido recopilando suficientes datos, a través de los mecanismos de la tecnologías de información de los portales institucionales como, SEACE, SUNAT, INVIERTE.PE, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, SUNARP, RENIEC, entre otros, para el logro de los objetivos propuestos y el inicio del análisis técnico- jurídico de los 186 contratos.



II.- OBJETO DE INVESTIGACIÓN

2.1. Hechos que motivaron la creación de la comisión y el inicio de la investigación.

- ❖ Esta comisión nace a partir de la preocupación de los Congresistas del Grupo Parlamentario Acción Popular, Juan Carlos Mori Celis y Jorge Luis Flores Ancachi, y de la Congresista Patricia Chirinos Venegas del Grupo Parlamentario Avanza País, quienes dieron a conocer al Pleno sobre presuntas organizaciones criminales que se habrían establecido en el gobierno nacional liderado por el expresidente Pedro Castillo Terrones, el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva Villegas, y otros; para realizar contratos desde el año 2018 al 2021 dirigidos a diferentes empresas de nacionalidad China (como empresas individuales o en consorcios) que habrían superado los 10 mil millones de soles, la mayor parte adjudicados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y por sus organismos descentralizados como Provías Nacional y Provías Descentralizados. Cabe resaltar que los integrantes de la organización criminal que fue ofrecida por un colaborador eficaz ante el Ministerio Público serían: Segundo Alejandro Sanchez Sanchez, Fray Vásquez Castillo, Gian Castillo Gomez, el exsecretario de Presidencia Bruno Castillo, el expremier Aníbal Torres Vasquez, y el exministro de Defensa Walter Ayala Gonzales.

Asimismo, la Congresista Venegas hizo referencia que las empresas Chinas tienen como gerentes a funcionarios estatales de la República Popular China como es el caso de China Civil Engineering Construction Corporation y China CAMC Engineering CO. LTD, como en el caso de las empresas tales, quienes fueron sancionadas por el Tribunal de Contrataciones del Estado, según resolución Nro. 1674/2021/TCE/S1, por presentar información inexacta para ganar licitaciones públicas. A todas las empresas Chinas, los medios de comunicación nacional han puesto en evidencia que existiría un Club Chino de la Construcción que opera en el Perú desde el 2018. A quienes también los denominarían “Club del Dragón”, según la congresista antes mencionada.

La Congresista Chirinos Venegas, sigue precisando que el Club del Dragón habría empezado, según el presidente de la Cámara Peruana de la Construcción, Jorge Zapata, desde el Gobierno del Expresidente Martín Vizcarra. Es necesario Investigar sobre los delitos de corrupción que se vienen dando en el Poder Ejecutivo con el Club del Dragón que es un remplazo de la corrupción de Odebrecht.



- ❖ Asimismo, las noticias emitidas por diversos medios de comunicación informaron de que existían empresas chinas en consorcio con empresas peruanas que estaban extrañamente ganando licitaciones millonarias, según manifestaba la colaboradora eficaz, Sra. Karelím López Arredondo, quien habría proporcionado información a la Fiscalía respecto a los procesos de licitación y cómo estarían direccionadas a favorecer al grupo de empresas Chinas y otras empresas peruanas.
- ❖ La información presentada en los diarios “El Comercio”, “La República”, y la Revista “Caretas”, y programas periodísticos como Panorama y Cuarto Poder respecto a los presuntos nexos entre el ex Ministro Juan Silva Villegas y funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sobre actos de colusión agravada y tráfico de influencias, con el fin de beneficiar a las empresas chinas a través de las licitaciones anteriormente descritas, estarían involucrando a los gobiernos del expresidente Martín Vizcarra Cornejo hasta el gobierno del expresidente Pedro Castillo Terrones.
- ❖ También impulsó la conformación la denuncia de empresarios locales, quienes en algunas regiones, provincias y distritos municipales proveyeron de servicios laborales, alquileres de maquinarias, equipos, así como el aprovisionamiento de materiales de construcción, no habiendo sido pagados por las empresas chinas o consorcios Chinos- Peruanos; por haber sido subcontratados, por lo que, no fueron reconocidos las valorizaciones de avance de obras, económicos y financieros, según afirmó en el programa Panorama y en la primera audiencia y sesión de esta comisión la Sra. Sheily Arlequín Segura Esteban, Gerente General de VLV Servicios Generales SAC, Sub Contratista del CONSORCIO VIAL PUCAHUASI.

2.2 Conformación y reorganización de la Comisión.

- ❖ El 05 de octubre del 2022, se elige y se instala la mesa directiva de esta Comisión Investigadora, aprobada con 06 votos a favor quedando integrada de la siguiente manera:
 - Presidente: Congresista Revilla Villanueva Cesar Manuel
 - Vicepresidente: Congresista José Enrique Jeri Ore.
 - Secretario: Congresista Diego Alonso Bazán Calderón.



- ❖ Según el Acta de la segunda sesión ordinaria de esta comisión realizada 16 de diciembre del 2022, se dio cuenta de la renuncia irrevocable, del Presidente de esta Comisión, Congresista Manuel Revilla Villanueva.
- ❖ En la Primera Sesión Extraordinaria de fecha 27 de diciembre del 2022, teniendo como único punto de agenda, la elección del presidente de esta comisión, los congresistas Miguel Ángel Ciccía Vásquez, Pedro Edwin Martínez Talavera, Diego Alfonzo Bazán Calderón y José Enrique Jerí Oré, proponen para presidirla, al Señor Congresista Héctor Valer Pinto, y al no haber otra propuesta adicional se procedió a votar la elección del nuevo Presidente, votando a favor y por unanimidad siete señores, ocupando el cargo de Presidente el Congresista Héctor Valer Pinto.

2.3 Período de la Investigación.

El período de investigación el cual es materia de investigación abarca desde el año 2018 hasta el 2022, teniendo como plazo de 120 días útiles para el desarrollo de esta comisión investigadora.

2.4 Objetivos de la Investigación.

Los objetivos de la presente investigación son los siguientes:

- a. Investigar las licitaciones públicas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y de sus órganos públicos descentralizados; así como de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales en todo lo relacionado a los contratos del MTC, para verificar si hubo irregularidades en su adjudicación.
- b. Investigar la situación actual tanto física, económica y financieramente de las obras contratadas por el MTC con las empresas chinas o el consorcio chino – peruano, a fin de verificar si existe perjuicio para el Estado peruano.
- c. Analizar la elaboración de los términos de referencia que permitieron las licitaciones y contrataciones de las empresas chinas o consorcio chino – peruano y si estas fueron direccionadas para favorecer a estas empresas.
- d. Investigar la formación de la comisión del comité de los procesos de selección relacionadas a las licitaciones y contrataciones de las empresas chinas o consorcio chino-peruano.



- e. Indagar la actuación del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, en éstas licitaciones y contrataciones del MTC y sus organismos descentralizados, en vez de las empresas chinas y consorcio chino – peruano.
- f. Determinar presuntas responsabilidades administrativas, civiles y penales de los funcionarios o servidores públicos que mediante sus actos de acción u omisión hubiesen causado perjuicio al estado.
- g. Precisar e informar al Congreso de la República sobre el hallazgo de otros contratos ajenos al sector del MTC con las empresas Chinas y consorcios Chinos-Peruanos

2.5 Metodología de investigación

La metodología de investigación es la de participación inductiva y deductiva con herramientas de historias de vida, visitas de campo, lectura y análisis de fuentes primarias y secundarias, así como, de instrumentos estadísticos.

Esta metodología nos permitirá obtener información privilegiada, abierta y cerrada y a partir de ella conseguir elementos que encaminen a calificar la conducta de las partes que suscribieron los contratos, así como, las personas vinculadas a los suscribientes, con quienes determinaremos las responsabilidades constitucionales, penales, administrativas y civiles. También nos permitirá obtener el avance físico y la ejecución presupuestal y el desembolso económico por parte del Estado a los ganadores de los contratos

En este sentido, manteniendo la reserva del tema de la investigación, se realizaron las siguientes actividades:

- a. Obtención de información de los procesos de selección a través de la plataforma del SEACE, Invierte Pe.
- b. Compilación y formación de seis expedientes físicos de los documentos del expediente de contratación de contratos con la empresa China Railway N° 10 Engineering Group Limited.
- c. Obtención de información, a través de pedidos de información a las entidades involucradas en la investigación, sobre el proceso de proyectos adjudicados a empresas chinas y consorcios chino – peruano entre el periodo del 2018 al 2022 a las siguientes entidades:
 - Ministerio de Transporte y Comunicaciones
 - Provías Nacional
 - Provías descentralizado
 - Gobiernos regionales y Locales.



- Contraloría General de la Republica
 - Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE
- d. Elaboración de Oficios, citaciones, para llevar a cabo las sesiones ordinarias y extraordinarias, elaboración preguntas para los citados comparecientes en las sesiones efectuadas por los congresistas integrantes de la comisión investigadora.
- e. Recepción de las declaraciones de invitados y comparecientes; en las sesiones ordinarias y extraordinarias, con carácter de reservada, que se han llevado a cabo por la comisión investigadora.
- f. Elaboración del informe mediante el cual se realiza la descripción de los hechos acreditados por cada objetivo desarrollado, determinación de la presunta comisión de ilícitos y actos incurridos por los investigados, estableciéndose las conclusiones y recomendaciones, las que serán remitidas a las entidades pertinentes para que tomen las acciones que correspondan.

2.6 Marco Legal.

A. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1993.

Artículo 97º.- El congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. Es obligatorio comparecer, por requerimientos, ante las comisiones encargadas de tales investigaciones, bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial.

Para el cumplimiento de sus fines, dichas comisiones pueden acceder, a cualquier información, la cual puede implicar el levantamiento del secreto bancario y el de reserva tributaria; excepto la información que afecte la intimidad personal. Sus conclusiones no obligan a los órganos jurisdiccionales.

Artículo 102º. Son atribuciones del Congreso:

(...)

2. Velar por el respeto de la Constitución y de las leyes, y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores.

(...)



B. REGLAMENTO DEL CONGRESO.

Función del Control Político

Artículo 5. La función del control político comprende la investidura del Consejo de Ministros, el debate, la realización de actos e investigaciones y la aprobación de acuerdos sobre la conducta política del Gobierno, los actos de la administración y de las autoridades del Estado, el ejercicio de la delegación de facultades legislativas, el dictado de decretos de urgencia, la declaratoria de regímenes de excepción y la fiscalización sobre el uso y la disposición de bienes y recursos públicos, el cumplimiento por el Presidente de la República del mensaje anual al Congreso de la República y el antejuicio político, cuidando que la Constitución Política y las leyes se cumplan y disponiendo lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores.

Clases de Comisiones

Artículo 35º.- Existen cuatro clases de comisiones:

(...)

b) Comisiones de Investigación; encargadas del estudio, la investigación y el dictamen de los asuntos puestos en su conocimiento, en aplicación del artículo 97º de la constitución política. Gozan de las prerrogativas y las limitaciones señaladas en dicha norma constitucional y el presente reglamento.

(...)

El Procedimiento de Investigación

Artículo 88. El Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público, promoviendo un procedimiento de investigación que garantice el esclarecimiento de los hechos y la formulación de conclusiones y recomendaciones orientadas a corregir normas y políticas y/o sancionar la conducta de quienes resulten responsables, de acuerdo con las siguientes reglas:

a) Las Comisiones de Investigación se constituirán por solicitud presentada mediante Moción de Orden del Día. Para su admisión a debate y aprobación sólo se requiere el voto aprobatorio del treinta y cinco por ciento (35%) de los miembros del Congreso. Integrarán la Comisión entre cinco y nueve congresistas, propuestos por el Presidente del Congreso, respetando hasta donde sea posible el pluralismo y proporcionalidad de los Grupos Parlamentarios. A fin de garantizar el debido proceso, se evitará que la integren quienes hayan solicitado su constitución.

(...)

C. DECRETO SUPREMO N° 082-2019-EF

Texto Único Ordenado De La Ley N° 30225 Ley De Contrataciones Del Estado.



D. DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF

Reglamento De La Ley N° 30225 Ley De Contrataciones Del Estado.

III.- ACTOS ADMINISTRATIVOS

3.1 Oficios remitidos por la Comisión investigadora

A la fecha se han cursado 114 oficios a diferentes instituciones, como al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Provías Nacional, Provías descentralizado, Contraloría General de la Republica, Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, gobiernos locales y regionales, entre otras instituciones, a fin de que remitan la información necesaria que servirá para llevar a cabo la investigación solicitada por acuerdo del Pleno del Congreso de la Republica. (Ver anexo 01 Listado de Oficios cursados por Comisión investigadora solicitando información)

3.2 Oficios recibidos por Comisión investigadora

A la fecha se han recibido 47 las respuestas a los pedidos de información, como respuesta a las solicitudes de información por parte de la comisión investigadora, donde en algunos casos las respuestas han sido de manera parcial y en otros casos la información está siendo enviada de manera paulatina (Ver Anexo: 02)

3.3 Oficios sin respuesta.

A la fecha, existen 60 oficios de solicitud de información que no han tenido respuestas de ningún tipo. (Ver Anexo. 03).

IV.- ACTOS REALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR.

4.1 Desarrollo de las actividades de la comisión investigadora

Las actividades que la comisión ha desarrollado hasta el momento se pueden dividir en 4 etapas como lo describimos a continuación:

ETAPA 1



“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Nº	ETAPAS	DIAS HABILES	INICIO	FIN
1	ETAPA 1 - Conformación de Equipo	30	05-oct-22	21-nov-22
1.1	Acondicionamiento de Oficina 1	23	05-oct-22	11-nov-22
1.2	Revisión de documentación extraoficial	26	13-oct-22	21-nov-22
1.3	Elaboración de plan de trabajo	13	05-oct-22	25-oct-22
1.4	Solicitud de Información	11	07-oct-22	21-nov-22

ETAPA 2

2	ETAPA 2 - Replanteo de Comisión	30	22-nov-22	09-ene-23
2.1	Solicitud de Información	19	22-nov-22	20-dic-22
2.2	Reiterativo de Solicitud de Información	1	20-dic-22	20-dic-22
2.3	Primera Sesión Ordinaria Aprobación del plan de trabajo (Congresista Cesar Revilla)	1	25-nov-22	25-nov-22
2.4	Segunda Sesión Ordinaria Informe de la Renuncia del Presidente de la Comisión (Congresista Jose Jeri)	1	16-dic-22	16-dic-22
2.5	Primera Sesión Extraordinaria Elección del Presidente de la Comisión (Congresista Jose Jeri)	1	21-dic-22	21-dic-22
2.6	Informe Interno de Avance de la Comisión	5	22-dic-22	29-dic-22
2.7	Traslado de Oficina de la comisión al despacho del Congresista Hector Valer Pinto	3	03-ene-23	05-ene-23
2.8	Tercera Sesión Ordinaria Informe detallado de la situación en la que se encuentra la comisión (Congresista Hector Valer Pinto)	1	06-ene-23	06-ene-23
2.9	Equipamiento parcial de la Oficina	5	03-ene-23	09-ene-23

ETAPA 3

3	ETAPA 3 - Recaudación de Información	30	10-ene-23	20-feb-23
3.1	Investigación de Contratos en SEACE	25	10-ene-23	12-feb-23
3.2	Investigación de Contratos en INVIERTE.PE	22	16-ene-23	14-feb-23
3.3	Investigación de empresas en SUNAT	20	20-ene-23	16-feb-23
3.4	Investigación de empresas en SUNARP	17	26-ene-23	17-feb-23
3.5	Análisis de Contrato 1 - Consorcio Bellavista	12	03-feb-23	17-feb-23
3.6	Análisis de Contrato 2 - Consorcio Pucahuasi	12	03-feb-23	17-feb-23
3.7	Análisis de Contrato 3 - Consorcio Cajamarca	12	03-feb-23	17-feb-23
3.8	Pedido de Información Adicional	14	01-feb-23	17-feb-23
4.8	Incorporación de Ing. Civil por destaque de Contraloría	1	17-feb-23	



ETAPA 4

4	ETAPA 4 - Consolidación de Información	30	21-feb-23	03-abr-23
4.1	Consolidación de información por frentes de Trabajo, MTC, Gobiernos Regionales y Locales	14	21-feb-23	10-mar-23
4.2	Consolidación de Información en cuadros Estadísticos	20	28-feb-23	03-abr-23
4.3	Consolidación de Expedientes de Investigación	22	03-mar-23	03-abr-23
4.4	Tercera sesión Extraordinaria Continua Citación a personal Clave 1 (Congresista Hector Valer Pinto)	5	06-mar-23	10-mar-23
4.5	Cuarta sesión Extraordinaria Continua Citación a personal Clave 2 (Congresista Hector Valer Pinto)	4	14-mar-23	17-mar-23
4.6	Elaboración de informe preliminar	16	21-feb-23	14-mar-23
4.7	Aprobación de Informe Preliminar	14	15-mar-23	03-abr-23

4.2 Sesiones ordinarias y extraordinarias realizadas

La comisión ha realizado en total 07 sesiones según siguiente detalle:

1. Sesión de Instalación (05 de octubre de 2022)
Se llevó a cabo la instalación y elección de la mesa directiva de la comisión investigadora.
2. Primera sesión ordinaria (25 de noviembre de 2022)
Se llevó a cabo la presentación y aprobación del plan de trabajo.
3. Segunda sesión ordinaria (16 de diciembre de 2022)
Informe sobre la renuncia del presidente de la comisión, congresista Cesar Manuel Revilla Villanueva.
4. Primera sesión extraordinaria (27 de diciembre de 2022)
Se lleva a cabo la elección del nuevo presidente de la comisión investigadora, congresista Héctor Valer Pinto.
5. Tercera sesión ordinaria (06 de enero de 2023)
Informe detallado del estado situacional en que se encontraba la comisión.
6. Segunda sesión extraordinaria (04 de febrero de 2023).
Informe del trabajo desarrollado y próximas acciones a realizar.
7. Tercera sesión extraordinaria continuada (06 al 10 de marzo de 2023)
Se llevó a cabo el inicio de las declaraciones de los primeros citados.



V.- RESUMEN DE LOS AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN

Hasta la fecha, la Comisión ha realizado 06 sesiones (03 sesiones ordinarias y 03 sesiones extraordinarias). Las sesiones estuvieron orientadas a informar acerca de los oficios remitidos, oficios recepcionados, y de la información recopilada, así mismo deliberar acerca de la concurrencia de los ciudadanos, gerentes, representantes legales, funcionarios y ex funcionarios públicos, que han tenido que ver con el tema materia de investigación.

A la fecha como resultado de la investigación se ha determinado que existen 186 proyectos que han sido adjudicados a empresas chinas o consorcios chino peruanos, sobre los cuales se está en la fase de recopilación de información:

Cuadro A - Número de contratos por Entidad


N°	SECTOR	CANTIDAD DE CONTRATOS
1	MTC	99
2	GOBIERNOS REGIONALES	55
3	OTROS MINISTERIOS	32
TOTAL		186

Elaboración: Propia de la Comisión Investigadora
Fuente: Plataforma del SEACE


5.1 Proyecto/obras contratadas por el MTC con empresas chinas y/o consorcio Chino Peruanas:

Los cuadros 1,2 y 3 que líneas abajo se grafican, es el resumen de los contratos que a la fecha se han encontrado por el trabajo realizado por la comisión, que han sido adjudicados por el MTC con empresas Chinas y consorcios Chino-Peruano. Por lo cual se viene trabajando en la investigación de la situación física, económica y financiera de estos contratos; así como poder evidenciar algunas posibles irregularidades en los diferentes procesos o indicios de favorecimiento por parte del Estado a las empresas Chinas o consorcios Chinos-Peruanos.

Detalle de adjudicaciones por monto y cantidad de contratos por año.

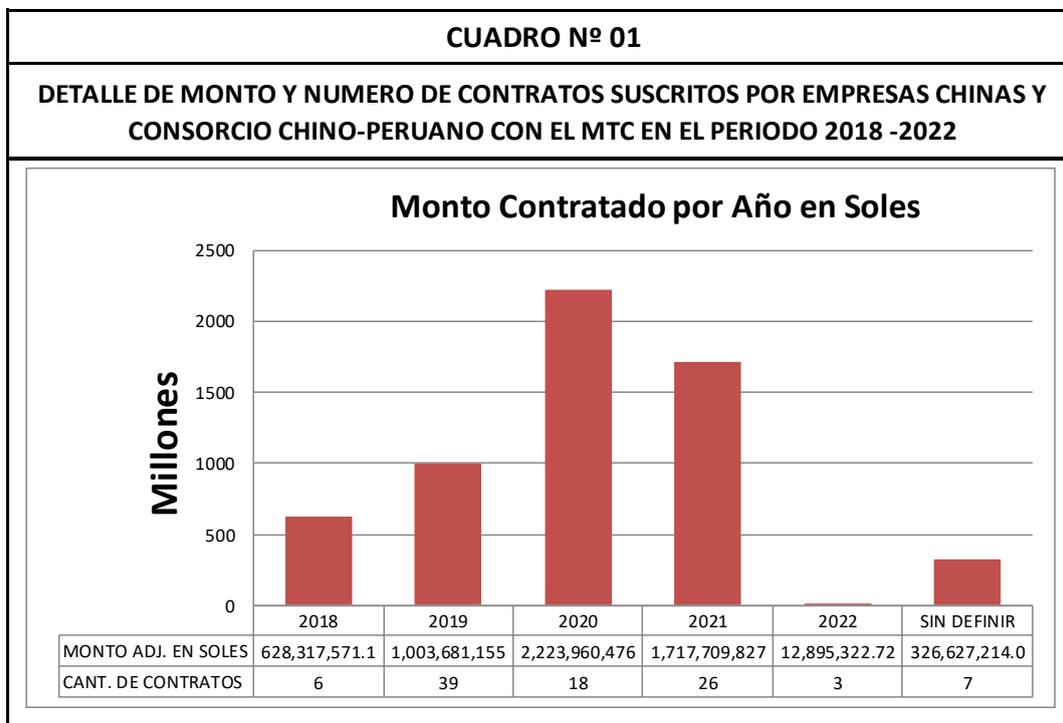

Detalle de adjudicaciones por monto en soles, unidad ejecutora y cantidad de contratos

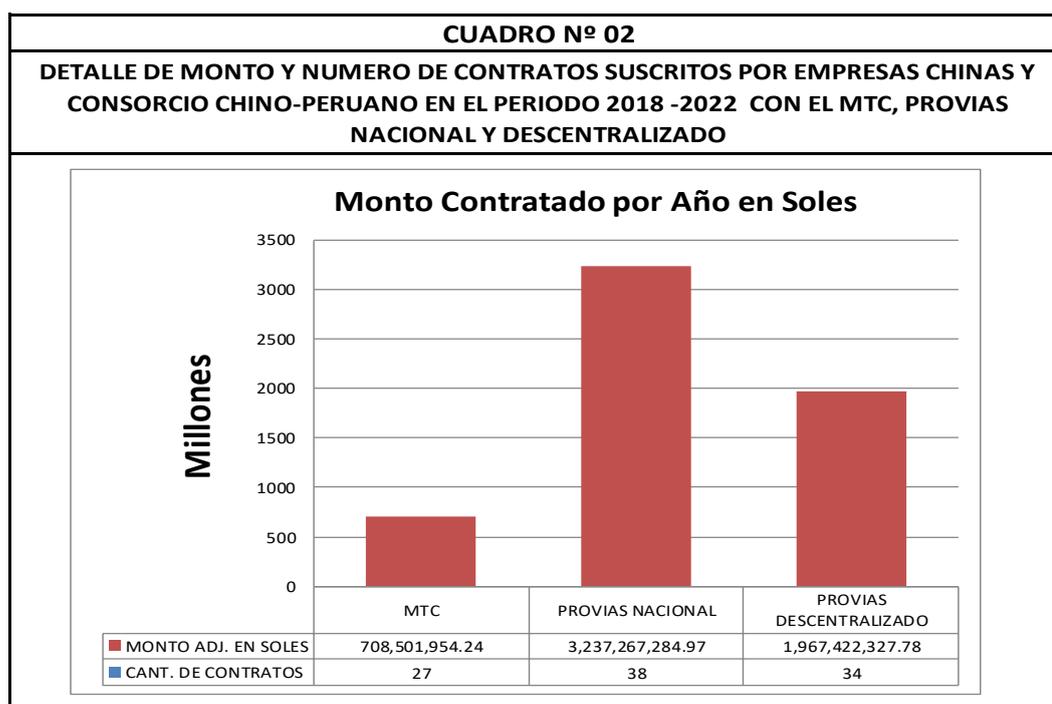




“Comisión Investigadora multipartidaria que investiga las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por empresas Chinas”

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Detalle de adjudicaciones del Ministerio de Transporte de Transporte y Comunicaciones por regiones

ADJUDICACIONES MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES						
PROVINCIA	ENTIDAD CONTRATANTE			PROYECTOS 2018-2022	ADJUDICACIONES	DOLARES
	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	PROVIAS NACIONAL	PROVIAS DECENTRALIZADO	TOTAL	MONTO EN SOLES	\$ 3.80
	S					
MADRE DE DIOS	0	0	1	1	S/ 7,693,263.21	\$ 2,024,542.95
JUNIN	0	0	1	1	S/ 51,960,769.52	\$ 13,673,886.72
TACNA	0	0	1	1	S/ 152,793,798.20	\$ 40,208,894.26
UCAYALI	1	1	0	2	S/ 7,191,861.16	\$ 1,892,595.04
HUANUCO	1	0	1	2	S/ 9,095,323.09	\$ 2,393,506.08
LAMBAYEQUE	2	0	0	2	S/ 37,592,628.12	\$ 9,892,796.87
LORETO	0	0	2	2	S/ 83,019,078.61	\$ 21,847,125.95
AREQUIPA	0	2	0	2	S/ 102,478,404.33	\$ 26,968,001.14
MOQUEGUA	0	1	1	2	S/ 129,300,554.26	\$ 34,026,461.65
CAJAMARCA	0	0	2	2	S/ 182,876,242.10	\$ 48,125,326.87
SAN MARTIN	0	1	2	3	S/ 28,405,219.66	\$ 7,475,057.81
APURIMAC	1	1	1	3	S/ 218,814,928.25	\$ 57,582,875.86
TUMBES	0	2	1	3	S/ 219,654,929.85	\$ 57,803,928.91
ICA	1	0	2	3	S/ 243,126,697.73	\$ 63,980,709.93
PASCO	0	2	1	3	S/ 577,412,279.06	\$ 151,950,599.75
PUNO	0	4	1	5	S/ 280,067,538.13	\$ 73,701,983.72
AYACUCHO	0	3	2	5	S/ 289,253,715.60	\$ 76,119,398.84
LIMA	2	3	1	6	S/ 367,079,436.79	\$ 96,599,851.79
AMAZONAS	0	5	1	6	S/ 443,831,568.11	\$ 116,797,781.08
LA LIBERTAD	5	1	1	7	S/ 121,609,026.88	\$ 32,002,375.49
PIURA	4	3	1	8	S/ 250,712,193.52	\$ 65,976,893.03
CUSCO	0	5	4	9	S/ 747,077,715.79	\$ 196,599,398.89
ANCASH	5	4	1	10	S/ 676,606,241.25	\$ 178,054,274.01
HUANCAVELICA	5	0	6	11	S/ 685,538,153.77	\$ 180,404,777.31
TOTALES	27	38	34	99	S/ 5,913,191,566.99	\$ 1,556,103,043.94

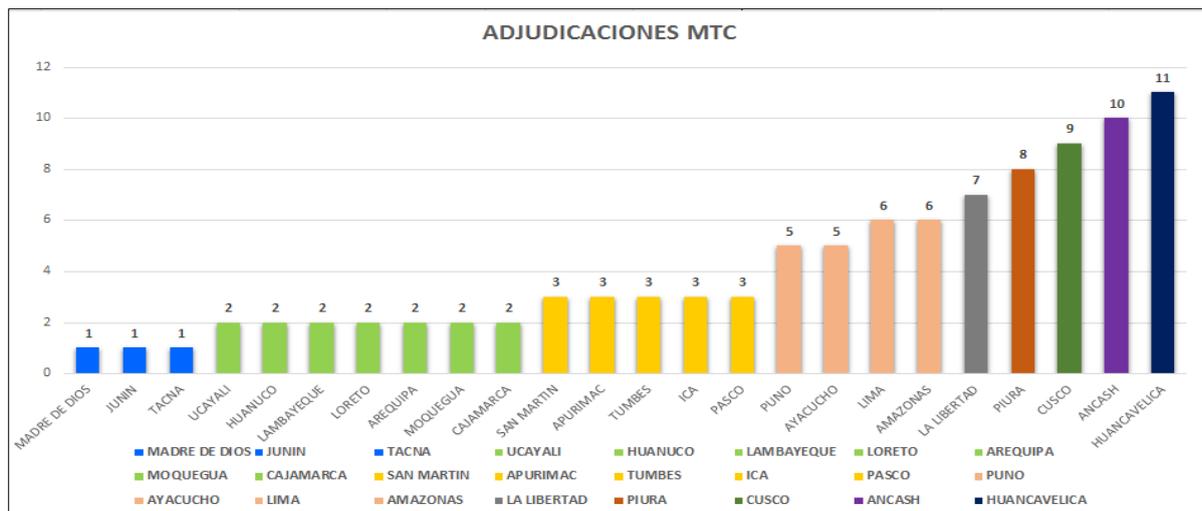




Otros puntos importantes a tomar consideración es que las regiones de Huancavelica, Ancash, Cusco y Piura es donde se han desarrollado mayor cantidad de contratos firmados por el MTC con 11, 10 y 9 proyectos respectivamente. Le sigue la libertad con 7, Lima y Amazonas con 6, Ayacucho y Puno con 5 y los demás restantes con cantidades de 3 a menos.

5.2 Proyecto/obras contratadas por Gobiernos Regionales y Locales con empresas chinas y/o consorciadas Chino Peruanas:


Los cuadros 1 y 2 que a continuación se presenta, es el resumen de los contratos que a la fecha se han encontrado por el trabajo realizado por la comisión, adjudicados por el Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales con empresas chinas y consorcios chino-peruano. Por lo cual se viene trabajando en la investigación de la situación física y financiera de estos contratos para poder evidenciar algunas posibles omisiones en los diferentes procesos o indicios de favorecimiento sobre estas empresas o consorcios.

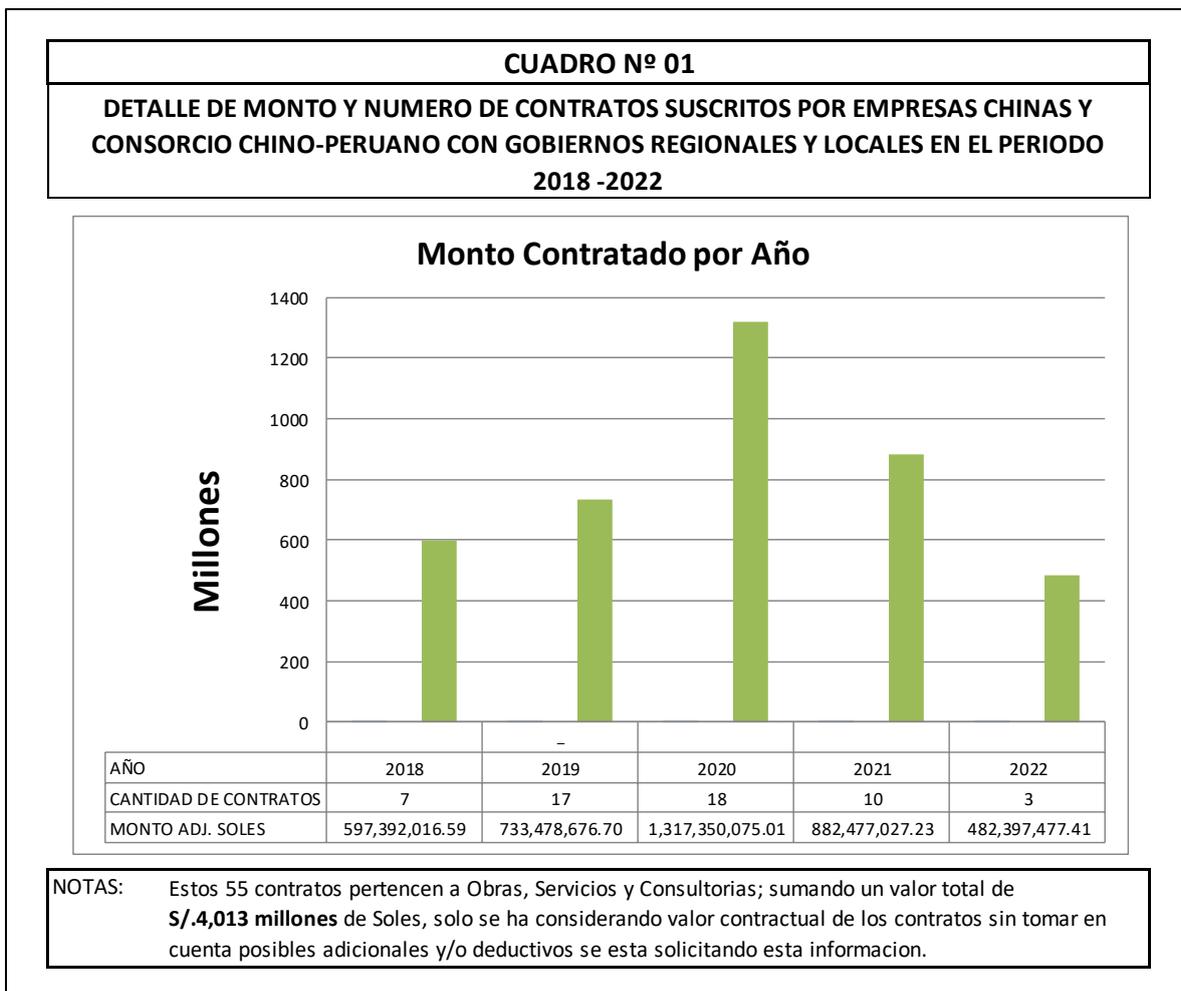



“Comisión Investigadora multipartidaria que investiga las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por empresas Chinas”

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

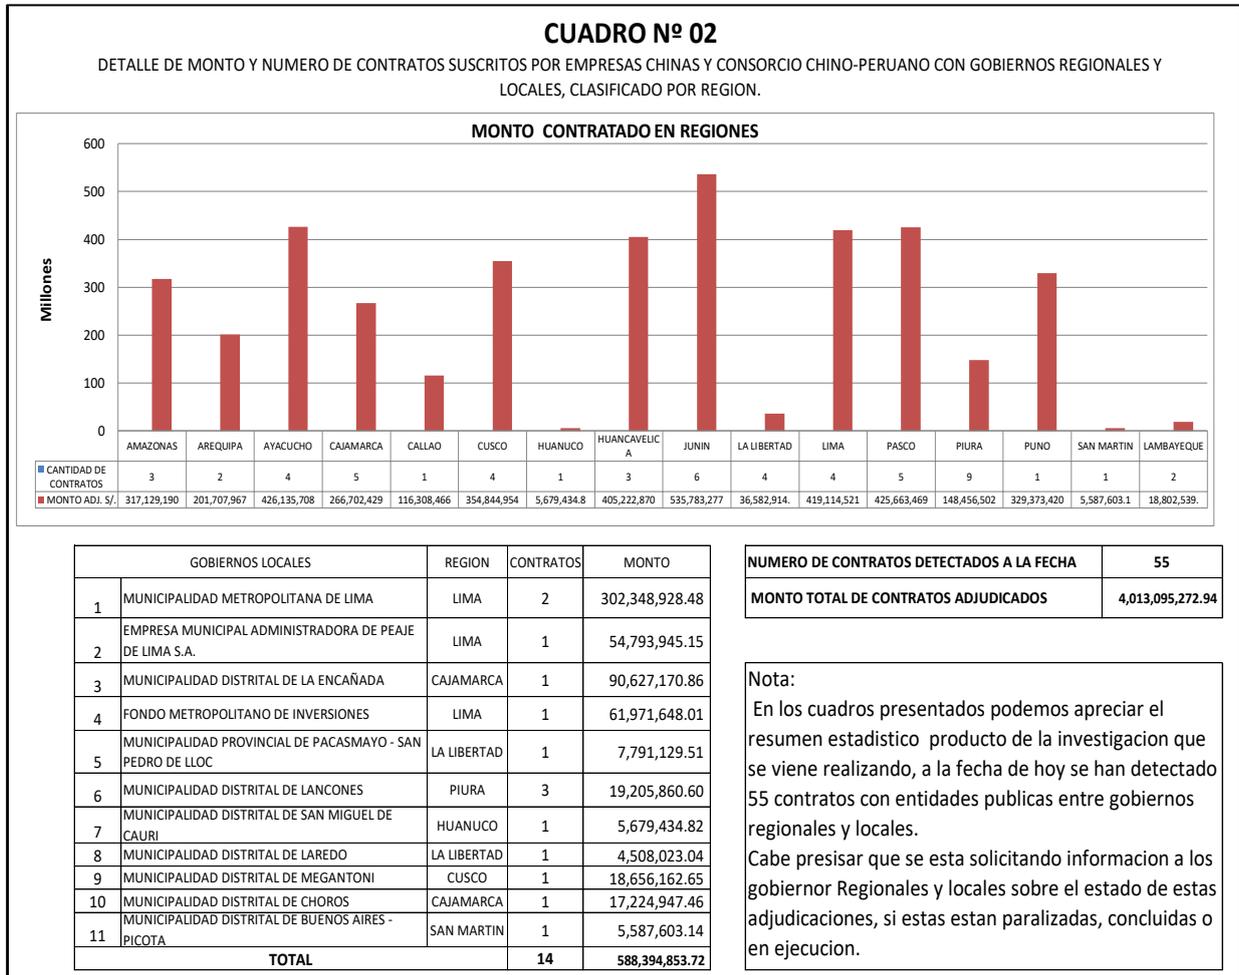

5.3 Empresas Chinas identificadas que han Contratado con el Estado entre el 2018 Y 2022

A la fecha de los 186 contratos con empresas chinas se ha identificado un total de 13 empresas chinas, según se detalla:

Nº	EMPRESA CHINA	RUC
1	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION	20604269009
2	CHINA RAILWAY FIRST SURVEY & DESING INSTITUTE GROUP CO. LTD SUCURSAL DEL PERU	20600685725
3	CHINA RAILWAY INTERNATIONAL GROUP SUCURSAL DEL PERU.	20601189063
4	CHINA RAILWAY Nº 10 ENGINEERING GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERU	20601116082



5	CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERU	20600977661
6	DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU.	20600366948
7	CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD. SUCURSAL PERÚ	20603798075
8	CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU	20602371442
9	WEIHAI CONSTRUCTION GROUP COMPANY.	
10	CANTON LIMA	20128213105
11	CHINA RAILWAY ERYUAN ENGINEERING GROUP. CO. LTD	
12	PYUNGAWA ENGINEERING	20549322434
13	CHINA CONSTRUCTION THIRD ENGINEERING BUREAU CO. LTD.	

Que en medio del análisis de la información recopilada hasta el momento hemos podido detectar que las empresas chinas y sus consorcios también han ganado licitaciones en otros ministerios como detallamos a continuación:

EMPRESAS CHINAS QUE HAN CONTRATADO CON LOS MINISTERIOS DESDE EL 2018 AL 2022		
MINISTERIO	NUMERO PROYECTOS	MONTO
MINISTERIO DE VIVIENDA	13	S/ 705,257,306.79
MINISTERIO DE JUSTICIA	1	S/ 126,992,051.00
MINISTERIO DE EDUCACION	4	S/ 121,328,519.08
MINISTERIO DE SALUD	3	S/ 177,786,655.42
MINISTERIO DE AGRICULTURA	4	S/ 24,853,061.47
MINISTERIO DE PRODUCCION	3	S/ 5,163,588.83
MINISTERIO DEL INTERIOR	1	S/ 87,777,783.92
MINISTERIO DE MINAS	2	S/ 200,011,374.68
MINISTERIO DE TRABAJO	1	S/ 275,283,666.42
TOTAL	32	S/ 1,724,454,007.61

VI.- AUDIENCIAS Y CITACIONES

6.1 INICIO DE LAS CITACIONES

La comisión inició citando a los profesionales en contrataciones del estado, a la Ministra de Transporte y comunicaciones, a funcionarios y representantes legales de la empresa CHINA RAILWAY N: 10 ENGINEERING GROUP LIMITED, y de la empresa GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR ASOCIADOS S.A.C. – GC Y C.A. SAC.



“Comisión Investigadora multipartidaria que investiga las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por empresas Chinas”

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Del 06 al 10 de marzo del presente año, se procedió a citar a las siguientes personas como se detalla en el siguiente cuadro:

Comisión Investigadora Multipartidaria que Investiga las Irregularidades en las Licitaciones y Obras realizadas por Empresas Chinas				
La comisión procederá a citar a 2 profesionales en contrataciones del estado, a la Ministra de Transporte y comunicaciones y funcionarios de la empresa CHINA RAILWAY N: 10 ENGINEERING GROUP LIMITED, y de la empresa GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR ASOCIADOS S.A.C. – GC Y C.A. SAC. los cuales brindarán información respecto a 3 proyectos que tienen en CONSORCIO con el MTC y con el Gobierno Regional de Cajamarca.				
LUNES 06	MARTES 07	MIÉRCOLES 08	JUEVES 09	VIERNES 10
Hora: 14:00 Invitada: Dr. Yaya Luyo Monica Yadira Ex Presidenta de la OSCE Lugar: Sala 3 - Victor Raul Haya de la Torre	Primera Citación Hora: 09:00 Citado: Sra. Beatriz Alejandrina Monteverde Calatayud Rep. Legal GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR ASOCIADOS S.A.C. – GC Y C.A. SAC. La empresa forma parte del CONSORCIO VIAL PUCAHUASI	Primera Citación Hora: 09:00 Citado: Sr. FANG YIMING Representante Común del CONSORCIO VIAL PUCAHUASI Lugar: Sala 4- Victor Raul Haya de la Torre (solicito reprogramacion de la citacion)	Segunda Citación Hora: 09:00 Citado: Sr. FANG YIMING Representante Común del CONSORCIO VIAL PUCAHUASI Lugar: Sala 3 - Victor Raul Haya de la Torre (solicito reprogramacion de la citacion)	Segunda Citación Hora: 09:00 Citado: Sr. CHEN JUN KUN Representante Común del CONSORCIO CARRETERA CAJAMARCA Lugar: Sala 6 - Victor Raul Haya de la Torre
Hora: 15:00 Invitada: Ing. Zapata Rios Jorge Alberto Presidente de la Camara Peruana de la Construcción Lugar: Sala 3 - Victor Raul Haya de la Torre	Primera Citación Hora: 10:00 Invitada: Sra. Paola Pierina Lazarte Castillo MINISTRA DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES Lugar: Sala 4 - Victor Raul Haya de la Torre (solicito reprogramacion de la citacion)	Segunda citación Hora: 11:00 Citado: Sra. Beatriz Alejandrina Monteverde Calatayud Rep. Legal GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR ASOCIADOS S.A.C. – GC Y C.A. SAC. La empresa forma parte del CONSORCIO VIAL PUCAHUASI Lugar: Sala 3 - Victor Raul Haya de la Torre	Primera Citación Hora: 10:00 Citado: Sr. CHEN JUN KUN Representante Común del CONSORCIO CARRETERA CAJAMARCA Lugar: Sala 3 - Victor Raul Haya de la Torre	Segunda Citación Hora: 11:00 Citado: Sr. GUO HONGBING Apoderado de la empresa CHINA RAILWAY N: 10 ENGINEERING GROUP LIMITED La empresa forma parte del CONSORCIO CARRETERA CAJAMARCA Lugar: Sala 6 - Victor Raul Haya de la Torre
	Primera Citación Hora: 11:00 Testigo: Sra. Sheily Arlequin Segura Esteban Gerente General de VLV SERVICIOS GENERALES SAC La empresa es Sub Contratista del CONSORCIO VIAL PUCAHUASI Lugar: Sala 4	Segunda citación Hora: 12:00 Citado: Sra. Sheily Arlequin Segura Esteban Gerente General de VLV SERVICIOS GENERALES SAC La empresa es Sub Contratista del CONSORCIO VIAL PUCAHUASI Lugar: Sala 3 - Victor Raul Haya de la Torre	Primera Citación Hora: 11:00 Citado: Sr. GUO HONGBING Apoderado de la empresa CHINA RAILWAY N: 10 ENGINEERING GROUP LIMITED La empresa forma parte del CONSORCIO CARRETERA CAJAMARCA Lugar: Sala 3 - Victor Raul Haya de la Torre	Primera Citación Hora: 12:00 Citado: Sr. Aguilar Quispe Alexander Felipe Rep. Legal Grupo Constructor y Consultor Asociados Sac-GCyCA. SAC La empresa forma parte del CONSORCIO CARRETERA CAJAMARCA Lugar: Sala 6- Victor Raul Haya de la Torre

6.2 Lunes 06 de marzo del 2023

Se presentó a la abogada Mónica Yadira Yaya Luyo, especialista y expresidenta del Organismo Supervisor de las Contrataciones con el Estado, quien dio a conocer algunos alcances referentes a los hechos, materia de investigación, detallando que como abogada defensora de pequeñas y medianas empresas peruanas subcontratistas con las empresas chinas viene descubriendo sucesos, indicios de corrupción e incumplimiento de pago por parte de las empresas Chinas a subcontratistas peruanos.



“Comisión Investigadora multipartidaria que investiga las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por empresas Chinas”

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”



6.3 Martes 07 de marzo del 2023

Se presentaron los representantes de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) encabezados por el señor Jorge Zapata Ríos – Presidente del Consejo Directivo, Ytalo Valle Pachas – Presidente del Comité de Obras Públicas y Concesiones y Jorge Arévalo Sánchez – Gerente General, quienes informaron sobre las gestiones realizadas con la finalidad de dar a conocer la problemática que involucra a las empresas chinas detectada por CAPECO, ante distintos instituciones del estado, especificando los contratos y montos de los contratos adjudicados y situación de desventaja de las empresas peruanas ante estas, respecto a las líneas de crédito que se solicitan para su participación.



6.4 Miércoles 08 de marzo del 2023

Se presentaron los representantes de varios empresarios que denunciaron no haber sido pagados por los trabajos de servicios y abastecimiento de material de construcción que proveyeron en su condición de subcontratistas. Entre los primeros citados estuvieron la señora Sheily Arlequin Segura Esteban representante de V.L.V. Servicios Generales, quien fue acompañada por la Señora Saly Mirella Lopez Miranda representante de Obras Puentes Santa Rosa y Virù; así mismo asistió el Sr. Luis David Rojas Ccama representante de empresa Construming contratistas Generales S.A.C. Informando que las empresas chinas sub contratan los servicios de empresarios locales con la finalidad que ejecuten las obras, movilizand o toda su logística y personal, para luego desconozcan los servicios prestados por estas empresas locales. Así mismo manifiestan que estas empresas chinas no cumplen con el avance de las obras ya pagadas por el estado. En esta denuncia los señores arriba mencionados manifiestan los vínculos de los hermanos Aguilar Quispe con las empresas chinas, por lo que pondrán a disposición de la comisión la documentación recabada por ellos.



6.5 Jueves 09 de marzo del 2023

Para esta fecha fueron citados el señor Sr. FANG YIMING representante Común del CONSORCIO VIAL PUCAHUASI quien solicitó la reprogramación de su citación; de igual manera se citó al Sr. CHEN JUN KUN representante Común del CONSORCIO CARRETERA CAJAMARCA y al Sr. GUO HONGBING Apoderado de la empresa CHINA RAILWAY N: 10 ENGINEERING GROUP LIMITED empresa que forma parte del CONSORCIO CARRETERA CAJAMARCA, quienes no asistieron a la citación de la comisión; apersonándose sus abogados defensores para empezar a ejercer la



“Comisión Investigadora multipartidaria que investiga las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por empresas Chinas”

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

defensa.

6.6 Viernes 10 de marzo del 2023

Para esta fecha fueron citados el señor Sr. CHEN JUN KUN representante Común del CONSORCIO CARRETERA CAJAMARCA, el Sr. GUO HONGBING Apoderado de la empresa CHINA RAILWAY N: 10 ENGINEERING GROUP LIMITED empresa que forma parte del CONSORCIO CARRETERA CAJAMARCA, y Sr. Alexander Felipe Aguilar Quispe representante legal Grupo Constructor y Consultor Asociados S.A.C - GCyCA. SAC, la empresa forma parte del CONSORCIO CARRETERA CAJAMARCA quienes no asistieron a la citación de la comisión, y se apersonaron sus abogados defensores para ejercer la defensa.

VII.- PROYECTOS ANALIZADOS A LA FECHA

7.1 PROYECTO EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CASTROVIRREYNA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

DATOS DEL PROYECTO			
SERVICIO CUI:2331865	EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CASTROVIRREYNA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA		
CONSORCIO GANADOR			
CONTRATISTA	CONSORCIO EJECUTOR DE SALUD CASTROVIRREYNA	RUC: 20608540866	
Rep. Común	LINO MOYA JAIME ROLANDO	DNI: 10350667	
Domicilio Fiscal	CAL. Coronel Andres Reyes N° 420 Int. 901 Urb. Jardín Lima-Lima-San Isidro		
Empresa Consorciada 1	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU		RUC: 20604269009
	Apoderado	JAIME ROLANDO LINO MOYA	DNI. 10350667
	Dom. Fiscal	CAL. CORONEL ANDRES REYES NRO. 420 INT. 901 URB. JARDIN LIMA-LIMA-SAN ISIDRO	
Empresa Consorciada 2	INIP INGENIERIA INTEGRACION DE PROYECTOS S.A.C.		RUC: 20605487051
	Rep. Legal	ROBERTO JESUS AGUILAR QUISPE	DNI: 75702514



“Comisión Investigadora multipartidaria que investiga las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por empresas Chinas”

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

	Dom. Fiscal	CAL. Mariano de los Santos N° 135 Urb. Santa Ana-Lima-Lima-San Isidro	
Carta Fianza /Garantía de fiel cumplimiento 10%		BANK OF CHINA	S/.5,090,000.00
Monto de Licitación	52,041,282.55		
Propuesta Ganadora	S/. 50,900,000.00		
Firma del Contrato	06/10/2021		
Fecha de Inicio del Servicio	27/10/2021		
FECHA DE INICIO EFECTIVO	27/10/2021 (SEGÚN reporte de invierte.pe)		
Plazo de Ejecución	300 días calendario		
Fecha Fin del Servicio	22/08/2022		
LICITACION DEL SERVICIO			
CONTRATANTE	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA		
GOBERNADOR REGIONAL	MACISTE DIAZ ABAD	DNI: 23714956	
DIRECTOR REGIONAL DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ANGEL ERNESTO FLORES FLORES	DNI:19825460	
PRIMERA ETAPA- LICITACION DE LA OBRA			
COMITÉ DE SELECCION	Presidente	WILLIAM PACO CHIPANA	
	Primer Miembro	WILSER VIDAL QUISPE CHAMORRO	
	Segundo Miembro	RAUL ESPLANA BOZA	

De la revisión y análisis efectuada a la información y documentación vinculada al Otorgamiento de la Buena Pro, se han identificado situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del contrato que se suscribió según procedimiento de selección de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2021-GOB.REG.HVCA/CSO-Primera Convocatoria contratación de la obra: "Ejecución de la obra: Mejoramiento de los servicios de salud del establecimiento de salud de Castrovirreyna del distrito y provincia de Castrovirreyna, departamento de Huancavelica".

SEGUNDA ETAPA – EJECUCIÓN DE PROYECTO			
ESTADO DE EJECUCION DEL SERVICIO			CUI: 2331865
REPORTE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE INVERSION DEL FORMATO N° 12-B – INVIERTE PE -MEF			
SITUACION:	% 4.98		
AVANCE FISICO 4.98%	% AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 29.5%	DEVENGADO ACUMULADO S/. 18,163,894.00	
OBSERVACION :	Se puede APRECIAR que según información mostrada en la página de invierte pe, el proyecto presenta avance físico.		



Informes de Provías descentralizado de fecha 25/11/22 enviado con oficio 357/2022-MTC-21	
ESTADO DE EJECUCION:	Proceso de Arbitraje, con solicitud de medida cautelar, seguidos por el consorcio, contra el gobierno regional, los mismos que se encuentran en trámite, sin pronunciamiento definitivo alguno. Asimismo la procuraduría, interpuso demanda de amparo contra la resolución cautelar.
ESTADO SITUACIONAL Y ACCIONES REALIZADAS: CONTROVERSIAS GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA VS CONSORCIO EJECUTOR SALUD CASTROVIRREYNA	
CON FECHA: 08/08/2022	Que tras la emisión de la Resolución N° 01, de fecha 08 de agosto del 2022, de la medida cautelar interpuesta por el Consorcio ejecutor salud castrovirreyna, el tribunal arbitral del centro de arbitraje y solución de controversias AVIURIS resuelve: Primero. -Declarar fundada la solicitud de medida cautelar presentada por el Consorcio Ejecutor de Salud Castrovirreyna con fecha 08 de agosto 2022.
CON FECHA: 21/08/2022	Asimismo, respecto al proceso arbitral, seguidos por el Consorcio Ejecutor de Salud Castrovirreyna, contra el Gobierno Regional de Huancavelica de fecha 21/08/2022, se encuentra en trámite siendo la última actuación la contestación de solicitud de arbitraje, donde se formuló objeción a la continuación del presente proceso de arbitraje.
CON FECHA: 28/09/2022	Respecto al proceso de medida cautelar interpuesto por el Consorcio Ejecutor de Salud Castrovirreyna, de fecha 28/09/2022, contra el Gobierno Regional de Huancavelica, a la fecha se encuentra judicializado mediante demanda de amparo, interpuesto por la Procuraduría Pública Regional, en el expediente N° 00468-2022-0-1101-JR-CI-02, ante el segundo juzgado civil de Huancavelica.
CON FECHA: 31/08/2022	Asimismo, mediante oficio N° 134-2022-CA.AVIURIS, de fecha 31 de agosto del 2022, el Centro de Arbitraje Aviuris remite solicitud de arbitraje, interpuesto por el Consorcio Ejecutor de Salud Castrovirreyna debidamente representado por el sr. Jaime Rolando Lino Moya.

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 004-2022-OCI/5338-SCC¹ DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

"EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CASTROVIRREYNA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA"

A.1.- EJECUCIÓN DE LA OBRA:

A) La Contraloría General de la Republica concluye:

a.1) “EL CONTRATO DE EJECUCION DE LA OBRA NO CONTIENE LA CLÁUSULA OBLIGATORIA DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS A CARGO DE UNA JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS - JRD, LO CUAL PODRÍA LIMITAR LA

¹ Disponible en: https://s3.amazonaws.com/spic-informes-publicados/informes/2022/05/2022CSI53380004_ADJUNTO.pdf (Fecha de informe: 18.05.2022).



PREVENCIÓN Y/ O RESOLUCIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA DE LAS CONTROVERSIAS QUE SURJAN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, REPERCUTIENDO EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN.

Consecuencia:

La omisión de conformar una Junta de Resolución de Dispuestas para el contrato de ejecución de obra, podría limitar la prevención y/o resolución eficiente y oportuna de las controversias que surjan durante la ejecución de la Obra, repercutiendo en el plazo de ejecución de la misma.

a.2) EN EL TERRENO DE LA OBRA SE EVIDENCIAN FUENTES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, QUE FLUYEN POR ZONAS DONDE SE CONSTRUIRÁN LOS BLOQUES "1", "2", "3", "4", "5", "6" Y "7" Y BLOQUES "A", "B", "C" DEL PROYECTO, LAS CUALES OCASIONARÍAN UNA DISMINUCIÓN DE LAS ÁREAS DISPONIBLES Y/ O CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LOS SUELOS DE CIMENTACIÓN, LO CUAL PODRÍA AFECTAR EL PROCESO CONSTRUCTIVO Y RETRASOS A LA OBRA.

Consecuencia:

La situación expuesta, ocasionaría una disminución de las áreas disponibles y/o características de resistencia de los suelos de cimentación, lo cual podría afectar el proceso constructivo y retrasos a la obra.

a.3) ATRASOS CONSTANTES EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, PODRÍAN OCASIONAR EL INCUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO Y METAS DEL PROYECTO EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, POR ENDE, LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.

Consecuencia:

El hecho descrito, referido a la ejecución de la Obra con atrasos contantes, podría ocasionar el incumplimiento del objetivo y metas del proyecto en los plazos establecidos, por ende, la puesta en funcionamiento en beneficio de la población.

a.4) INFORME TÉCNICO DE REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA EJECUTOR, NO CUENTA CON EL PRONUNCIAMIENTO DE LA INSPECCIÓN O SUPERVISIÓN DE LA OBRA SOBRE LAS OBSERVACIONES IDENTIFICADAS; LO CUAL PODRÍA AFECTAR LA OPORTUNA GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO, PRESTACIONES ADICIONALES Y OTROS ASPECTOS MATERIA DE CONSULTA.

Consecuencia:



Las observaciones al expediente técnico identificadas por el Consorcio Ejecutor de la Obra, que no cuentan con pronunciamiento de la inspección o supervisión de la Obra, podrían afectar la oportuna gestión de riesgos del proyecto y otros aspectos materia de consulta.

a.5) FALTA DE DISPOSICIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS POR PARTE DEL CONTRATISTA, PODRÍA GENERAR ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASÍ COMO QUE ESTA NO SE EJECUTE CON LA CALIDAD NECESARIA DE ACUERDO A LOS TRABAJOS QUE SE VIENEN DESARROLLANDO, E INAPLICACIÓN DE PENALIDADES.

Consecuencia:

La situación advertida, de la falta de disposición de equipos y maquinarias por parte del Ejecutor de Obra, podría generar atrasos en la ejecución de la misma, así como que esta no se ejecute con la calidad necesaria de acuerdo a los trabajos que se vienen desarrollando, e inaplicación de penalidades.

a.6) AUSENCIA DEL PERSONAL CLAVE DEL EJECUTOR Y DE LA SUPERVISIÓN, PODRÍA AFECTAR LA CORRECTA EJECUCIÓN TÉCNICA DE LA OBRA, EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO Y METAS DEL PROYECTO EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, E INAPLICACIÓN DE PENALIDADES.

Consecuencia:

Los hechos antes descritos, referidos a la ausencia del personal clave del Ejecutor y de la Supervisión, evidencian que el personal encargado de la dirección técnica de la Obra, no viene cumpliendo con velar directa y permanentemente con la correcta ejecución técnica de la Obra, lo cual podría afectar la correcta ejecución técnica de la Obra, el cumplimiento del objetivo y metas del Proyecto en los plazos establecidos, e inaplicación de penalidades.

a.7) AUSENCIA DEL PERSONAL DE SALUD E INCOMPLETA IMPLEMENTACIÓN DEL "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19", POR PARTE DEL EJECUTOR Y SUPERVISOR EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, A FIN DE PREVENIR Y CONTROLAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19; PONDRÍA EN RIESGO LA SALUD DE LOS TRABAJADORES Y POBLACIÓN.

Consecuencia:

La situación expuesta, referida a la ausencia del personal de salud e incompleta implementación del “Plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19”, Por parte del contratista y supervisor en la ejecución de la obra, situación que pone en



riesgo la salud de los trabajadores y población por contagio del COVID-19.

a.8) NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE LA OBRA EN EL PORTAL INFOBRAS, LO CUAL PODRÍA LIMITAR A LA CIUDADANÍA Y ENTES FISCALIZADORES, CONTAR CON INFORMACIÓN REAL SOBRE LA OBRA.”

Consecuencia:

Los hechos expuestos, afectarían el acceso de la ciudadanía y entes fiscalizadores, a información veraz y real sobre las obras publicas que viene ejecutando de las obras públicas, INFObras una herramienta que fomenta la transparencia en la ejecución de las obras publicas.”

B) Del INFORME DEL CONTROL CONCURRENTE N° 006-2022-OCI/0661-SCC²

La Contraloría General de la Republica concluye:

b.1) “MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EXPUESTOS A LA INTEMPERIE, PONEN EN RIESGO LA INTEGRIDAD Y CONSERVACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE ESTOS, QUE AL SER UTILIZADOS, PODRÍAN AFECTAR LA CALIDAD Y VIDA ÚTIL DE LA OBRA.

Consecuencia:

Las situaciones antes descritas, ponen en riesgo la integridad y conservación de la propiedad de los materiales de construcción que de ser utilizados podrían afectar la vida útil de la obra.

b.2) EN LA OBRA SE EVIDENCIA DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS EN PARTIDAS EJECUTADAS, ADEMÁS LA ESTRUCTURA DE ACERO DEL CERCO PERIMÉTRICO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE OXIDACIÓN Y EXPUESTAS A LA INTEMPERIE, CUYAS SITUACIONES PODRÍAN AFECTAR LA CALIDAD, DURABILIDAD Y VIDA ÚTIL DE LA OBRA EN PERJUICIO DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA.

Consecuencia:

Los hechos descritos podrían afectar la calidad, durabilidad y vida útil de la Obra en perjuicio de la población beneficiaria, pudiendo generar perjuicio económico a la Entidad.

b.3) LA ENTIDAD NO MANTIENE ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DE LA OBRA EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO INFOBRAS, ADEMÁS DE REGISTRAR

² Disponible en: https://s3.amazonaws.com/spic-informes-publicados/informes/2022/12/2022CSI533800038_ADJUNTO.pdf (Fecha de informe: 23.12.2022).



DOCUMENTACIÓN QUE NO CORRESPONDE; AFECTANDO LA TRANSPARENCIA CON LA QUE DEBE REGIRSE LA GESTIÓN PÚBLICA Y LIMITANDO A LA CIUDADANÍA Y ENTES FISCALIZADORES, CONTAR CON INFORMACIÓN REAL SOBRE LA OBRA.”

Consecuencia:

Los hechos expuestos, afectan la transparencia en la ejecución de las obras publicas y limitan el acceso de la ciudadanía y entes fiscalizadores, a información veraz y real sobre las obras publicas que viene ejecutando la Entidad.”

C) RESPUESTA DE ENTIDADES PÚBLICAS, INFORME N° 195-2022/GOB.REG-HVCA/PPR-AP-jcm

La Procuraduría Publica Regional de Huancavelica concluye:

c.1) “Que, con fecha 05 de enero del 2022 el Sr. Alberto Aguirre Morales Representante Legal del Consorcio Cotabambas, comunica que no valida el Certificado otorgado a nombre del Ing. Edward Cerron Torres y afirma que dicho documento no fue extendido por su representada, siendo una falsificación en todo su contexto.

Al respecto, habiendo recibido la documentación y analizado desde el punto de vista del derecho penal, se ha llegado a establecer que, existe hechos con relevancia penal por lo que SE HA INTERPUESTO 03 DENUNCIAS respectivas que pasamos a detallar:

- Delito contra la fe pública en la modalidad de uso de documento falso (respecto al certificado de trabajo de Jaime rolando lino moya)
- Delito contra la fe pública en la modalidad de uso de documento falso Jaime rolando lino moya, con DNI 10350667 y Edward Cerron torres, con DNI 22486456 (ampliación de denuncia)
- Delito contra la fe pública en la modalidad de uso de documento falso jaimé rolando lino moya, con DNI 10350667”

D) Del **INFORME N° 063-2022/GOB.REG-HVCA/GGR-ORA-OA-ETEC** la Oficina de Abastecimiento del Gobierno Regional de Huancavelica concluye:

d.1) “Se ha identificado VICIO DE NULIDAD DEL CONTRATO, según lo contemplado en el literal b) del numeral 44.2 del Artículo 44º de TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, por la trasgresión del principio de presunción de veracidad para el perfeccionamiento del CONTRATO N° 1465-2021/ORA, derivado del procedimiento de selección de Licitación Publica N° 02-



2021/GOB.REG.HVCA/CSO-Primera Convocatoria cuyo objeto contractual es la CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CASTROVIRREYNA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA”. En tal sentido corresponde que la máxima autoridad evalué las medidas correspondientes para ejercer la atribución prevista en el artículo 44º de la Ley, por ser facultad indelegable.”

7.2 “MEJORAMIENTO CARRETERA CA-103: EM. PE-06B (SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA)-ROMERO CIRCA-LA LAGUNA-TOGOD-CATILLUC-EMP. PE-06 C (EL EMPALME)-CAJAMARCA”-SALDO DE OBRA

DATOS DEL PROYECTO		
OBRA CUI:2112981	“MEJORAMIENTO CARRETERA CA-103: EM. PE-06B (SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA)-ROMERO CIRCA-LA LAGUNA-TOGOD-CATILLUC-EMP. PE-06 C (EL EMPALME)-CAJAMARCA”-SALDO DE OBRA	
CONSORCIO GANADOR		
CONTRATISTA	CONSORCIO CARRETERA CAJAMARCA	RUC:
Rep. Común	CHEN JUNKUN	C.E. 002041063
Domicilio Fiscal		
Empresa Consorciada 1	CHINA RAILWAY N: 10 ENGINEERING GROUP LIMITED	RUC: 20601116082
	Rep. Legal	GUO HONGBING C.E. 005544594
	Dom. Fiscal	CALLE DEAN VALDIVIA NRO 243 INT 601 URB. JARDIN LIMA – LIMA – SAN ISIDRO
	Accionista	CHINA FERROCARRIL S.A. (100%) (inf. Del SEACE)
Empresa Consorciada 2	GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR ASOCIADOS S.A.C. – GC Y C.A. SAC.	RUC: 20602340547
	Rep. Legal	AGUILAR QUISPE ALEXANDER FELIPE DNI: 44060179
	Dom. Fiscal	AV. MARISCAL OSCAR R. BENAVIDES NRO 679 DPTO 504 URB LIMA INDUSTRIAL LIMA LIMA LIMA
	Accionista	Monteverde Calatayud Beatriz Alejandrina- DNI 42540917 (50%) Aguilar Quispe Roberto Jesús - DNI 75702514 (50%)
Carta Fianza/Garantía de fiel cumplimiento 10%	INSUR SA	S/.8,876,084.00
Monto de Licitación	S/.98,623,152.87	
Propuesta Ganadora	S/. 88,760,837.60	
Firma del Contrato	26/10/2020	
Fecha de Inicio de la Obra	01/10/2020	
FECHA DE INICIO EFECTIVO	25/11/2020 (SEGÚN reporte de invierte.pe)	



“Comisión Investigadora multipartidaria que investiga las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por empresas Chinas”

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Plazo de Ejecución	540 días calendario	
Fecha Fin de la Obra	19/06/2022	
PRIMERA ETAPA- LICITACION DE LA OBRA		
CONTRATANTE	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	
GOBERNADOR REGIONAL	MESIAS ANTONIO GUEVARA AMASIFUEN	DNI: 09871134
GERENTE GENERAL REGIONAL	ALEX MARTIN GONZALES ANAMPA	DNI: 40564068
LICITACION		
COMITÉ DE SELECCION	Presidente	Alejandro Sebastián Burgos Deza
	Primer Miembro	Rosa Amelia Morí Quiroz
	Segundo Miembro	Julio Ronal Mosqueira Mendoza

De la revisión y análisis efectuada a la información y documentación vinculada al Otorgamiento de la Buena Pro, se han identificado situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del contrato que se suscribió según procedimiento de selección de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 005-2020-Región Cajamarca-1 para la ejecución de la obra: "Mejoramiento Carretera Ca-103: Em. Pe-06b (Santa Cruz de Succhubamba) - Romero Circa - La Laguna - Tongod - Catilluc - Emp. Pe- 06 C (El Empalme) - Cajamarca.

SEGUNDA ETAPA – EJECUCIÓN DE PROYECTO			
ESTADO DE EJECUCION DE LA OBRA			CUI: 2112981
REPORTE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE INVERSION DEL FORMATO N° 12-B – INVIERTE PE -MEF			
SITUACION:	% AVANCE 33.6%.		
INVIERTE.PE AVANCE FISICO S/ 54,048,691.00	% AVANCE FINANCIERO 40.5%	INVIERTE.PE AVANCE FINANCIERO S/ 63,011,080.00	
OBSERVACION:	Se puede APRECIAR que según información mostrada en la página de invierte pe, el proyecto si presenta avance físico.		
INFORME DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA CON FECHA: 23/11/22 – CARTA N° D487-2022-GR.CAJ-GRI/SGSL			
ESTADO DE EJECUCION:	Se encuentra PARALIZADA , se resolvió contrato de ejecución de obra- Resolución de Gerencia General Regional N° D17-2022-GR.CAJ-GGR-DRAJ de fecha 31 de enero del 2022. Asi mismo existe un proceso arbitral entre el Gobierno Regional de Cajamarca y Consorcio Carretera Cajamarca (Expediente arbitral N° 026-2021-RENA).		



INFORME DE CONTROL SIMULTÁNEO³, INFORME DEL CONTROL CONCURRENTE N° 031-2020-OCI/5336-SCC⁴

“MEJORAMIENTO CARRETERA CA-103: EM.PE 06B (SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA) - ROMERO CIRCA - LA LAGUNA - TONGOD - CATILLUC - EMP.PE - 06C (EL EMPALME) - CAJAMARCA - SALDO DE OBRA”

A) PRIMERA ETAPA, PROCESO DE LICITACIÓN

De la Contraloría General de la Republica concluye:

a.1) “De la revisión y análisis efectuada a la información y documentación vinculada al hito de control n. ° 2 - "Otorgamiento de la Buena Pro" NO se han identificado situaciones adversas que afecten o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del procedimiento de selección Licitación Pública N° 005-2020-Región Cajamarca-1 para la ejecución de la obra: "Mejoramiento Carretera Ca-103: Em. Pe-06b (Santa Cruz de Succhubamba) - Romero Circa - La Laguna - Tongod - Catilluc - Emp. Pe- 06 C (El Empalme) - Cajamarca".

B)SEGUNDA ETAPA, EJECUCIÓN DE OBRA INFORME DEL CONTROL CONCURRENTE N° 013-2021-OCI/5336-SCC⁵

La Contraloría General de la Republica concluye:

b.1) “AUSENCIA EN OBRA DEL PLANTEL PROFESIONAL ACREDITADO POR EL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN, ASÍ COMO RESIDENTE DE OBRA NO HABILITADO PODRÍA AFECTAR LA CORRECTA EJECUCIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA OBRA Y NO CUMPLIR CON LA FINALIDAD DEL PROYECTO, ADEMÁS DE LA NO APLICACIÓN DE PENALIDADES.

Consecuencia:

La ausencia del personal técnico acreditado para la ejecución de la obra por parte del Contratista y de la Supervisión, pone en riesgo la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato de la obra, además de la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la misma, en consecuencia, no cumplir con la finalidad del proyecto; asimismo, existe

³ Expediente: 006-2023-CIMILOREC.

⁴ Disponible en: https://s3.amazonaws.com/spic-informes-publicados/informes/2020/10/2020CSI533600037_ADJUNTO.pdf (Fecha de informe: 07.10.2020).

⁵ Disponible en: https://s3.amazonaws.com/spic-informes-publicados/informes/2021/07/2021CSI533600015_ADJUNTO.pdf (Fecha de informe: 10.06.2021).



el riesgo de que se estén efectuando pagos por personal que no estaría participando en el proceso constructivo, así como la inaplicación de penalidades; aunado a que los documentos técnico suscritos por el residente de obra carecerían de valor legal, mientras mantenga su condición de "NO HABILITADO".

b.2) EMPRESA SUPERVISORA NO VIENE CUMPLIENDO CON IMPLEMENTAR EL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL COVID-19, Y EL CONTRATISTA VIENE CUMPLIENDO PARCIALMENTE CON DICHA IMPLEMENTACIÓN; SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR LA SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES EN LA OBRA Y QUE PODRÍAN REALIZARSE PAGOS AL CONTRATISTA POR SERVICIOS NO PRESTADOS.

Consecuencia:

El incumplimiento de la implementación del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de Covid - 19 podría aumentar la propagación del virus, así como afectar la salud e integridad del personal involucrado en la ejecución de la obra y que podrían realizarse pagos al contratista por servicios no prestados”.

C) Del INFORME DEL CONTROL CONCURRENTE N° 024-2021-OCI/5336-SCC⁶ la Contraloría General de la Republica concluye:

c.1) “DEMORA EN LA GESTIÓN DE PASES Y UBICACIÓN DE DME⁷ POR PARTE DE LA ENTIDAD, ESTARÍAN GENERANDO ATRASOS RESPECTO A LOS AVANCES PROGRAMADOS ACUMULADOS REFLEJADOS EN LA VALORIZACIÓN N° 6, LO CUAL PODRÍA REPERCUTIR EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL Y COSTOS DE LA OBRA.

Consecuencia:

La situación descrita advierte la demora de la Entidad en la resolución de los conflictos sociales, referidos a la liberación de pases, generando atrasos en el cronograma de ejecución de obra en un 6.41%, hecho que podría repercutir en el cumplimiento del plazo contractual y costos de la obra.

c.2) AUSENCIA EN OBRA DEL PLANTEL PROFESIONAL ACREDITADO POR EL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN, PODRÍA AFECTAR LA CORRECTA EJECUCIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA OBRA, GENERANDO ADEMÁS EL RIESGO DE EFECTUAR PAGOS POR PERSONAL QUE NO ESTARÍA PARTICIPANDO EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO Y LA

⁶ Disponible en: https://s3.amazonaws.com/spic-informes-publicados/informes/2021/09/2021CSI533600054_ADJUNTO.pdf (Fecha de informe: 17.09.2021).

⁷ Depósitos de Material Excedente (DME).



CONSIGUIENTE INAPLICACIÓN DE PENALIDADES.

Consecuencia:

La ausencia del personal clave y no clave acreditado para la ejecución de la obra por parte del Contratista y la Supervisión, pone en riesgo la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra, así como el cumplimiento contractual, además de la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de ejecución, asimismo, existe el riesgo de que se estén efectuando pagos por personal que no estaría participando en el proceso constructivo y la consiguiente inaplicación de penalidades.

Las situaciones adversas comunicadas en los Informes de Hitos de Control anteriores respecto de las cuales la Entidad aún no ha adoptado acciones preventivas y correctivas, o éstas no han sido comunicadas a la Comisión de Control, se detallan a continuación:

- AUSENCIA EN OBRA DEL PLANTEL PROFESIONAL ACREDITADO POR EL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN, ASÍ COMO RESIDENTE DE OBRA NO HABILITADO PODRÍA AFECTAR LA CORRECTA EJECUCIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA OBRA Y NO CUMPLIR CON LA FINALIDAD DEL PROYECTO, ADEMÁS DE LA NO APLICACIÓN DE PENALIDADES.
- EMPRESA SUPERVISORA NO VIENE CUMPLIENDO CON IMPLEMENTAR EL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL COVID-19, Y EL CONTRATISTA VIENE CUMPLIENDO PARCIALMENTE CON DICHA IMPLEMENTACIÓN; SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR LA SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES EN LA OBRA Y QUE PODRÍAN REALIZARSE PAGOS AL CONTRATISTA POR SERVICIOS NOPRESTADOS”.

D) Del INFORME DEL CONTROL CONCURRENTE N° 033-2021-OCI/5336-SCC⁸ la Contraloría General de la Republica concluye:

d.1) “ATRASOS RESPECTO A LOS AVANCES PROGRAMADOS ACUMULADOS REFLEJADOS EN LA VALORIZACIÓN N° 8, REPERCUTIRÍAN EN EL CUMPLIMIENTO FINAL DEL PLAZO CONTRACTUAL Y COSTOS DE LA OBRA.

d.2) CANTERA QUEBRADA HONDA NO CONTARÍA CON LAS CARACTERÍSTICAS

⁸ Disponible en: https://s3.amazonaws.com/spic-informes-publicados/informes/2021/12/2021CSI533600064_ADJUNTO.pdf (Fecha de informe: 19.11.2021).



TÉCNICAS PARA SER UTILIZADA EN LA OBRA, DEVINIENDO EN LA MALA CALIDAD Y DURABILIDAD DE LA MISMA, Y CONSECUENTEMENTE EN EL PERÍODO DE GARANTÍA QUE EXIGE LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

d.3) LA ENTIDAD PAGÓ EL IMPORTE DE S/ 20 000,00 POR ALQUILER DE TERRENO PARA USO DE DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE (DME) EN LA PROGRESIVA KM 56+250, SIN EMBARGO, EL CONTRATISTA NO TIENE LIBRE DISPONIBILIDAD DE SU USO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, PERJUDICANDO EL AVANCE DEL PROCESO CONSTRUCTIVO Y EXPONIENDO EL RIESGO DE UN PERJUICIO ECONÓMICO ORIGINADO EN EL PAGO DE UN ALQUILER NO PRESTADO”.

E) Del **INFORME DEL CONTROL CONCURRENTE N° 038-2021-OCI/5336-SCC**⁹ la Contraloría General de la República concluye:

e.1) “APROBACIÓN DE PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 01, CON COSTOS UNITARIOS SOBREVALUADOS, PODRÍA DEVENIR EN MAYORES DESEMBOLSOS PARA LA ENTIDAD HASTA POR LA SUMA DE S/ 340 272,23 AFECTANDO LA EFICIENCIA Y ECONOMÍA EN LA GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS.

e.2) DEMORA EN EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL N° 01, GENERARÁ ATRASOS EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA VIGENTE, QUE REPERCUTIRÁN EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, CON LA CONSECUENTE GENERACIÓN DE MAYORES GASTOS PARA LA ENTIDAD”.

F. COMENTARIOS FINALES, RESPECTO AL “MEJORAMIENTO CARRETERA CA-103: EM.PE 06B (SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA) - ROMERO CIRCA - LA LAGUNA - TONGOD - CATILLUC - EMP.PE - 06C (EL EMPALME) - CAJAMARCA - SALDO DE OBRA”

En atención al requerimiento de información con Oficio N° 00041-2022-2223-CIMILOREC/CR del 21NOV2022 sobre la LP N° 005-2020-GR.CAJ y Contrato N° 001-2020-GRC-GGR, mediante Informe N° 232-2022-GR-CAJ-GRI-SGSL/EPM de 23 de noviembre de 2022 se informa:

⁹ Disponible en: https://s3.amazonaws.com/spic-informes-publicados/informes/2021/12/2021CSI533600068_ADJUNTO.pdf (Fecha de informe: 13.12.2021).



f.1) La obra ejecutada por Consorcio carretera Cajamarca actualmente se encuentra paralizada, se resolvió contrato de ejecución de obra con Resolución de 31 enero 2022. Asimismo existe un proceso arbitral entre el Gobierno Regional Cajamarca y Consorcio Carretera Cajamarca (Expediente arbitral N° 026-2021-RENA).

f.2) De la información recabada a la fecha (27 de febrero de 2023) se desconoce el estado del Contrato; toda vez que el GORE Cajamarca el 31.enero.2022 resolvió el contrato y dicto disposiciones para llevar a cabo la liquidación de la obra, sin embargo no se sabe si han sido ejecutadas; así como se desconoce si el contratista ha aceptado la resolución del contrato, inclusive se desconoce si ya se emitió Laudo Arbitral planteado por contratista.

Se debe tener en cuenta que se emitió Oficio N° 082-2022-2023-CIMILOREC/CR DE 13 DE FEBREO DEL 2023, donde se pide información general del avance de tres obras.

- 1) CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO CARRETERA CA-103: EM. PE-06B (SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA) - ROMERO CIRCA - LA LAGUNA - TONGOD - CATILLUC - EMP. PE - 06 C (EL EMPALME) - CAJAMARCA.
- 2) EJECUCION SALDO DE OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SANTA MARIA NIVEL II-1-PROVINCIA DE CUTERVO-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.
- 3) CONTRATACIÓN DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO CARRETERA CA-103: EM. PE-06B (SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA) - ROMERO CIRCA - LA LAGUNA - TONGOD - CATILLUC - EMP. PE - 06 C (EL EMPALME) - CAJAMARCA.

Según el reporte de seguimiento a la ejecución de inversiones del Formato N° 12-B al 10 de enero 2023 se tiene el siguiente avance de la ejecución de la obra:

N°	Producto componente /	Costo total actualizado	Avance	
			%	Costo
1	Producto 01:Infraestructura Vial	128,934,444 Soles	41.6 %	53,636,729 soles

También queda pendiente de verificar si la obra ha sido ejecutada por terceros subcontratistas. En la página de las Bases se ha establecido que: “La obra deberá ser ejecutada directamente por el contratista, no aceptándose subcontrataciones”



Pero inclusive el contratista en el proceso de selección planteó la consulta N° 18 Contratista: “... solicitamos excluir dicha restricción y permitir la subcontratación de acuerdo con las disposiciones contenidas en el art 147 del Reglamento” ante lo cual el Comité responde en el “Análisis respecto de la consulta u observación”: “El área usuaria aclara que no es posible las subcontrataciones de la obra acorde al numeral 3.1.2.3 de los requerimientos técnicos mínimos y al artículo 147 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Si bien se aprobó el Adicional N°1 por que los análisis de Precios Unitarios de las partidas 02.01.03 ,04,05 y 08 no incluyeron la extracción y apilamiento de material de cantera en roca y el chancado y zarandeo de piedra no se tiene en cuenta que la oferta del contratista mediante precios unitarios debe contener todo lo necesario para cumplir con la oferta y que independientemente sus errores deben ser asumidos o considerados para que sean incluidos en su oferta y que en todo caso el error debió advertirlo en el proceso de selección en la etapa de absolución de consultas; resulta que el contratista, según la resolución que resuelve el contrato el contratista no ejecuto el adicional y paralizó la obra. Por lo que no tiene sentido cuestionar el adicional de obra.

7.3 SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA EMP PE 32A DV QUEROBAMBA DV SAN SALVADOR DE QUIJE PAICO SANTIAGO DE PAUCARAY ATIHUARA AUTAMA SORAS SAN PEDRO DE LARCAY EMP PE 30B SAN PABLO DE CHICHA EMP PE 30B SAN JUAN DE AYAPAMPA TOROHUICHCCAÑA PUCAHUASI SAÑAYCA EMP PE 30A DV CHACAPUENTE POR NIVELES DE SERVICIO DISTRITO DE QUEROBAMBA PROVINCIA DE SUCRE DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y APURÍMAC

DATOS DEL PROYECTO		
CUI:2458796	Servicio de Gestión, Mejoramiento y Conservación Vial Por Niveles de Servicio de la Carretera Emp Pe 32a Dv. Querobamba Dv. San Salvador de Quije Paico Santiago de Paucaray Atihuara Autama Soras San Pedro de Larcay Emp Pe 30b San Pablo de Chicha Emp Pe 30b San Juan de Ayapampa Torohuichccaña Pucahuasi Sañayca Emp Pe 30a Dv Chacapuente Por Niveles de Servicio Distrito de Querobamba Provincia de Sucre Departamento de Ayacucho Y Apurímac	
CONSORCIO GANADOR		
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL PUCAHUASI	RUC: 20608297929
Rep. Común	FANG YIMIN	C.E. 002212710
Domicilio Fiscal	AV. Paseo la Republica 5895 interior 605 Distrito de Miraflores - Lima	
Empresa Consorciada 1	CHINA RAILWAY N: 10 ENGINEERING GROUP LIMITED	RUC: 20601116082



“Comisión Investigadora multipartidaria que investiga las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por empresas Chinas”


“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

	Apoderado	FANG YIMIN	C.E. 002212710
	Dom. Fiscal	CALLE DEAN VALDIVIA NRO 243 INT 601 URB. JARDIN LIMA – LIMA – SAN ISIDRO	
	Accionista	CHINA FERROCARRIL S.A. (100%) (inf. Del SEACE)	
Empresa Consorciada 2	GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR ASOCIADOS S.A.C. – GC Y C.A. SAC.		RUC: 20602340547
	Rep. Legal	Beatriz Alejandrina Monteverde Calatayud	DNI: 42540917
	Dom. Fiscal	AV. MARISCAL OSCAR R. BENAVIDES NRO 679 DPTO 504 URB LIMA INDUSTRIAL LIMA LIMA LIMA	
	Accionista	Monteverde Calatayud Beatriz Alejandrina- DNI 42540917 (50%) Aguilar Quispe Roberto Jesus - DNI 75702514 (50%)	
Carta Fianza /Garantía de fiel cumplimiento 10%		INSUR SA	S/.8 657 919.00
Monto de Licitación	108,223,981.18	100%	
Propuesta Ganadora	S/. 86,579,184.95	80%	
Firma del Contrato	30/11/2020		
Fecha de Inicio del Servicio	01/12/2020		
FECHA DE INICIO EFECTIVO	02/02/2021 (SEGÚN reporte de invierte.pe)		
Plazo de Ejecución	1976 días calendario		
Fecha Fin del Servicio	30/04/2026		
PRIMERA ETAPA - LICITACION DEL SERVICIO			
CONTRATANTE	PROVIAS DESCENTRALIZADO		
PRESIDENTE	FRANCISCO SAGASTI	DNI:	
MINISTRO	EDUARDO GONZALES CHAVEZ	DNI:	
D. PROVIAS DESCENTRALIZADO		DNI:	
J. ADMINISTRACION	LILIAN GAGO TELLO	DNI: 08800742	
PRIMERA LICITACION			
COMITÉ DE SELECCION	Presidente	MICHEL DENNY NAVARRO CARHUAS	
	Primer Miembro	ALEJANDRO EDGARDO AHUMADA ASPILLAGA	
	Segundo Miembro	EDGAR WILLIAM VARGAS MAS	
SEGUNDA LICITACION			
COMITÉ DE SELECCION	Presidente	JOSE LUIS VALDIVIEZO SAENZ	
	Primer Miembro (suplente)	MARIA ELIZABETH NAVARRO BRAVO	
	Segundo Miembro	EDGAR WILLIAM VARGAS MAS	



“Comisión Investigadora multipartidaria que investiga las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por empresas Chinas”

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

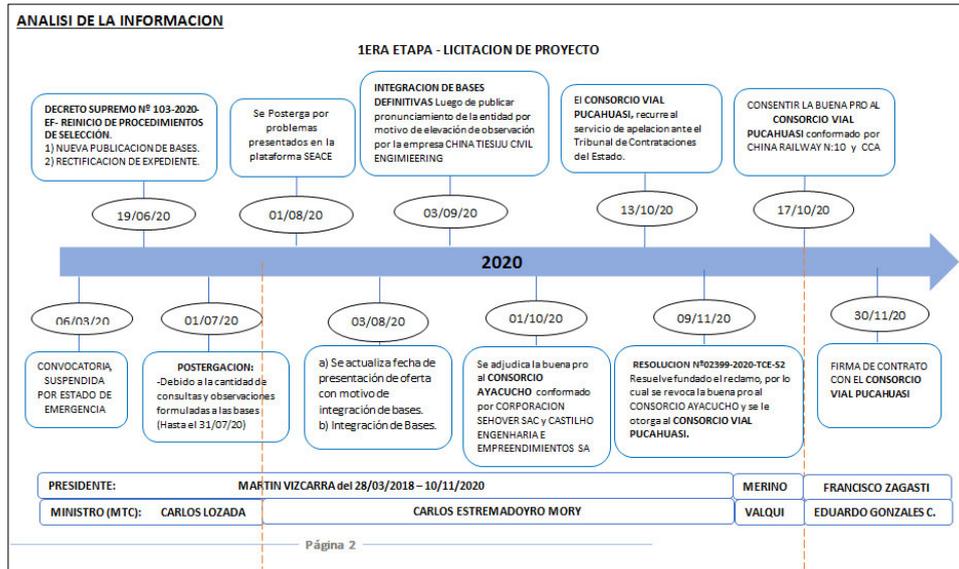

2DA ETAPA – EJECUCIÓN DE PROYECTO		
ESTADO DE EJECUCION DEL SERVICIO		CUI: 2458796
REPORTE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE INVERSION DEL FORMATO Nº 12-B – INVIERTE PE -MEF		
SITUACION:	CON FECHA 09/02/2023: SERVICIO EJECUTADO POR EL CONSORCIO VIAL PUCAHUASI, CUYA FECHA DE INICIO EFECTIVO ES DEL 02/02/2021. SE VIENE ELABORANDO EL PLAN DE MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL Y A SU VEZ EJECUTANDO EL COMPONENTE CONSERVACIÓN Y EMERGENCIA VIAL.	
AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA INVERSIÓN (0.00%)	AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN (0.00%)	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO DE LA INVERSIÓN (5.1% = 2,951,638)
OBSERVACION:	Se puede APRECIAR que según información mostrada en la página de invierte pe, el proyecto no presenta avance físico.	

INFORME DEL PROVIAS DESCENTRALIZADO CON FECHA: 25/11/22 – OFICIO Nº 357-2022-MTC/21

ESTADO DE EJECUCION:	En Ejecución, se ha valorizado el monto de conservación rutinaria antes del mejoramiento por un monto acumulado de S/. 10, 317 790.30 (22.30%) Se debe mencionar que, en esta obra, aun no se ha tenido ninguna controversia por lo que se haya ido a arbitraje o se haya tenido que ejecutar la carta fianza.
-----------------------------	---



**ESTADO SITUACIONAL Y ACCIONES REALIZADAS:
CONTROVERSIA CON SUBCONTRATISTA NO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD**

CON FECHA: 21/12/2021	La Oficina de Administración remite a la Gerencia de Obras la carta S/N de asunto “COMUNICADO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE VALORIZACIONES POR PARTE DEL CONSORCIO VIAL PUCAHUASI ” (expediente v012155729), mediante el cual el Gerente General de la empresa VLV SERVICIOS GENERALES (en adelante VLV - subcontratista), informa del incumplimiento de pago por parte del CONSORCIO VIAL PUCAHUASI y solicita se tomen acciones de acuerdo a lo señalado en la carta en mención.
CON FECHA: 16/02/2022	Con oficio 00245-2022-MTC/21GO, Se notifica al CONSORCIO VIAL PUCAHUASI cumplir con los compromisos pactados.....
CON FECHA: 16/02/2022	Con Oficio N°00244-2022-MTC/21.GO, Se comunica ha VLV, que la entidad a través de la administración de contratos y firma supervisora ACRUTA Y TAPIA INGENIEROS SAC. Están dando seguimiento al accionar del contratista frente a terceros, siendo su obligación bajo apercibimiento.
CON FECHA: 04/04/2022	La empresa VLV. Comunica y denuncia y pide tomar acciones contra “CONSORCIO PUCAHUASI EN EL CUAL NO HA NOTIFICADO A LA ENTIDAD SOBRE NUESTRO CONTRATO, COMO SUB CONTRATISTA Y DONDE A SU VEZ NOS TIENE DEUDAS” Refiriendo que su contrato no ha sido notificado a la Entidad y solicita se tomen acciones.
CON FECHA: 19/04/2022 La entidad solicita a la supervisión, hacer de conocimiento si se ha suscrito sub contratos en cumplimiento a lo señalado en el numeral 8.2 (debe decir 9.2) subcontratación establecido en los TDR La supervisión hace de conocimiento sobre la posible subcontratación sin conocimiento de la entidad, indicando a su vez la infracción
CON FECHA: 27/04/2022	La entidad reitera solicitud, al CONSORCIO PUCAHUASI, informar a la brevedad si se ha suscrito sub contratos en cumplimiento a lo señalado en el numeral 8.2 (debe decir 9.2) subcontratación establecido en los TDRC Mediante carta S/N con número de expediente V012214217 el R.L. del Consorcio... refiere no haber suscrito subcontratos..., realizando su descargo frente a las denuncias recibidas por la empresa VLV, manifestando que la empresa VLV fue contratada como un proveedor de servicios La entidad Pide la opinión de la supervisión
CON FECHA: 07/05/2022La Supervisión envía informe sobre la infracción del CONSORCIO VIAL PUCAHUASI al no haber informado de Subcontratista....
CON FECHA: 23/05/2022	La Gerencia de Obras solicita a la oficina de Asesoría Jurídica opinión legal en referencia al incumplimiento contractual del CONSORCIO VIUAL PUCAHUASI referido a la no comunicación de la presunta Subcontratación de VLV
CON FECHA: 04/06/2022	Mediante Oficio N°301-2022-MTC/21.OA, remite a la secretaria del Tribunal de Contrataciones del Estado – OSCE la “SOLICITUD DE APLICACION DE SANCION REQUERIDA”



“Comisión Investigadora multipartidaria que investiga las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por empresas Chinas”

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

CON FECHA: 08/06/2022	Mediante Oficio 013095-2022-CG/DEN, La Contraloría General de la Republica, solicita remitir información en relación a la ejecución del servicio.
CON FECHA: 13/06/2022	La Entidad emite informe a la Contraloría....
CON FECHA: 14/09/2022	A la Fecha no hay notificación por parte del Tribunal de Contrataciones del Estado.

OBSERVACION

Ante esta Información, se procede a enviar oficios a la OSCE y a la CONTALORIA, para informar sobre las acciones que vienen realizando. Ya que podemos apreciar que se inició el reclamo por parte de la empresa sub contratista VLV con fecha 21/12/21 y hasta la fecha 25/11/22 (fecha recibida el informe) no se aprecia soluciones.

ACCIONES A REALIZAR

PERSONAS A CITAR:

1) AUTORIDADES

- DIRECTOR DE PROVIAS DESCENTRALIZADO ACTUAL O MINISTRO DEL MTC (CONTRATANTE)

2) LOS QUE FIRMARON EL CONTRATO

- REPRESENTANTE COMUN DE CONSORCIO VIAL PUCAHUASI – SR. FANG YIMIN – CE: N° 002212710 (CONTRATISTA)
- GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA CCA – SRA BEATRIZ ALEJANDRINA MONTEVERDE CALATAYUD – DNI:42540917

3) LOS INVOLUCRADOS EN LA EJECUCION DE OBRA

- SHEILY ARLEQUIN SEGURA ESTEBAN, DNI: 47300499 – GERENTE GENERAL DE VLV SERVICIOS GENERALES SAC (SUB CONTRATISTA)
- ING. MARTIN HAURANCCA CONTRERAS - ADMINISTRADOR DEL CONTRATO POR PROVIAS DESCENTRALIZADO
- VICTOR RAUL ALEJOS SIGUAS, DNI 21425642 – GERENTE VIAL POR PARTE DEL CONSORCIO VIAL PUCAHUASI
- MARIO WALTER CARREÑO FLORES, DNI 23851324 – RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DEL CONSORCIO VIAL PUCAHUASI
- TAPIA JULCA ELIAS TEODORO, DNI: 06003635
(Representante de la empresa Supervisora) Debera apersonarse con su Jefe de Supervisión.

SANCIONES QUE PESAN SOBRE ESTE CONSORCIO

1) Sanción Temporal

Inhabilitado desde 01/02/2023 al 07/08/2026



Motivo:

- Presentación de documentación falsa y/o inexacta a las entidades/Tribunal/OSCE

Numero de resolución: 1036-2016-TCE-S1

2) Sanción Temporal

Inhabilitado desde 01/02/2023 al 07/08/2026

Motivo:

- Presentación de documentación falsa y/o inexacta a las entidades/Tribunal/OSC

Numero de resolución: 1036-2016-TCE-S1

3) Sanción Temporal

Fecha: Del 13/10/2022 al 19/12/2022

Motivo:

- Presentación de documentación falsa y/o inexacta a las entidades/Tribunal/OSCE
- Numero de resolución: 749-2018-TCE-S3
- Medida Cautelar:

Sancionado por 42 meses, inhabilitación aplicada con Res. N° 1700-2017-TCE-S3 del 11.08.2017 y 0749-2018-TCE-S3 del 20.04.2018 por presentar documentos falsos e inexactos; infracción tipificada en el literal j) del num. 51.1 del art. 51 de la Ley de Contrataciones del Estado - D. Leg. N° 1017, modificada por Ley N° 29873, actualmente tipificada en los literales i) y j) del num. 50.1 del art. 50 de la Ley de Contrataciones del Estado-Ley N° 30225; SUSPENDIDA por Res. N° 1 del 15.12.2022 (Exp. N° 09723-2022-81-1801-JR-CA-04), notificada al OSCE con cédula electrónica el 16.12.2022, emitida por el Juez Lenin Montoro Rodríguez del Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo de Lima que admitió medida cautelar en favor de ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.; suspendiendo la Resolución N° 1700-2017-TCE-S3 y 0749-2018-TCE-S3. Especialista Vivian Cruz Sotomayor.

- Sancionado por 42 meses, inhabilitación aplicada con Res. N° 1700-2017-TCE-S3 del 11.08.2017 y 0749-2018-TCE-S3 del 20.04.2018 por presentar documentos falsos e inexactos; infracción tipificada en el literal j) del num. 51.1 del art. 51 de la Ley de Contrataciones del Estado - D. Leg. N° 1017, modificada por Ley N° 29873, actualmente tipificada en los literales i) y j) del num. 50.1 del art. 50 de la Ley de Contrataciones del Estado-Ley N° 30225; SUSPENDIDA por Res. N° 06 del 25.04.2018 y aclarada con Res. N° 07 del 10.05.2018 (Exp.



N° 00451-2017-0-3005-JR-CI-01), notificada esta última al OSCE el 10.05.2018, emitida por la Juez Jenny Giovana Palacios Paredes del Juzgado Civil Transitorio-Sede Villa Marina C.S.J. Lima Sur, que resolvió la ejecución anticipada de la sentencia en favor de la empresa ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.; disponiendo la nulidad de la Resolución N° 1700-2017-TCE-S3 y dejando sin efecto la Resolución N° 0749-2018-TCE-S3. Especialista Vila Paula Córdova.

4) Sanción Temporal

Fecha: Del 27/08/2003 al 27/02/2004

Motivo:

- DOCUMENTOS FALSOS

Numero de resolución: 707-2003-TC-S1

7.4 SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: CHAMAYA (DV. OLMOS) - JAÉN - SAN IGNACIO - PUENTE INTEGRACIÓN (FRONTERA CON ECUADOR) / SONDOR - TABACONAS - DV. SAN JOSÉ DEL ALTO - TAMBORAPA (EMP. PE-5N) / CANCHAQUE – HUANCABAMBA

DATOS DEL PROYECTO		
SERVICIO CP N° 23-2021- MTC-20 CUI: 2393145	SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: CHAMAYA (DV. OLMOS) - JAÉN - SAN IGNACIO - PUENTE INTEGRACIÓN (FRONTERA CON ECUADOR) / SONDOR - TABACONAS - DV. SAN JOSÉ DEL ALTO - TAMBORAPA (EMP. PE-5N) / CANCHAQUE – HUANCABAMBA	
CONSORCIO GANADOR		
CONTRATISTA A	CONSORCIO BELLAVISTA	RUC: 20608297929
Rep. Legal	CHEN JUNKUN	C.E. 002041063
Apoderado	YE SHUANGSHUANG	C.E. 003376496
Domicilio Fiscal	Jr. España Nro, S/n SAN MARTIN – Huallaga Sacanche	
Empresa Consorciada 1	CHINA RAILWAY N: 10 ENGINEERING GROUP LIMITED	
	Rep. Legal	GUO HONGBING
	Dom. Fiscal	CALLE DEAN VALDIVIA NRO 243 INT 601 URB. JARDIN LIMA – LIMA – SAN ISIDRO
	Accionista	CHINA FERROCARRIL S.A. (100%) (inf. Del Seace)
Empresa Consorciada 2	GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR ASOCIADOS S.A.C. – GC Y C.A. SAC.	
	Rep. Legal	AGUILAR QUISPE ALEXANDER FELIPE
	Dom. Fiscal	AV. MARISCAL OSCAR R. BENAVIDES NRO 679



“Comisión Investigadora multipartidaria que investiga las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por empresas Chinas”

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

		DPTO 504 URB LIMA INDUSTRIAL LIMA LIMA LIMA	
	Accionista	Monteverde Galatayud Beatriz Alejandrina- DNI 42540917 (50%)	
		Aguilar Quispe Roberto Jesús - DNI 75702514 (50%)	
Carta Fianza	ICBC PERU BANK	S/.15,834,752.18	
Monto de Licitacion	211,131,659.89	100%	
Propuesta Ganadora	S/. 158,347,521.74	75%	
Fecha de Inicio del Servicio	19/10/2021		
Plazo de Ejecución	1826 días calendario		
Fecha Fin del Servicio	19/10/2026		
PRIMERA ETAPA LICITACION DEL SERVICIO			
CONTRATANTE	PROVIAS NACIONAL		
PRESIDENTE	PEDRO CASTILLO TERRONES	DNI: 27427864	
MINISTRO	JUAN FRANCISCO SILVA VILLEGAS	DNI: 27376472	
D. PROVIAS NACIONAL	JORGE ROBERTO ÑAHUE SIVIRICHI	DNI: 09827306	
J. ADMINISTRACION	JOHANA NATALI BARRERA RAMIREZ	DNI: 42777486	
COMITÉ DE SELECCION	Presidente	Juan Carlos Castillo Vasquez	
	Primer Miembro	Basaldua Orellana Leydi Irela	
	Segundo Miembro	Lizzeti Villanueva Gianina Paol	
CONTRATISTA PERDEDOR			
CONTRATISTA A	Consortio Vial Huancabamba	RUC: 20608297929	
Rep. Legal	CHEN JUNKUN	C.E. 002041063	
Apoderado	YE SHUANGSHUANG	C.E. 003376496	
Domicilio Fiscal	Jr. España Nro, S/n SAN MARTIN – Huallaga Sacanche		
Prop. Econom.	s/. 160,882,324.84	76.2%	
Empresa Consorciada 1	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERÚ		RUC: 20604269009
	Rep. Legal	LIU XUEBING	C.E 004389888
	Dom. Fiscal	Av. Las Camelias Nro 280 (280 – 290 LAS CAMELIAS) LIMA – SAN ISIDRO	
	Accionista	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED	
Empresa Consorciada 2	INIP INGENIERÍA INTEGRACIÓN DE PROYECTOS SAC		RUC: 20601116082
	Rep. Legal	AGUILAR QUISPE ROBERTO JESUS	DNI: 75702514
	Dom. Fiscal	Cal. Mariano de los Santos Nro 135 Urb. Santa Ana LIMA – SAN ISIDRO	
	Accionista	AGUILAR QUISPE ALEJANDRO JEAN MARINE - DNI 48931630(50%) Aguilar Quispe Roberto Jesus - DNI 75702514 (50%)	



2DA ETAPA – EJECUCIÓN DE PROYECTO		
ESTADO DE EJECUCION DEL SERVICIO		CUI: 2393145
CONTRATO N°103-2021-MTC/20.2		
REPORTE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE INVERSION DEL FORMATO N° 12-B – INVIERTE PE -MEF		
SITUACION N:	SEGÚN EL FORMATO 12-B DE INVIERTE PE .	
AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA INVERSIÓN	AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN (4.2%)	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO DE LA INVERSIÓN A ENERO 2023 (4.2% = 2,660212,11)
OBSERVACION N:	Se puede apreciar que Invierte Pe no se presenta información sobre el avance físico	

INFORME N° 029-2023-MTC/20.13.1.3.PLM DE PROVIAS NACIONAL NUMERAL 3.8, REMITIDO A COMISIÓN INVESTIGADORA CON OFICIO N° 036-2023-MTC/01 DE 24 DE FEBRERO DE 2023 DE LAMINISTRA DEL MTC

ESTADO DE EJECUCION:	Hasta la fecha se ha venido ejecutando sólo los componentes de Conservación rutinaria y atenciones especiales (Atenciones de emergencia y situaciones de riesgo potencial): Monto de conservación rutinaria : S/ 49 351 462,67 Monto ejecutado de la Conservación rutinaria : S/ 7 192 211,16 (incl. Atenciones especiales) Porcentaje ejecutado conservación rutinaria : 14,57%
----------------------	---

OBSERVACION 1:

En el concurso público N° 23-2021-mtc-20 de 52 empresas registradas sólo se presentaron dos consorcios integrados por empresas chinas y peruanas, las empresas peruanas tenían un accionista común, con lo que se revela una concertación de postores para presentar sus ofertas, lo que riñe con el principio de "competencia"

En el Concurso Público N° 23-2021-MTC-20 se presentaron los siguientes Consorcios:



“Comisión Investigadora multipartidaria que investiga las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por empresas Chinas”

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

	CONSORCIO BELLAVISTA - ganador buena pro		CONSORCIO VIAL HUANCABAMBA - perdedor	
Rep Legal	CHEN JUNKUN CE 002041063		CHEN JUNKUN CE 002041063	
Apoderado	YE SHUANGSHUANG CE 003376496		YE SHUANGSHUANG CE 003376496	
Domicilio Fiscal	Jr. España s/n San Martín- Huallaga Sacanche		Jr. España s/n San Martín- Huallaga Sacanche	
Monto ofertado	S/. 158 347 521,74	sin IGV	S/ 160 882 324.84	sin IGV
Carta fianza	ICBC OERU BANK S/. 15 834 752,17 (75%)			
Empresa consorciada 1	Nombre	CHINA RAILWAY N:10 ENGINEERING GROUP LIMITED	Nombre	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCCION CORPORATION SUCURSAL DEL PERÚ
	Rep. Legal	GUO HONGBING	Rep. Legal	LIU XUEBING
	Accionista	CHINA FERROCARRIL (100%) del SEACE	Accionista	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED
	Domicilio Fiscal	Calle Dean Valdivia N° 243 int 601 Urb. Jardín Lima-Lima-San Isidro	Domicilio Fiscal	Av. Las Camelias N° 280 (280-290 LIMA- San Isidro
Empresa consorciada 2	Nombre	GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR ASOCIADOS SAC-GC y CA.SA	Nombre	INIP INGENIERIA INTEGRACIÓN DE PROYECTOS SAC RUC 20601116082
	Rep. Legal	AGUILAR QUISPE ALEXANDER FELIPE	Rep. Legal	AGUILAR QUISPE ROBERTO JESUS DNI 75702514
	Accionista	MONTEVERDE CALATAYUD BEATRIZALEJANDRINA (50%)	Accionista	AGUILAR QUISPE ALEJANDRO JEAN MARINE DNI 48931630 (50%)
		AGUILAR QUISPE ROBERTO JESÚS (50%)		AGUILAR QUISPE ROBERTO JESUS DNI 75702514 (50%)
	Domicilio Fiscal	Av. Oscar R. Benavides N° 679 Dpto 504 Urb Lima Industrial - Lima	Domicilio Fiscal	Cal. Mariano de los Santos N° 135 urb. Santa Ana Lima - San Isidro

Cuadro elaborado por el Congresista Héctor Valer Pinto y equipo
Fuente: información de la plataforma web del SEACE

De

El presente cuadro se establece que en el proceso de licitación los dos consorcios postulantes que presentaron propuestas estaban compuestos por empresas peruanas cuyos dueños eran familia (Aguilar Quispe) siendo el accionista Roberto Jesús Aguilar Quispe con el 50% de las acciones en las dos empresas INIP SAC y GC y CA SA. que formaron parte de los dos consorcios que se presentaron al Concurso Público N° 23-2021-MTC/20-1

Cabe señalar, que de las 56 empresas que se registraron en el SEACE solo dos consorcios participaron en el proceso de selección, el Consorcio Vial Bellavista y el Consorcio Vial Huancabamba que tiene el mismo representante legal, el mismo apoderado y el mismo domicilio fiscal y que además al tener un accionista común de sus empresas integrantes, se desprende una concertación de postores para presentar sus ofertas, lo que riñe con el principio de "Competencia" que prohíbe la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia, siendo esta composición de los consorcios una restricción establecida en el Reglamento de la Ley de Contrataciones aprobado con DS 344-2018-EF ART. 52 Literal e):

“ e) Promesa de consorcio legalizada, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades. Los integrantes



de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.”

Si bien los integrantes del Consorcio son diferentes razones sociales al tener un accionista común en ambos consorcios se han concertado las ofertas, incumpliendo el principio de Competencia que se establece en el TUO de la Ley de Contrataciones, donde se señala:

e) Competencia. Los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia.

Así también la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD PARTICIPACIÓN DE PROVEEDORES EN CONSORCIO EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO, DICE EN SU VII DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

7.1 IMPEDIMENTOS PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y/O CONTRATISTA

Los integrantes del consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.

OBSERVACION 2:

EN EL CONTRATO N°103-2021-MTC/20.2 1 DE SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL CHAMAYA Y OTROS TRAMOS DEL CONTRATO, SE VIENE RECONOCIENDO PAGOS AL CONTRATISTA SIN INCLUIR EL IGV, SIN HABER DEMOSTRADO QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS DE EXONERACIÓN QUE EXIGE LA LEY 27037 LEY DE PROMOCION DE LA INVERSIÓN EN LA AMAZONIA.

Mediante Informe de Control específico N° 018-2022-2-0661-SCE de 19 de setiembre de 2022 el OCI de Provías Nacional formula el siguiente hecho específico presuntamente irregular:



EL COMITÉ DE SELECCIÓN DEL CP N° 023-2021-MTC/20, CONOCIENDO DESDE LOS TDR QUE EL SERVICIO NO SE PRESTARÍA EN SU TOTALIDAD EN ZONA DE LA AMAZONÍA, A TRAVÉS DE LAS BASES PERMITIÓ LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SIN INCLUIR EL IGV; HABIENDO OTORGADO LA BUENA PRO AL CONSORCIO BELLAVISTA CUYA OFERTA ECONÓMICA NO INCLUYÒ EL PAGO DEL IMPUESTO , GENERANDO QUE SE TRASGREDAN NORMAS DEL CÓDIGO TRIBUTARIO Y LA LEY DEL IGV DEL IGV, E INCUMPLA LA ENTIDAD LA OBLIGACIÓN Y RESPONSABILIDAD COMO AGENTE RETENEDOR.”

En tal sentido, Provías Nacional deberá informar informe si al realizar el pago del adelanto y proceder al reconocimiento de valorizaciones ha verificado la veracidad de la declaración jurada Formato n° 7 de 7 de setiembre de 2021, que presentó el Consorcio Bellavista como parte de su propuesta del Concurso Público n° 023-2021-MTC/20, que exigían los siguientes requisitos:

1. Que el domicilio fiscal de la empresa se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad).
2. Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas jurídicas)
3. Que al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; y
4. Que la empresa no presta servicio fuera de la Amazonía.

7.5. SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) - CUMBA - DV. YAMÓN - LONYA GRANDE - CAMPO REDONDO - OCALLI - PROVIDENCIA - COHECHAN - LONYA CHICO - EMP. AM-108 (DV. LUYA) / CHACHAPOYAS - RODRÍGUEZ DE MENDOZA - ABRA LAJAS / EL DORADO - SELVA ALEGRE - SORITOR - EMP. PE-5N (LA CALZADA)



“Comisión Investigadora multipartidaria que investiga las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por empresas Chinas”

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

DATOS DEL PROYECTO

SERVICIO CUI: 2392901	SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) - CUMBA - DV. YAMÓN - LONYA GRANDE - CAMPO REDONDO - OCALLI - PROVIDENCIA - COHECHAN - LONYA CHICO - EMP. AM-108 (DV. LUYA) / CHACHAPOYAS - RODRÍGUEZ DE MENDOZA - ABRA LAJAS / EL DORADO - SELVA ALEGRE - SORITOR - EMP. PE-5N (LA CALZADA)		
CONSORCIO GANADOR			
CONTRATISTA	CONSORCIO ABRA LAJAS	RUC: 20606486864	
Rep. Común	FANG YIMIN	C.E. 002212710	
Domicilio Fiscal	MI MALECON HUALLAGA NRO 1060 HUANUCO-LEONCIO PRADO		
Empresa Consorciada 1	CHINA RAILWAY Nº 10 ENGINEERING GROUP LIMITED		RUC: 20601116082
	Rep. Legal	FANG YIMIN	C.E. 002212710
	Dom. Fiscal	CALLE DEAN VALDIVIA NRO 243 INT 601 URB. JARDIN LIMA-LIMA-SAN ISIDRO	
Empresa Consorciada 2	GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR ASOCIADOS S.A.C.-GC Y C.A. SAC.		RUC: 20602340547
	Rep. Legal	MONTEVERDE CALATAYUD BEATRIZ ALEJANDRINA	DNI: 44060179
	Dom. Fiscal	AV. MARISCAL OSCAR R. BENAVIDES NRO 679 DPTO 504 URB LIMA INDUSTRIAL LIMA LIMA LIMA	
	Accionista	Monteverde Calatayud Beatriz Alejandrina-DNI 42540917 (50%) Aguilar Quispe Roberto Jesus-DNI 75702514 (50%)	
Carta Fianza /Garantía de fiel cumplimiento 10%	INSUR S.A.	S/. 19,101,266.00	
Monto de Licitación	248,909,674.99		
Propuesta Ganadora	S/. 191,012,654.25		
Firma del Contrato	24/11/2020		
Fecha de Inicio del Servicio	09/11/2020		
FECHA DE INICIO EFECTIVO	09/11/2020 (SEGÚN reporte de invierte.pe)		
Plazo de Ejecución	2190 días calendario		
Fecha Fin del Servicio	07/11/2026		
1RA ETAPA- LICITACION DELSERVICIO			
CONTRATANTE	PROVIAS NACIONAL		
PRESIDENTE	MARTIN VIZCARRA CORNEJO	DNI: 04412417	
MINISTRO	CARLOS ESTREMADOYRO MORY	DNI: 04432268	
D. PROVIAS NACIONAL			DNI:
J. ADMINISTRACION	JACQUELINE MARISOL JANET GARCIA OLAVARRIA	DNI: 0652207	



“Comisión Investigadora multipartidaria que investiga las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por empresas Chinas”

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

PRIMERA LICITACION		
COMITÉ DE SELECCION	Presidente	Emerson Junior Santon Meza
	Primer Miembro	Angel Samuel Choque Gavilan
	Segundo Miembro	Irene Susana Aranguren Belaunde

De la revisión y análisis efectuada a la información y documentación vinculada al Otorgamiento de la Buena Pro" se han identificado situaciones adversas que afectan la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del procedimiento de selección CONCURSO PUBLICO N° 0031-2019-MTC/20 para la contratación de Servicio de gestión, mejoramiento y conservación vial por niveles de servicio del corredor vial: Emp. Pe-5n (Corral Quemado) - Cumba - Dv. Yamón - Lonya Grande - Campo Redondo - Ocalli - Providencia - Cohechan - Lonya Chico - Emp. Am-108 (Dv. Luya) / Chachapoyas - Rodríguez de Mendoza - Abra Lajas / El Dorado - Selva Alegre - Soritor - Emp. Pe-5n (La Calzada).

INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO, INFORME DE HITO DE CONTROL N° 003-2022-OCI/0661-SCC¹⁰

"SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) - CUMBA - DV. YAMÓN - LONYA GRANDE - CAMPO REDONDO - OCALLI - PROVIDENCIA - COHECHAN - LONYA CHICO - EMP. AM-108 (DV. LUYA) / CHACHAPOYAS - RODRÍGUEZ DE MENDOZA - ABRA LAJAS / EL DORADO - SELVA ALEGRE - SORITOR - EMP. PE-5N (LA CALZADA)"

A) EJECUCIÓN DEL SERVICIO:

Del la Contraloría General de la Republica concluye:

a.1) “DETERIOROS O FALLAS EN SECTORES DE LA RUTA 1 DEL CORREDOR VIAL: EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) - CUMBA - DV. YAMÓN - LONYA GRANDE - CAMPO REDONDO - OCALLI - PROVIDENCIA - COHECHAN - LONYA CHICO - EMP. AM-108 (DV. LUYA) / CHACHAPOYAS - RODRÍGUEZ DE MENDOZA - ABRA LAJAS / EL DORADO - SELVA ALEGRE - SORITOR - EMP. PE-5N (LA CALZADA), PONDRÍAN EN RIESGOLA TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD DE LOS USUARIOS, SIENDO LA INACCIÓN DEL CONTRATISTA CONSERVADOR PASIBLE DE PENALIDADES.

Consecuencia:

De lo expuesto, se colige que los sectores que presentan deterioros o fallas en la infraestructura vial de la ruta 1 del corredor vial: Emp. PE-5N (Corral quemado)-Cumba-Dv.Yamon-Lonya Grande-Campo Redondo-Ocalli-Porvidencia-Cohechan-Lonya Chico-Emp. AM-108 (Dv. Luya)/Chachapoyas-Rodriguez de Mendoza-Abra

¹⁰ Disponible en: https://s3.amazonaws.com/spic-informes-publicados/informes/2022/04/2022CSI066100003_ADJUNTO.pdf (Fecha de informe: 22.03.2022).



Lajas/El Dorado-Selva Alegre-Soritor-Emp. PE-5N (La Calzada), pondrían en riesgo la transitabilidad y seguridad de los usuarios de la vía, siendo pasible de penalidades la inacción del Contratista Conservador.”

B) Del INFORME DEL CONTROL CONCURRENTE N° 006-2022-OCI/0661-SCC¹¹ la Contraloría General de la Republica concluye:

b.1) “EN EL PAGO DE LAS VALORIZACIONES MENSUALES DEL CONTRATO N° 078-2020- MTC/20 TRAMITADAS HASTA LA FECHA, NO SE VIENE DESCOTANDO LAS LONGITUDES DE ZONAS URBANAS CON PAVIMENTO RÍGIDO DONDE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO NO CONTEMPLAN LA CONSERVACIÓN RUTINARIA ANTES DEL MEJORAMIENTO; LO QUE REPRESENTARÍA PAGOS EN EXCESO EFECTUADOS AL CONTRATISTA CONSERVADOR Y PENALIDADES PARA EL SUPERVISOR CONSERVADOR EN DETRIMENTO DE LA ENTIDAD.

Consecuencia:

De lo evaluado anteriormente, se advierte que en las valorizaciones mensuales del contrato N°. 078-2020-MTC/20 tramitadas hasta la fecha de emisión del presente informe, no se descotaron las longitudes de zonas urbanas con pavimento rígido donde los TdR del Servicio no contemplan la “conservación rutinaria antes”; lo que representaría pagos en exceso al Contratista Conservador y penalidades para el Supervisor Conservador en detrimento de la Entidad.”

b.2) “DURANTE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO NO SE APLICARON PENALIDADES AL CONTRATISTA CONSERVADOR POR RETRASO EN LA PRESENTACIÓN DEL PLAN COVID-19, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES, IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN, ENTRE OTROS; LO QUE PODRÍA MENOSCABAR LOS RECURSOS DEL ESTADO.

Consecuencia:

De lo expuesto precedentemente, se advierte que durante la ejecución no se aplicaron penalidades al Contratista Conservador por retraso en la representación del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19, atención de emergencias viales, implementación de señalización, entre otros; lo que podría menoscabar los recursos del Estado.”

b.3) “DURANTE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SE APROBARON CINCO (5) REPROGRAMACIONES PARA LA CULMINACIÓN DE LA "TRANSITABILIDAD"

¹¹ Disponible en: https://s3.amazonaws.com/spic-informes-publicados/informes/2022/05/2022CSI066100006_ADJUNTO.pdf (Fecha de informe: 29.04.2022).



POR PRESENCIA DE PRECIPITACIONES, PESE A QUE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR) DEL SERVICIO TRASLADAN LOS RIESGOS AL CONTRATISTA CONSERVADOR Y QUE LAS PRECIPITACIONES PRESENTADAS SON TÍPICAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL CORREDOR VIAL; LO QUE NO PERMITIÓ ALCANZAR LOS NIVELES DE SERVICIO EN LA OPORTUNIDAD PROGRAMADA EN LOS TDR, PUDIENDO GENERAR PENALIDADES.”

Consecuencia:

De lo expuesto, se advierte que se aprobaron 5 reprogramaciones para la culminación de la transitabilidad por presencia de precipitaciones, pese a que los términos de referencia del servicio trasladan los riesgos al Contratista Conservador y que las precipitaciones presentadas son típicas de la zona de influencia del corredor vial; lo que no permitió alcanzar los niveles de servicio en la oportunidad programada en los TDR, pudiendo generar penalidades.”

VIII. LIMITACIONES Y ACTOS PENDIENTES DE REALIZAR POR LA COMISIÓN

8.1 Limitaciones

Considerando los 186 contratos a investigar, hallados entonces por esta comisión después de haber enfrentado limitaciones administrativas en su trabajo, que no le han permitido profundizar en más del 20% de los 186 contratos. Entre las limitaciones administrativas están: el no contar con ambientes de trabajo asignados específicamente para la comisión, al no contar con el equipo profesional y especializado completo, asignación presupuestal para gastos administrativos afectando muchas veces el salario de las cinco personas que trabajaron en esta comisión.

Asimismo, hemos tenido que enfrentar los retrasos propios de la coyuntura social que vivió el país en los meses de enero y parte del mes de febrero, como son las protestas sociales y el cambio de las nuevas autoridades regionales y municipales que han retardado el normal desenvolvimiento de la comisión.

A pesar de ello, el esfuerzo realizado por los Congresistas miembros de esta comisión y el equipo técnico y jurídico compuesto por dos abogados, dos ingenieros civiles (uno de ellos destacado por la Contraloría General de la República), un ingeniero de Sistemas e Informática; más un técnico del servicio parlamentario y dos auxiliares administrativos; ha alcanzado detectar logros tan importantes como lo manifestado en el párrafo anterior. Por ello, es necesario ampliar el plazo de investigación para culminar con el 80% de contratos que se ha detectado. Contratos que a la fecha del



análisis tienen indicios y pruebas plenas por ratificar ante el poder judicial que señalan una organización criminal bien montada desde los términos de referencia, pasando por los comités de selección, suscripción de contratos con vicios ocultos y falsificación de documentos, estafas contra pequeños y medianos empresarios constructores en diferentes regiones del país, como hemos señalados en los acápite anteriores de este informe.

En el plazo adicional que se nos permita haremos diligencias importantes como el levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria, el secreto de comunicaciones y la reserva bursátil; acciones necesarias para el análisis confrontación y verificación de la conducta reprochable de los participantes de esta organización criminal.

La limitación del tiempo para el logro de los objetivos, es la principal dificultad que debe afrontar la comisión. Ello es debido, en primer lugar, a la amplitud y complejidad de la materia de la investigación; y, en segundo lugar, al corto plazo (120 días útiles) **para cumplir con el encargo del Pleno; ambos imposibilitan materialmente el trámite de diligencias importantes como el levantamiento del secreto bancario, la reserva tributaria y el secreto de las comunicaciones necesarios para el análisis, confrontación y verificación de testimonios, validación de los posibles indicios probatorios de la comisión de delitos.**

Es necesario agregar que las dificultades anteriores se suman retardos en las respuestas de las entidades públicas, paros por la coyuntura de la política nacional Y Otros Que Han Afectan De Manera Importante la labor de la Comisión Investigadora.

8.2 OTROS ACTOS ADMINISTRATIVOS PENDIENTES A REALIZAR

Complementar la información requerida a las entidades públicas y privadas que aún no se ha sido remitido a la comisión por parte de las entidades, la información que van a proporcionar estas entidades va ser significativa para el esclarecimiento de los hechos investigados, como se puede observar en el presente informe estas entidades aún no ha cumplido con la atención de la totalidad de los requerimientos solicitados. Y en el caso de la información que se encuentra en la plataforma del SEACE no se cuelga las propuestas perdedoras; e Invierte Pe e Infobras no tienen actualizado el avance físico financiero de la obra; las entidades deben proporcionar la situación legal de los contratos, si se encuentran en procesos legales o administrativos pendientes, si se encuentran en arbitrajes o se han resuelto los contratos, por lo que hemos presentado ante esas entidades se nos dé las facilidades de ingreso a través de la tecnología de la información desde el cerebro informático de esta comisión.



Conforme se va recopilando la información va ser necesario realizar el análisis de la información faltante que debe ser enviada por parte de las entidades involucradas, en muchos casos hay información recientemente enviadas y en otras entregadas de manera parcial, información que deberá ser analizada en el plazo ampliatorio solicitado.

8.3 Los actos administrativos y datos a considerar son:

a) Administrativas: estudios, bases, adjudicaciones, contratos, ejecución, supervisión. Solución de controversias, porcentaje de avances, adicionales y estado de los proyectos.

b) Banca y finanzas: los reportes e información bancaria y bursátil correspondiente a las personas para las que se les solicitara de ser el caso, el levantamiento del secreto bancario y reportes de inteligencia financiera, así como los pedidos no sujetos a secretos bancarios que se efectuara a las instituciones financieras que intervinieron las empresas chinas o consorcios chino - peruano.

c) Tributaria: información en base al levantamiento de la reserva tributaria a solicitar para verificar el estado de las empresas chinas o consorcios chino – peruano.

d) Registral y Notarial: se solicitará información a la superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP y a los notarios para que informen sobre cualquier acto jurídico en los que habrían intervenido las personas investigadas que pudieran resultar del proceso de análisis de la información.

e) Movimientos Migratorios: del mismo modo se solicitará los movimientos migratorios de las personas que resulten investigadas producto del análisis de la información por llegar.

f) Otras acciones a realizar

8.4) La realización de audiencias públicas, secretas con sesiones reservadas, visitas de inspección física a los proyectos y sesiones descentralizadas con la finalidad de citar a los presuntos responsables e involucrados en cualquier grado de responsabilidad, así como testigos y colaboradores, cuyos informes, descargos y testimonios sean pertinentes para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación.

8.5) Realizar la valorización acumulada físico, económico y financiero de los 186 contratos.



IX.- CONCLUSIONES

1. Una de las primeras conclusiones que podemos llegar es que las Mociones de Orden del Día, presentado por los señores Congresistas del Grupo Parlamentario Acción Popular, Juan Carlos Mori Celis y Jorge Luis Flores Ancachi, y de la Congresista Patricia Chirinos Venegas del Grupo Parlamentario Avanza País, y la aprobación del Pleno del Congreso de esta comisión, tienen una alta credibilidad concordante con las denuncias realizadas por los medios de comunicación y los ciudadanos afectados, debido que se ha podido detectar que las empresas chinas o sus consorcios Chinos- Peruano fueron ganando las licitaciones con “trafa”, es decir, vulnerando normas nacionales de los cuales fueron suscritos 99 contratos por el MTC, 55 diversos Gobiernos Regionales y 32 por otros Ministerios; sumando en total 186 contratos.

Cabe resaltar que de estos 186 se encuentran en investigación 154, debido a que estas se encuentran dentro de las atribuciones que tiene la presente comisión por mandato del Congreso de la República.

2. Dentro de la investigación en el período 2018 al 2022 con competencia de esta comisión, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el año 2018 suscribió 06 contratos durante el gobierno de los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski Godard y Martín Vizcarra, en el año 2019 suscribió 39 contratos en el periodo del expresidente Martín Vizcarra, en el año 2020 suscribió 18 contratos también en el gobierno del expresidente Martín Vizcarra Cornejo, en el año 2021 suscribió 26 contratos en el gobierno del expresidente Francisco Rafael Sagasti Hochhausler y el expresidente Pedro Castillo Terrones y en el 2022, 03 contratos también en el gobierno del expresidente Pedro Castillo; haciendo un total de 99 contratos. Cabe resaltar que los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski Godard y Martín Vizcarra Cornejo suscribieron 63 contratos con las empresas chinas o consorcios Chino-Peruano; seguidos de los expresidentes Francisco Rafael Sagasti Hochhausler y Pedro Castillo Terrones con 29 contratos.
3. Así mismo, queremos resaltar que los 32 contratos firmados por otros ministerios son el Ministerio de Vivienda, Justicia y Derechos Humanos, Educación, Salud, Agricultura, Producción, Interior, Energía y Minas, Trabajo, haciendo un total de 32 contratos por más de 1724 millones de soles.
4. Respecto a los Gobiernos Regionales, ellos suscribieron 55 contratos. Amazonas 3, Arequipa 2, Ayacucho 4, Cajamarca 5, Callao 1, Cusco 4, Huánuco 1, Huancavelica 3, Junín 4, La Libertad 4, Lima 4, Pasco 5, Piura 9,



Puno 1, San Martín 1, Lambayeque 2, por más de 4013 millones de soles.

5. Respecto a los montos adjudicados en cada año podemos advertir que el 2020 fue al año con el mayor monto de contratación teniendo una cifra de S/. 2,223'960, 467.00, le sigue el 2021 con un monto de S/. 1, 717'709,827.00, el 2019 con un monto de 1,003'681,155.00 y el 2022 con un monto de S/. 12'895,322.72.
6. También hemos podido detectar que solo 13 empresas chinas están involucradas en la mayoría de las licitaciones con el estado peruano, habiendo alcanzado un total de 154 contratos hasta por la suma de S/. 5,913'191,566.99 suscritos con el MTC, y S/. 4,013'095,272.94 con los gobierno regionales y locales, haciendo un monto total de S/ 9,926'286,839.93.
7. Durante las primeras audiencias y sus respectivas sesiones la Comisión Investigadora ha recopilado información de suma importancia y relevancia y se viene corroborando las denuncias hechas por los Congresistas de diferentes regiones, medios de comunicación, y por los empresarios víctimas por las empresas Chinas o consorcios chinos-peruanos “Club del Dragón”.

Cabe resaltar que la intervención de los invitados conferencistas como la de la abogada y Dra. Mónica Yaya Luyo, expresidente del Tribunal de Contrataciones, y el Presidente de la Cámara de Construcción, Ing. Jorge Zapata Ríos, ha permitido tener una visión más clara respecto a esta organización criminal con un propio *iter criminis*, organización de funcionarios bajo la metodología de racimo de uvas, y ejecución de obras bajo la metodología de subcontratación de empresas locales que ejecuten las obras con su propio capital, equipos y maquinarias para luego ser estafados por la mayoría de estas empresas chinas o consorcio chino-peruano “Club del Dragón”

8. hechas por e ha iniciado la etapa de citaciones de la comisión investigadora mediante la cual se ha podido recopilar información de suma importancia relevancia y al mismo tiempo se ha podido corroborar las denuncias realizadas por medios de comunicación y por lo empresarios afectados por las empresas chinas o consorcios chino – peruano. Esta intervención de los invitados nos ha permitido tener una visión más clara de algunos hechos relevantes, como es el caso de la subcontratación de empresas locales para que ejecuten las obras y las situaciones de desventaja de las empresas peruanas respecto a las líneas de crédito, en esta etapa de la investigación realizada por la comisión.



“Comisión Investigadora multipartidaria que investiga las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por empresas Chinas”

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

X. PEDIDO DE AMPLIACION DEL PLAZO PARA ESTA COMISION

De acuerdo a lo expuesto en el presente informe preliminar, estamos conscientes y convencidos que esta organización criminal debe ser identificada en toda su estructura orgánica; para dicho propósito es necesario continuar con las invitaciones a testigos y conferencistas, citaciones a los involucrados, audiencia y sesiones reservadas con las partes contratantes y sindicatos *extreñeus*, así como, levantar los secretos bancarios, financieros y bursátil de los contratantes, no solo afín de ayudar a resarcir el daño causado a los más de m entre trabajadores, micro y pequeños empresarios de nuestra patria. Por lo que, solicitamos antes el honorable Pleno del Congreso un plazo ampliatorio de **doscientos (200) días hábiles** con la finalidad de concluir con los actos técnicos-jurídicos necesarios de investigación y la redacción del **INFORME FINAL**.

FIN



XI. ANEXOS

ANEXO I OFICIOS EMITIDOS

N° de Oficio	NOMBRE O DESTINATARIO	CARGO	ASUNTO
Oficio N° 002	ROBERTO LÓPEZ LÓPEZ	DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS - ARCC	Requerimiento de información sobre las obras adjudicadas a empresas chinas o Consorcio Chino-Peruano desde el año 2018 a la actualidad
Oficio N° 003	Christopher Parodi Rumiche	Subdirector Regional de Piura de la Autoridad para la Reconstrucción con cambios -ARCC	Requerimiento de información
Oficio N° 004	Raul Rueda Meloni	Subdirector Regional de Tumbes de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - ARCC	Requerimiento de información
Oficio N° 005	Fredy Erick Bohorquez Cosi	Subdirector Regional de Lima de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - ARCC	Requerimiento de Información
Oficio N° 006	Henry Fernando Sausa Montenegro	Subdirector Regional de Lambayeque de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - ARCC	Requerimiento de Información
Oficio N° 007	Herbert Christian Alcantara Heredia	Subdirector Regional de la libertad de la Autoridad para Reconstrucción con Cambios ARCC.	Requerimiento de información.
Oficio N° 008	Luis Angel Morales Marin	Subdirector Regional de Cajamarca de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios ARCC.	Requerimiento de información
Oficio N° 009	Abel Saravia Angles	Subdirector Regional de Arequipa de la Autoridad	Requerimiento de información



		para la Reconstrucción con Cambios - ARCC	
Oficio N° 0010	Walter Hugo Sandoval Baltazar	Subdirector Regional de Ancash de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios- ARCC	Requerimiento de información
Oficio N° 013	Richard Washington Tineo Quispe	Ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC)	Solicito Informe Tecnico
Oficio N°0014	Rufino Galindo Caro	Director Ejecutivo de proovias Nacional	Solicito Informe Tecnico
oficio N°0015	Francisco Quevedo Mogollon	Director Ejecutivo de Provias Descentralizado	Solicito Informe Tecnico
Oficio N°0016	Franciso Cevasco Piedra	Oficial Mayor del Congreso de la Republica	Habilitacion de anexos
Oficio N° 0017	Henry Augusto Borja Cruzado	Gobrenador Regional de Ancash	Solicito Informe Tecnico
Oficio N°0018	Baltazar Iantarón Núñez	Gobernador Regional Apurimac	Solicito Informe Tecnico
Oficio N° 0019	Kimmerlee Keily Gutierrez Canahuire	Gobernador Regional Arequipa	Solicito Informe Tecnico
Oficio N°0020	Carlos Alberto Rua Carbajal	Gobernador Regional Ayacucho	Solicito Informe Tecnico
Oficio N° 0021	Dante Jose Mandriotti	Gobernador Regional Callao	Solicito Informe Tecnico
Oficio N° 0022	Jean Paul Benavente Garcia	Gobernador Regional Cusco	Solicito Informe Tecnico
Oficio N° 0023	Maciste Díaz Abad	Gobernador Regional Huancavelica	Solicito Informe Tecnico
Oficio N° 0024	Erasmus Alejandro Fernandez Sixto	Gobernador Regional Huánuco.	Solicito Informe Tecnico



Oficio N° 0025	Javier Gallegos Barrientos	Gobernador Regional Ica	Solicito Informe Tecnico
Oficio N° 0026	Clever Mario Mercado Mendez	Gobernador Regional Junín	Solicito Informe Tecnico
Oficio N° 0027	Oscar Ramiro Altamirano Quipe	Gobernador Regional de Amazonas	Solicito Informe Tecnico
Oficio N°0028	Manuel Felipe Llampén Coronel	Gobernador Regional La Libertad	Solicito Informe Tecnico
Oficio N° 0029	Anselmo Lozano Centurión	Gobernador Regional Lambayeque	Solicito Informe Tecnico
Ofico N° 0030	Ricardo Chavarría Oria	Gobernador Regional Lima	Solicito Informe Tecnico
Oficio N° 0031	Elisbán Ochoa Sosa	Gobernador Regional Loreto	Solicito Informe Tecnico
Oficio N° 0032	Herlens Jefferson Gonzales Enoki	Gobernador(a) Regional Madre de Dios	Solicito Informe Tecnico
Oficio N° 0033	Zenón Gregorio Cuevas Pare	Gobernador(a) Regional Moquegua	Solicito Informe Tecnico
Oficio N° 0034	Pedro Ubaldo Polinar	Gobernador Regional Pasco	Solicito Informe Tecnico
Oficio N° 0035	Servando Garcia Correa	Gobernador Regional Piura	Solicito Informe Tecnico
Oficio N° 0036	German Alejo Apaza	Gobernador Regional Puno	Solicito Informe Tecnico
Oficio N° 0037	Pedro Bogarín Vargas	Gobernador Regional San Martín	Solicito Informe Tecnico



“Comisión Investigadora multipartidaria que investiga las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por empresas Chinas”

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Oficio N° 0038	Juan Toconi Quispe	Gobernador Regional Tacna	Solicito Informe Tecnico
Oficio N° 0039	Jose Antonio Aleman Ifante	Gobernador Regional Tumbes	Solicito Informe Tecnico
Oficio N° 0040	Angel Luis Gutierrez Rodriguez	Gobernador Regional Ucayali	Solicito Informe Tecnico
Oficio N° 0041	Mesías Antonio Guevara Amas	Gobernador Regional Cajamarca	Solicito Informe Tecnico
Oficio N° 0042	Polo Florencio Agüero Sanchez	Gerente de Proyectos Servicio de agua potable y alcantarillado de Lima- SEDAPAL Distrito del Agustino	Solicito Informe Tecnico
Oficio N° 0043	Edgardo Cornelio Reymundo Mercado	Congresista de la República Vocero de Cambio Democrático Juntos por el Peru	Reiterativo de Designación Integrante a la comision
Oficio N° 0044	Jose Daniel Williams Zapata	Presidente de Congreso de la República	Solicita se reitere pedido de informe documentado y detallado, según anexos adjunto
Oficio N° 0060	Ada Rosa Basulto Liewald	Presidenta Ejecutiva del Organismo Supervio de las Contrataciones del Estado- OSCE	Solicito informe detallado y documentado sobre las contrataciones realizadas por la Empresa China Railway N° 10 Engineering group co.ltd Sucursal del Perú
Oficio N° 0061	Paola Lazarte Castillo	Ministra de Transporte y Comunicaciones	Solicito Informe Tecnico del estado situacional de los servicios prestados al



“Comisión Investigadora multipartidaria que investiga las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por empresas Chinas”

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

			estado por las empresas que se indican.
Oficio N° 0062	Paola Lazarte Castillo	Ministra de Transporte y Comunicaciones	Solicito informe Técnico de Adjudicaciones indicadas
Oficio N°0063	Eduar Jesus Salazar Sanchez	Superintendente de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos	Solicito información sobre partidas registrales de las empresas que se indican.
Oificio N° 0064	Liz Patricia Benavides Vargas	Fiscal de la Nación	Solicito informe detallado y documentado sobre las denuncias que existen contra las personas naturales y juridicas vinculadas a los servicios y obras contratados por el Estado Peruano.
Oficio N°0065	Nelson Eduardo Shack Yalta	Contralor General de la Republica	Solicito un informe detallado y documentado sobre el estado situacional de los procesos arbitrales, vinculados a las obras y servicios que se indican
Oficio N° 0066	Ada Rosa Basulto Liewald	Presidenta Ejecutiva del Organismo Supervio de las Contrataciones del Estado-OSCE	Solicito informe detallado de las convocatorias; resgistro y de participantes; formulación y absolución de consultas; formulación y absolución de



			observación; proporcione las bases integradas y presentación de propuestas; calificación y evaluación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, sobre las labores de supervisión efectuadas por el OSCE, al proceso de la licitación de los expedientes de saldo de obras de los proyectos
Oficio N° 072	Edinson Reategui Vasquez	Alcalde Distrital de Buenos aires - SAN MARTIN	Solicito informe del estado de los contratos que se indica
Oficio N° 073	Jose Hector Garcia Chenta	Alcalde Distrital de Choros-CAJAMARCA	Solicito informe del estado de los contratos que se indica
Oficio N° 074	Jesus Diaz Casahuaman	Alcalde Distrital la Encañada	Solicito informe del estado de los contratos que se indica
Oficio N° 075	Jaider Delgado Camacho	Alcalde Distrital de Lancones	Solicito informe del estado de los contratos que se indica
Oficio N° 076	Sergio Vilchez Neira	Alcalde Distrital de Laredo	Solicito informe del estado de los contratos que se indica
Oficio N° 077	Elmer Augusto Leon Pairazaman	Alcalde Provincial de Pacasmayo	Solicito informe del estado de los



			contratos que se indica
Oficio N° 078	Esau Rios Sherigorompi	Alcalde Distrital de Megantoni	Solicito informe del estado de los contratos que se indica
Oficio N° 079	Rosas Augusto Tacuche Mariño	Alcalde Distrital de San Miguel de Cauri	Solicito informe de estado de los contratos que se indica
Oficio N° 080	Rohel Sanchez Sanchez	Gobernador Regional de Arequipa	Solicito informe del estado de los contratos que se indica
Oficio N° 081	Wilfredo Ocorima Nuñez	Gobernador Regional de Ayacucho	Solicito informe del estado de los contratos que se indica
Oficio N° 082	Guevara Rodriguez Roger	Gobernador Regional de Cajamarca	Solicito informe del estado de los contratos que se indica
Oficio N° 083	Ciro Ronald Castillo Rojo Salas	Gobierno Regional de Callao	solicito informe de los contratos que se indica
Oficio N° 084	Werner Maximo Salcedo Alvarez	Gobernador Regional de Cusco	Solicito infomr del estado de los contratos que se indica
Oficio N° 085	Maciste Alejandro Diaz Abad	Gobernador Regional Huancavelica	Solicito informe del estado de los contratos que se indica
Oficio N° 086	Zosimo Cardenas Muje	Gobernador Regional de Junin	Solicito informe del estado de los contratos que se indica
Oficio N° 087	Cesar Acuña Peralta	Gobernador Regional La Libertad	Solicito informe del estado de los



			contratos que se indica
Oficio N° 088	Jorge Luis Perez Flores	Gobernador Regional de Lambayeque	Solicito informe del estado de los contratos que se indica
Oficio N°089	Rafael Lopez Aliaga	Alcalde de Lima	Solicito informacion del estado de los contratos que se indica
Oficio N° 090	Juan Luis Chombo Heredia	Gobernador Regional de Pasco	Solicito información del estado de los contratos que se indica
Oficio N° 091	Luis Ernesto Neyra Leon	Gobernador Regional de Piura	Solicito información sobre partidas registrales de las empresas que se indican.
Oficio N° 092	Richard Huancock Soncco	Gobernador Regional de Puno	Solicito informe del estado de los contratos que se indica
Oficio N° 093	Gilmer Wilson Horna Corrales	Gilmer Gobernador Regional Amazonas	Solicito informe del estado de los contratos que se indica
Oficio N° 094	Manuel Gambini Rupay	Gobernador Regional de Ucayali	Solicito informacion que se indica
Oficio N° 095	Gilia Ninfa Gutierrez Ayala	Gobernador Regional de Moquegua	Solicito informacion que se indica
Oficio N° 096	Fabian Koki Noriega Brito	Gobernador Regional de Ancash	Solicito informacion que se indica
Oficio N° 097	Percy Godoy Medina	Gobernador Regional de Apurimac	Solicito informacion que se indica
Oficio N° 098	Antonio Leonidas Pulgar Lucas	Gobernador Regional de Huánuco	Solicito informacion que se indica
Oficio N° 099	Jorge Carlos Hurtado Herrera	Gobernador Regional de ICA	Solicito informacion que se indica



“Comisión Investigadora multipartidaria que investiga las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por empresas Chinas”

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Oficio N° 100	Jorge Rene Chavez Silvano	Gobernador Regional de Loreto	Solicito informacion que se indica
Oficio N° 101	Luis Otsuka Salazar	Gobernador Regional Madre de Dios	Solicito informacion que se indica
Oficio N° 102	Rosa Gloria Vasquez Cuadrado	Gobernador Regional de Lima	Solicito información que se indica
Oficio N° 103	Walter Grundel Jimenez	Gobernador Regional San Martin	Solicito informacion que se indica
Oficio N° 104	Luis Ramon Torres Robledo	Gobernador Regional de Tacna	Solicito informacion que se indica
Oficio N° 105	Segismundo Cruce Ordínola	Gobierno Regional de Tumbes	Solicito informacion que se indica
Oficio N° 106	Luis Enrique Vera Castillo	Superintendente Nacional de Administración Tributaria	Solicito informe tributario detallado de la empresa China Railway N°10 Engineering Group Co. Ltd Sucursal Perú con RUC 20601116082
Oficio N° 0107	Armando Benjamin Garcia Chunga	Superintendente Nacional de Migraciones	Solicito informe el record migratorio de los ciudadanos Chinos que se indica
Oficio N° 108	Hania Pérez de Cuéllar Lubienska	Ministra de vivienda, Contruccion y Saneamiento	Solicito informe del estado de los contratos que se indica
Oficio N° 109	Albina Ruiz Ríos	Ministra del Ambiente	Solicito informe de adjudicaciones
Oficio N° 110	Luis Fernando Helguero Gonzáles	Ministro de Comercio Exterior y Turismo	Solicito informe de adjudicaciones
Oficio N° 111	Jorge Luis Chavez Cresta	Ministro de Defensa	Solicito informe de adjudicaciones



Oficio N° 112	Alex Alonso Contreras Miranda	Ministro de Economía y Finanzas	Solicito informe de adjudicaciones
Oficio N° 113	José Andres Tello Alfaro	Ministro de Justicia y Derechos Humanos	Solicito informe de adjudicaciones
Oficio N° 114	Nancy Rosalina Tolentino Gamarra	Ministra de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables	Solicito informe de adjudicaciones
Oficio N° 115	Ana Cecilia Gervasi Díaz	Ministra de Relaciones Exteriores	Solicito informe de adjudicaciones
Oficio N° 116	Nelly Paredes del Castillo	Ministra de Desarrollo Agrario y Riego	Solicito informe del estado de los contratos que se indica
Oficio N° 117	Oscar Manuel Becerra Tresierra	Ministro de Educacion	Solicito informe del estado de los contratos que se indica
Oficio N° 118	Oscar Electo Vera Gargurebich	Ministro de Energia y Minas	Solicito informa del estado de loa contratos que se indica
Oficio N° 119	Raúl Pérez Reyes Espejo	Ministro de la Produccion	Solicito informe del estado de los contratos que se indica
Oficio N° 120	Rosa Bertha Gutierrez Palomino	Ministra de Salud	Solicito informe del estado de los contratos que se indica
Oficio N° 121	Alfonso Adrianzén Ojeda	Ministro de Trabajo y Promoción del empleo	Solicito informe del estado de los contratos que se indica
Oficio N° 122	Vicente Romero Fernandez	Ministro del Interior	Solicito informe del estado de los contratos que se indica
Oficio N° 125	Zapata Rios Jorge Alberto	Presidente de la camara Peruana de la Construccion	Invitamos a usted a la sesion de la Comisión



“Comisión Investigadora multipartidaria que investiga las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por empresas Chinas”

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

			Investigadora Multipartidaria que investiga las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por empresas Chinas
Oficio N° 0126	José Francisco Cevasco Piedra	Oficial Mayor del Congreso de la Republica	Solicitud de pase temporal a personal destacado por la Contraloria General.
Oficio N° 127	Yaya Luyo Monica Yadira	Ex Presidenta del Organismo Supervisor de las Contrataciones con el estado	Invitamos a usted a la sesion de la Comisión Investigadora Multipartidaria que investiga las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por empresas Chinas
Oficio N° 128	Nelly Paredes del Castillo	Ministra de Desarrollo Agrario y RieSgo	Solicita Información sobre "Procesos de Sorteo" realizado en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego; para la contratación de empresas para la <i>Formulación del Plan Integral para el control de inundaciones y movimientos de masa de las cuencas de los rios</i> : OLMOS, VIRÚ Y ZAÑA
Oficio N° 0129	FANG YIMIN	Representante Común del Consorcio Vial Pucahuasi	Comparecencia a sesion de comisión investigadora



“Comisión Investigadora multipartidaria que investiga las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por empresas Chinas”

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Oficio N° 0130 A	Monteverde Calatayud Beatriz Alejandrina	Invitada	Comparecencia a sesion de comisión investigadora
Oficio N° 0130 B	Paola Pierina Lazarte Castillo	Ministra de Transporte y Comunicaciones	Invitamos a usted a la sesion de la Comisión Investigadora Multipartidaria que investiga las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por empresas Chinas
Oficio N° 0131	Segura Esteban Sheily Arlequin	Invitada	Comparecencia a sesion de comisión investigadora
Oficio N° 0132	Guo Honbing	Rpresentante Legal de la Empresa China Railway N°10 Engineering Co. LTD Sucursal del Perú	Comparecencia a sesion de comisión investigadora
Oficio N° 0133	CHEN JUNKUN	Representante legal del Consorcio Cajamarca	Comparecencia a sesion de comisión investigadora
Oficio N° 0134	Aguilar Quispe Alexander Felipe	Representante legal del Grupo Constructor y Consultor Asociados S.A.C - GC Y C.A SAC.	Comparecencia a sesion de comisión investigadora
Oficio N° 0135	Javier Angeles Illman	Oficial Mayor del Congreso de la Republica	Comunicar personal que conforma la comisión
Oficio N°0136	Javier Angeles Illman	Oficial Mayor del Congreso de la Republica	Comunico datos sobre personal que asumira la Secretaria Tecnica de la comisión
Oficio N° 0138	Paola Pierina Lazarte Castillo	Ministra de Transporte y Comunicaciones	Solicito informe del estado de los contratos que se indica



“Comisión Investigadora multipartidaria que investiga las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por empresas Chinas”

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Oficio N° 0140	Paola Pierina Lazarte Castillo	Ministerio de Transporte y Comunicaciones	Invitamos a usted a la sesion de la Comisión Investigadora Multipartidaria que investiga las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por empresas Chinas
----------------------	-----------------------------------	--	---



“Comisión Investigadora multipartidaria que investiga las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por empresas Chinas”

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

ANEXO II OFICIOS RECIBIDOS

REG. ÚNICO	Nº de Oficio	NOMBRE O DESTINATARIO	ASUNTO
1087994	OFICIO Nº 00000346-2023-PRODUCE/SG	MINISTERIO DE LA PRODUCCION / MINISTERIO DE LA PRODUCCION	SOLICITA INFORMACIÓN SOBRE ADJUDICACIONES CON EMPRESAS CHINAS Y/O CONSORCIOS CHINO-PERUANO.
1087670	300-2023-GRC/GGR	ELENA QUISPE HUAMAN	REMITE MEMORANDUM E INFORME EN ATENCIÓN A LO SOLICITADO EN LA INVESTIGACIÓN DE LAS IRREGULARIDADES EN LAS LICITACIONES Y OBRAS POR LAS EMPRESAS CHINAS
1085265	176-2023-GGR-GR/GOB.REG. TACNA	GOBIERNO REGIONAL DE TACNA / GOBIERNO REGIONAL DE TACNA	REMITE INFORMACION REQUERIDA.
1085235	00232-2023-MINAM/DM	MINISTERIO DEL AMBIENTE / MINISTERIO DEL AMBIENTE	SOLICITA INFORMACIÓN REFERENTE A LAS ADJUDICACIONES Y CONTRATOS CELEBRADOS CON EMPRESAS CHINAS O CONSORCIOS CHINO-PERUANO, DESDE EL AÑO 2018 AL 2022.
1085219	00801-2023-MINEDU/SG	MINISTERIO DE EDUCACION / MINISTERIO DE EDUCACION	SOBRE IRREGULARIDADES EN LAS LICITACIONES, OBRAS REALIZADAS POR LAS EMPRESAS CHINAS-OF. 00801.



“Comisión Investigadora multipartidaria que investiga las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por empresas Chinas”

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

1083783	949-2023-MINDEF/SG	MINISTERIO DE DEFENSA / DAVID CHARLES NAPURÍ GUZMÁN MINISTERIO DE DEFENSA	SOLICITA INFORMACION REFERENTE A ADJUDICACIONES DE SER EL CASO EL HABER CONTRATADO CON EMPRESAS CHINAS O CONSORCIOS CHINO - PERUANOS DESDE EL AÑO 2018 AL 2022.
1079607	OF-N°-227-2023-MINCERUR/D M	MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO / MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	REMITE MEMORÁNDUM EN ATENCIÓN A LO SOLICITADO RESPECTO A LAS ADJUDICACIONES DE LAS EMPRESAS CHINAS O CONSORCIO CHINO-PERUANO DESDE EL 2018 AL 2022
1078153	000035-2023-SUNAT/100000	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT / SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT	REMITE INFORMACION SOLICITADA.
1077370	134	GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI / GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI	RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACION.
1077337	293-2023-EF/10.01	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS /	REMITE INFORMACION SOLICITADA - (OFICIO 293-2023-EF/10.019.



“Comisión Investigadora multipartidaria que investiga las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por empresas Chinas”

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

		MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	
1076545	036-2023-MTC/01	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES / MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	REMITE INFORMACIÓN
1074658	062-2023/MDL	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LANCONES / MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LANCONES	REMITE INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE ADJUDICACIONES CON EMPRESAS CHINAS Y/O CONSORCIOS PERUANO-CHINOS
1074100	000342-2023-CG-DC	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA / NELSON SHACK YALTA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	REMITE INFORME SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROCESOS ARBITRALES DE OBRAS Y SERVICIOS DE GOBIERNOS REGIONALES
1071569	000043-2023/PRE	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE / ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE	SOBRE CONTRATACIONES REALIZADAS POR LAS EMPRESAS CHINAS DE ACUERDO AL DETALLE QUE REMITE



“Comisión Investigadora multipartidaria que investiga las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por empresas Chinas”

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

1067481	000042-2023/PRE	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE / ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE	INFORME SOBRE LAS CONTRATACIONES REALIZADAS POR LA EMPRESA CHINA RAILWAY N 10 ENGINEERING GROUP CO LTD SUCURSAL DEL PERU
1059779	298-2022-2023-JEJO/CR	JERI ORE JOSE ENRIQUE	CORRER TRASLADO DE REQUERIMIENTO
1058282	014-2023-SUNARP/SA	SUPERINT. NAC. DE LOS REGISTROS PUBLICOS / SUPERINT. NAC. DE LOS REGISTROS PUBLICOS	RESPUESTA A REQUERIMIENTO DE INFORMACION.
1058369	103-2023/GOB-HVCA/PPR	GOBERNADOR REGIONAL DE HUANCVELICA / TEDY GIM PEREZ ESPINOZA	REMITO INFORMACION SOLICITADO
1058301	1966-2022/GOB-REG-HVCA/PPR	GOBERNADOR REGIONAL DE HUANCVELICA / TEDY GIM PEREZ ESPINOZA	REMITO INFORME SOLICITADA
1056292	358-2022-MTC.21	MTC-PROVIAS NACIONAL / FRANCISCO QUEVEDO MOGOLLON	SOBRE REQUERIMIENTO DE INFORME DE LAS LICITACIONES DONDE SE ADJUDICARON OBRAS A EMPRESAS CHINAS O CONSORCIO CHINO-



“Comisión Investigadora multipartidaria que investiga las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por empresas Chinas”

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

			PERUANO DESDE EL AÑO 2018 HASTA LA ACTUALIDAD
1056290	3227-2022-MTC/04		SE REMITEW INFORMACIÓN SOBRE LAS INTEREENCIONES PARALIZADAS
1056277	005072-2022-GRLL-GGR-GRCO		REMITE INFORMACIÓN SOLICITADA
1056275	001142-2022-GRC/GGR		ATENCIÓN A REQUERIMIENTO DE SOLIITUD DE INFORMACIÓN POR EL CONGRESISTA DE LA RPEÚBLICA
1056273	001142-2022-GRC/GGR		ATENCIÓN A REQUERIMIENTO DE SOPLUCITUD DE INFORMACIÓN POR EL CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA
1056268	D2888-2022-GR.CAJ-DRA/DA	GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA/GR C-GBDE / CECILIA TORRES MONDRAGON ARROYO	REMITE INFORMACIÓN REQUERIDA
1056076	022-2022-2023-DC-DGP-CR	DEPARTAMENT O DE COMISIONES	INFORMACIÓN SOBRE MODIFICACIÓN O CAMBIOS EN LOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA EN COMISIONES
1050548	320-2022-2023-DC-DGP-CR	DEPARTAMENT O DE COMISIONES	SE RESPONDE REQUERIMIENTO DE PERSONAL DEL SERVICIO PARLAMENTARIO POR LA COMISIÓN INVESTIGADORA SOBRE TODAS LAS LICITACIONES



“Comisión Investigadora multipartidaria que investiga las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por empresas Chinas”

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

			PÚBLICAS Y CONTRATOS DE OBRAS CONVOCADAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, PROVÍAS NACIONAL, PROVÍAS DESCENTRALIZADO, GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES Y SUS RELACIONES CON POSTORES Y CONTRATISTAS DE EMPRESAS CHINAS
1046983	N° 026-2022- GRA/GR-GG	GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO / GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	REMITE OFICIO N° 026-2023- GRA/GR-GG, AL CUAL ADJUNTO INFORMACIÓN SOLICITADA. REF.: A) OFICIO N° 0020-2022-2023- CIMILOREC/CR. B) OFICIO N° 033-2023- GRA/GG-GRI.
1041328	203- 2023/GRT-GR- GGR	GOBIERNO REGIONAL TUMBES / GOBIERNO REGIONAL TUMBES	REMITE OFICIO, MEMORANDUM E INFORME EN ATENCIÓN A LO SOLICITADO
1039647	N° 1705-2022- GRA/GR-GG	GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO / GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	REMITE INFORMACIÓN SOLICITADA
1035019	027-2022- ARCC/DEA/S RT		RESPUESTA A OFICIO N° 027-2022- ARCC/DEA/SRT,
1034954	00046-2022- ARCC/DEA/S DRC		RESPUESTA OFICIO N° 008- 2022-2023- CIMILOREC/CR DE FECHA 07.11.2022 SE COMUNICA QUE EN LA



“Comisión Investigadora multipartidaria que investiga las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por empresas Chinas”

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

			SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE CAJAMARCA NO SE CUENTA CON OBRAS ADJUDICADAS A EMPRESAS CHINAS O CONSORCIOS CHINO-PERUANOS DESDE EL AÑO 2018 HASTA LA ACTUALIDAD.
1034916	357/MTC/2021		RESPUESTA A OFICIO N° 0015-2022-2023-CIMILOREC/CR Y OFICIO N° 0013-2022-2023-CIMILOREC/CR , MEDIANTE INFORME N° 038-2022-MTC/21, DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE 2022, SE DA ATENCIÓN AL REQUERIMIENTO EN FORMA PARCIAL SOBRE LICITACIONES DONDE SE ADJUDICARON OBRAS A EMPRESAS CHINAS O CONSORCIO CHINO-PERUANO DESDE EL AÑO 2018 HASTA LA ACTUALIDAD. DEBIDAMENTE DETALLADO .
1033794	1194-2022-GGR/GOB.RE G.TACNA		EN RESPUESTA AL OFICIO N° 038-2022-2023-CIMILOREC/CR , SE REMITE INFORMACIÓN SOLICITADA.
1033766	1169-GRPGOB-SG		SE REMITE IIINFORME 7146-2022-GRP-GGR-DGA/DAP DE LA UNIDAD DE PROCESOS , SE ADJUNTA 05 FOLIOS.



“Comisión Investigadora multipartidaria que investiga las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por empresas Chinas”

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

1033620	2130-2022-GRP-480400		RESPUESTA A OFICIO CIMILOREC/CR, SE COMUNICA QUE SE HA REALIZADO UNA BUSQUEDA MINUCIOSA EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA ELECTRONICO DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO SEACE A PARTIR DEL AÑO 2018, HASTA LA ACTUALIDAD SOBRE LICITACIONES PÚBLICAS PARA EJECUCIÓN DE OBRAS LLEVADAS A CABO EL GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL Y ADJUDICADAS A EMPRESAS CHINAS O CONSORCIOS CHINO-PERUANO, SIN QUE A LA FECHA SE HALLA CONTRATADO CON LAS MENCIONADAS EMPRESAS..
1032871	667-2022-GOREMAD-GGR	MARLENI HERRERA SARA	REMITE INFORMACION SOLICITADA
1033031	466	RIVAS CHACARA JANET MILAGROS	LICENCIA SESIÓN EXTRAORDINARIA
1030839	-1385-2022-GRAMAZONA S/GR	GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS / GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS	REMITE INFORMACION COMPLEMENTARIA
1030413	3384-2022-MTC/04	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y	REMITE INFORME DE RESPUESTA CON RELACIÓN A LAS



“Comisión Investigadora multipartidaria que investiga las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por empresas Chinas”

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

		COMUNICACIONES / MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	EMPRESAS CHINAS QUE HAYAN OBTENIDO LICITACIONES Y/O ADJUDICACIONES, ENTRE OTROS.
1029774	1759	AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS / AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS	SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE LAS OBRAS ADJUDICADAS A EMPRESAS CHINAS O CONSORCIOS CHINO-PERUANO DESDE EL 2018 A LA ACTUALIDAD
1024158	3317-2022-MTC/04	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES / MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	REMITE INFORMACION SOLICITADA (EN ENLACE)
1023610	-1347-2022-GRAMAZONA S/GR	GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS / GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS	REMITE OFICIO E INFORME EN ATENCIÓN A LO SOLICITADO RESPECTO A LAS LICITACIONES QUE ADJUDICARON OBRAS A EMPRESAS CHINAS O CONSORCIO CHINO PERUANO DESDE 2018 A LA ACTUALIDAD
1023198	N° 819-2022-GR/GOB.REG. TACNA	GOBIERNO REGIONAL DE TACNA / GOBIERNO	REMITE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RESPECTO A LICITACIONES A A



“Comisión Investigadora multipartidaria que investiga las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por empresas Chinas”

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

		REGIONAL DE TACNA	EMPRESAS CHINAS DESDE EL AÑO 2018 A LA FECHA
1022909	1552-2022-GG	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL / SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL	REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN RELACIONADA A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307.
1017571	532-2022 GR CUSCO GGR	WOLFGANG HENRY TEVES MEZA	INVERSIONES ADJUDICADAS A EMPRESAS CHINAS
1015506	441-2022/GOB.RE G.TUMBES-GR-GGR	GOBIERNO REGIONAL TUMBES / GOBIERNO REGIONAL TUMBES	RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES POR LAS QUE SE ADJUDICARON OBRAS A LAS EMPRESAS CHINAS O EL CONSORCIO CHINO-PERUANO DESDE EL 2018



ANEXO III OFICIOS SIN RESPUESTA

N° de Oficio	NOMBRE O DESTINATARIO	CARGO	ASUNTO
Oficio N° 002	ROBERTO LÓPEZ LÓPEZ	DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS - ARCC	Requerimiento de información sobre las obras adjudicadas a empresas chinas o Consorcio Chino-Peruano desde el año 2018 a la actualidad
Oficio N° 003	Christopher Parodi Rumiche	Subdirector Regional de Piura de la Autoridad para la Reconstrucción con cambios -ARCC	Requerimiento de información
Oficio N° 005	Fredy Erick Bohorquez Cosi	Subdirector Regional de Lima de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - ARCC	Requerimiento de Información
Oficio N° 006	Henry Fernando Sausa Montenegro	Subdirector Regional de Lambayeque de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - ARCC	Requerimiento de Información
Oficio N° 007	Herbert Christian Alcantara Heredia	Subdirector Regional de la libertad de la Autoridad para Reconstrucción con Cambios ARCC.	Requerimiento de información.
Oficio N° 009	Abel Saravia Angles	Subdirector Regional de Arequipa de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - ARCC	Requerimiento de información
Oficio N° 0010	Walter Hugo Sandoval Baltazar	Subdirector Regional de Ancash de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios- ARCC	Requerimiento de información



“Comisión Investigadora multipartidaria que investiga las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por empresas Chinas”

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Oficio N°0015	Francisco Quevedo Mogollon	Director Ejecutivo de Provias Descentralizado	Solicito Informe Tecnico
Oficio N°0016	Francisco Cevalco Piedra	Oficial Mayor del Congreso de la Republica	Habilitacion de anexos
Oficio N° 0017	Henry Augusto Borja Cruzado	Gobrenador Regional de Ancash	Solicito Informe Tecnico
Oficio N°0018	Baltazar Iantarón Núñez	Gobernador Regional Apurimac	Solicito Informe Tecnico
Oficio N° 0019	Kimmerlee Keily Gutierrez Canahuire	Gobernador Regional Arequipa	Solicito Informe Tecnico
Oficio N° 0024	Erasmus Alejandro Fernandez Sixto	Gobernador Regional Huánuco.	Solicito Informe Tecnico
Oficio N° 0025	Javier Gallegos Barrientos	Gobernador Regional Ica	Solicito Informe Tecnico
Oficio N° 0026	Clever Mario Mercado Mendez	Gobernador Regional Junín	Solicito Informe Tecnico
Oficio N° 0030	Ricardo Chavarría Oria	Gobernador Regional Lima	Solicito Informe Tecnico
Oficio N° 0031	Elisbán Ochoa Sosa	Gobernador Regional Loreto	Solicito Informe Tecnico
Oficio N° 0061	Paola Lazarte Castillo	Ministra de Transporte y Comunicaciones	Solicito Informe Tecnico del estado situacional de los servicios prestados al estado por las empresas que se indican.
Oficio N° 0064	Liz Patricia Benavides Vargas	Fiscal de la Nación	Solicito informe detallado y documentado sobre las denuncias que existen contra las



“Comisión Investigadora multipartidaria que investiga las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por empresas Chinas”

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

			personas naturales y juridicas vinculadas a los servicios y obras contratados por el Estado Peruano.
Oficio N° 072	Edinson Reategui Vasquez	Alcalde Distrital de Buenos aires - SAN MARTIN	Solicito informe del estado de los contratos que se indica
Oficio N° 073	Jose Hector Garcia Chenta	Alcalde Distrital de Choros- CAJAMARCA	Solicito informe del estado de los contratos que se indica
Oficio N° 074	Jesus Diaz Casahuaman	Alcalde Distrital de la Encañada	Solicito informe del estado de los contratos que se indica
Oficio N° 076	Sergio Vilchez Neira	Alcalde Distrital de Laredo	Solicito informe del estado de los contratos que se indica
Oficio N° 077	Elmer Augusto Leon Pairazaman	Alcalde Provincial de Pacasmayo	Solicito informe del estado de los contratos que se indica
Oficio N° 080	Rohel Sanchez Sanchez	Gobernador Regional de Arequipa	Solicito informe del estado de los contratos que se indica
Oficio N° 081	Wilfredo Oscorima Nuñez	Gobernador Regional de Ayacucho	Solicito informe del estado de los contratos que se indica
Oficio N° 082	Guevara Rodriguez Roger	Gobernador Regional de Cajamarca	Solicito informe del estado de los contratos que se indica



Oficio N° 083	Ciro Ronald Castillo Rojo Salas	Gobierno Regional de Callao	solicito informe de los contratos que se indica
Oficio N° 086	Zosimo Cardenas Muje	Gobernador Regional de Junin	Solicito informe del estado de los contratos que se indica
Oficio N° 088	Jorge Luis Perez Flores	Gobernador Regional de Lambayeque	Solicito informe del estado de los contratos que se indica
Oficio N°089	Rafael Lopez Aliaga	Alcalde de Lima	Solicito infomacion del estado de los contratos que se indica
Oficio N° 090	Juan Luis Chombo Heredia	Gobernador Regional de Pasco	Solcito información del estado de los contratos que se indica
Oficio N° 091	Luis Ernesto Neyra Leon	Gobernador Regional de Piura	Solicito información sobre partidas registrales de las empresas que se indican.
Oficio N° 095	Gilia Ninfa Gutierrez Ayala	Gobernador Regional de Moquegua	Solicito informacion que se indica
Oficio N° 097	Percy Godoy Medina	Gobernador Regional de Apurimac	Solicito informacion que se indica
Oficio N° 099	Jorge Carlos Hurtado Herrera	Gobernador Regional de ICA	Solicito informacion que se indica
Oficio N°0 100	Jorge Rene Chavez Silvano	Gobernador Regional de Loreto	Solicito informacion que se indica
Oficio N° 0 101	Luis Otsuka Salazar	Gobernador Regional Madre de Dios	Solicito informacion que se indica
Oficio N° 102	Rosa Gloria Vasquez Cuadrado	Gobernador Regional de Lima	Solicito información que se indica



“Comisión Investigadora multipartidaria que investiga las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por empresas Chinas”

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Oficio N° 103	Walter Grundel Jimenez	Gobernador Regional San Martin	Solicito informacion que se indica
Oficio N° 104	Luis Ramon Torres Robledo	Gobernador Regional de Tacna	Solicito informacion que se indica
Oficio N° 105	Segismundo Cruce Ordinala	Gobierno Regional de Tumbes	Solicito informacion que se indica
Oficio N° 0107	Armando Benjamin Garcia Chunga	Superintendente Nacional de Migraciones	Solicito informe el record migratorio de los ciudadanos Chinos que se indica
Oficio N° 108	Hania Pérez de Cuéllar Lubienska	Ministra de vivienda, Contruccion y Saneamiento	Solicito informe del estado de los contratos que se indica
Oficio N° 113	José Andres Tello Alfaro	Ministro de Justicia y Derechos Humanos	Solicito informe de adjudicaciones
Oficio N° 114	Nancy Rosalina Tolentino Gamarra	Ministra de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables	Solicito informe de adjudicaciones
Oficio N° 116	Nelly Paredes del Castillo	Ministra de Desarrollo Agrario y Riego	Solicito informe del estado de los contratos que se indica
Oficio N° 118	Oscar Electo Vera Gargurebich	Ministro de Energia y Minas	Solicito informa del estado de loa contratos que se indica
Oficio N° 119	Raúl Pérez Reyes Espejo	Ministro de la Produccion	Solicito informe del estado de los contratos que se indica
Oficio N° 120	Rosa Bertha Gutierrez Palomino	Ministra de Salud	Solicito informe del estado de los contratos que se indica
Oficio N° 121	Alfonso Adrianzén Ojeda	Ministro de Trabajo y Promoción del empleo	Solicito informe del estado de los contratos que se indica



“Comisión Investigadora multipartidaria que investiga las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por empresas Chinas”

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Oficio N° 122	Vicente Romero Fernandez	Ministro del Interior	Solicito informe del estado de los contratos que se indica
Oficio N° 128	Nelly Paredes del Castillo	Ministra de Desarrollo Agrario y RieSgo	Solicita Información sobre "Procesos de Sorteo" realizado en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego; para la contratación de empresas para la <i>Formulación del Plan Integral para el control de inundaciones y movimientos de masa de las cuencas de los rios</i>": <i>OLMOS, VIRÚ Y ZAÑA</i>
Oficio N° 0129	FANG YIMIN	Representante Común del Consorcio Vial Pucahuasi	Comparecencia a sesion de comisión investigadora
Oficio N° 0130 A	Monteverde Calatayud Beatriz Alejandrina	Invitada	Comparecencia a sesion de comisión investigadora
Oficio N° 0132	Guo Honbing	Rpresentante Legal de la Empresa China Railway N°10 Engineering Co. LTD Sucursal del Perú	Comparecencia a sesion de comisión investigadora
Oficio N° 0133	CHEN JUNKUN	Representante legal del Consorcio Cajamarca	Comparecencia a sesion de comisión investigadora
Oficio N° 0134	Aguilar Quispe Alexander Felipe	Representante legal del Grupo Constructor y Consultor Asociados S.A.C - GC Y C.A SAC.	Comparecencia a sesion de comisión investigadora



“Comisión Investigadora multipartidaria que investiga las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por empresas Chinas”

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Oficio N° 0135	Javier Angeles Illman	Oficial Mayor del Congreso de la Republica	Comunicar personal que conforma la comisión
Oficio N°0136	Javier Angeles Illman	Oficial Mayor del Congreso de la Republica	Comunico datos sobre personal que asumira la Secretaria Tecnica de la comisión

ANEXO IV CONTRATOS DEL MTC CON LAS EMPRESAS CHINAS

EMPRESAS CHINAS QUE HAN CONTRATADO CON EL ESTADO DESDE EL 2018 AL 2022

N	Fecha Contrato	Entidad Contratante	CUI/SNIP	CONTRATO	Descripcion del Proyecto	Tipo de Contratacion	Monto Adj. S/.	Contratista
1	4/02/2019	MTC	SNIP 2426974	015-2019 - MTC/10	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL - PAQUETE 3R ANCASH. TRAMO: EMPALME PE -16 (DV. OCROS) TICLLOS CORPANQUI CAJAMARQUILLA TACRA OCROS RINCONADA HUANCHAY - HUAYLILLAS GRANDE (EMPALME PE-16A) (L= 138.15 KM)	OBRA	69,331,713.01	CONSORCIO VIAL PERU - CHINA RAILWAY N° 10 ENGINEERING GROUP LIMITED - CHINA RAILWAY ERYUAN ENGINEERING GROUP CO., LTD
2	29/04/2019	MTC	SNIP:2432678 CUI:2432678 CUI:2432687	043-2019 - MTC/10	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA1: REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 2 ICA Y PIURA "PUENTE CHAMORRO Y ACCESOS"	OBRA	30,422,401.93	CONSORCIO BELLA UNION -CHINA RAILWAY N: 10 ENGINEERING GROUP LIMITED - EURO CONSULT SUCURSAL PERU
3	29/04/2019	MTC	SNIP:2432678 CUI:2432678 CUI:2432687	044-2019 - MTC/10	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA 2: REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 2 "PUENTE SALITRAL Y ACCESOS" DEPARTAMENTOS DE ICA Y PIURA	OBRA	39,324,871.33	CONSORCIO BELLA UNION -CHINA RAILWAY N: 10 ENGINEERING GROUP LIMITED - EURO CONSULT SUCURSAL PERU
4	-	MTC	SNIP 2436556 2436559 2436558	FALTA CONTRATO	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 5 , HUANCVELICA , AYACUCHO, AREQUIPA 2.	OBRA	60,054,512.12	CONSORCIO PUENTES 5 -CHINA RAILWAY N: 10 ENGINEERING GROUP LIMITED -XXXXXXXXXXXXXXXXXX
5	05/042019	MTC	PROCESO PEC-PROC-22-2018- MTC-2	037-2019-MTC/10	SERVICIO DE CONSERVACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL: PAQUETE 4 TRAMO 1: EMP. PE - 3N (HUACASCHUQUE) LACABAMBA- DV. CONCHUCOS- PAMPAS- CONSUZO- L.D LA LIBERTAD (LI-115 A PAMPA EL CÓNDOR) TRAMO 0+000 A 59+000 (L= 59.00 KM) TRAMO 2: EMP. PE - 3N (DV. ESTACIÓN QUIROZ) GALGADA- EL COLOQUE- ALLAYMUCHA- EMP. PE-3N (PALLASCA) (L= 52.60 KM).	SERVICIO	26,699,186.95	CONSORCIO ACM -CHINA RAILWAY N: 10 ENGINEERING GROUP LIMITED -XXXXXXXXXXXXXXXXXX

6	23/07/2019	MTC	CUI:2436573	059-2019 - MTC/10	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO Y DE LA EJECUCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH - OBRA 1	OBRA	48,034,575.36	CONSORCIO PUENTE ANCASH -CHINA RAILWAY N: 10 ENGINEERING GROUP LIMITED -EPCM CONSULTING S.A,C -PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL PERU. - TOPOCAD INGENIEROS SRL.
7	23/07/2019	MTC	CUI:2436573	060-2019 - MTC/10	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO Y DE LA EJECUCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH - OBRA 2	OBRA	22,676,808.78	CONSORCIO PUENTE ANCASH -CHINA RAILWAY N: 10 ENGINEERING GROUP LIMITED -EPCM CONSULTING S.A,C -PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL PERU. - TOPOCAD INGENIEROS SRL.
8	23/07/2019	MTC	CUI:2436573	061-2019 - MTC/10	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO Y DE LA EJECUCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH - OBRA 3	OBRA	21,843,670.08	CONSORCIO PUENTE ANCASH -CHINA RAILWAY N: 10 ENGINEERING GROUP LIMITED -EPCM CONSULTING S.A,C -PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL PERU. - TOPOCAD INGENIEROS SRL.
9	21/11/2019	MTC	CUI:2440694	067-2019 - MTC/10	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA (OBRA2: PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS Y PUENTE VIRU Y ACCESOS)	OBRA	39,993,575.93	CONSORCIO CREC PUENTE 8 -CHINA RAILWAY N: 10 ENGINEERING GROUP LIMITED -CHINA RAILWAY ERYUAN ENGINEERING GROUP CO. LTD

10	30/12/2019	MTC	Snip:2437755	080-2019 - MTC/10	PAQUETE 7: ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 7, LAMBAYEQUE, CAJAMARCA (OBRA 1: PUENTE SORRONTO Y ACCESOS, PUENTE LA OTRA BANDA Y ACCESOS) (OBRA 2: PUENTE PISHGA Y ACCESOS, PUENTE LA ZARAN	OBRA	22,792,649.38	CONSORCIO CREC PUENTE 7 -CHINA RAILWAY N: 10 ENGINEERING GROUP LIMITED -CHINA RAILWAY ERYUAN ENGINEERING GROUP CO. LTD
11	30/12/2019	MTC	Snip:2437755	081-2019 - MTC/10	PAQUETE 7: ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 7, LAMBAYEQUE, CAJAMARCA (OBRA 1: PUENTE SORRONTO Y ACCESOS, PUENTE LA OTRA BANDA Y ACCESOS) (OBRA 2: PUENTE PISHGA Y ACCESOS, PUENTE LA ZARAN	OBRA	14,799,978.74	CONSORCIO CREC PUENTE 7 -CHINA RAILWAY N: 10 ENGINEERING GROUP LIMITED -CHINA RAILWAY ERYUAN ENGINEERING GROUP CO. LTD
12	10/12/2019	MTC	Snip:2436556	075-2019- MTC/10	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 5 HUANCVELICA, AYACUCHO, AREQUIPA 2 - OBRA 1	OBRA	31,226,297.62	CONSORCIO CREC PUENTE 5: -CHINA RAILWAY N: 10 ENGINEERING GROUP LIMITED -CHINA RAILWAY ERYUAN ENGINEERING GROUP CO .LTD
13	10/12/2019	MTC	Snip:2436556	076-2019- MTC/10	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 5 HUANCVELICA, AYACUCHO, AREQUIPA 2 - OBRA 2	OBRA	28,828,214.50	CONSORCIO CREC PUENTE 5: -CHINA RAILWAY N: 10 ENGINEERING GROUP LIMITED -CHINA RAILWAY ERYUAN ENGINEERING GROUP CO .LTD
14	29/11/2019	MTC	Snip:2443278	068-2019 - MTC/10	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA (OBRA2: PUENTE CENTRO Y ACCESSOS, PUENTE TANA Y ACCESOS, PUENTE QUISHPE Y ACCESOS Y PUENTE SAN LUCAS Y ACCESOS)	OBRA	24,010,931.96	CONSORCIO PUENTE SAN LUCAS -CHINA RAILWAY N: 10 ENGINEERING GROUP LIMITED -CHINA RAILWAY ERYUAN ENGINEERING GROUP CO .LTD

15	18/11/2019	MTC	SNIP 2440694	065-2019-MTC/10	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 - OBRA1	OBRA	15,856,550.37	CONSORCIO EJECUTOR DEL SUR -CHINA CONSTRUCTION THIRD ENGINEERING BUREA CO. LTD, CCCC DEL PERU S.A.C. -CHINA RAILWAY FIRST SURVEY & DESING INSTITUTE GROUP CO. LTD SUCURSAL DEL PERU
16	18/11/2019	MTC	SNIP 2440694	066-2019-MTC/10	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 - OBRA2	OBRA	25,408,996.55	CONSORCIO EJECUTOR DEL SUR -CHINA CONSTRUCTION THIRD ENGINEERING BUREA CO. LTD, CCCC DEL PERU S.A.C. -CHINA RAILWAY FIRST SURVEY & DESING INSTITUTE GROUP CO. LTD SUCURSAL DEL PERU
17	29/11/2019	MTC	SNIP 2441629	069-2019-MTC/10	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 10 ITEM 1	OBRA	18,253,439.97	CONSORCIO PUENTES DEL NORTE -CHINA CONSTRUCTION THIRD ENGINEERING BUREA CO. LTD, -CCCC DEL PERU S.A.C. -CHINA RAILWAY FIRST SURVEY & DESING INSTITUTE GROUP CO. LTD SUCURSAL DEL PERU
18	29/11/2019	MTC	SNIP 2441629	070-2019-MTC/10	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 10 ITEM 2	OBRA	18,314,061.93	CONSORCIO PUENTES DEL NORTE -CHINA CONSTRUCTION THIRD ENGINEERING BUREA CO. LTD, -CCCC DEL PERU S.A.C. -CHINA RAILWAY FIRST SURVEY & DESING INSTITUTE GROUP CO. LTD SUCURSAL DEL PERU
19	29/11/2019	MTC	SNIP 2441629	071-2019 - MTC/10	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 10 ITEM 3	OBRA	24,820,793.68	CONSORCIO PUENTES DEL NORTE -CHINA CONSTRUCTION THIRD ENGINEERING BUREA CO. LTD, CCCC DEL PERU S.A.C. -CHINA RAILWAY FIRST SURVEY & DESING INSTITUTE GROUP CO. LTD SUCURSAL DEL PERU

20	20/12/2019	MTC	SNIP 2436642 2436638 2436641 2436646 2436637 2436642 2436638 2436641 2436646 2436637	077-2019- MTC/10	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 4 LA LIBERTAD OBRA N 01	OBRA	16,402,932.57	CONSORCIO NUEVA LIBERTAD -CHINA CONSTRUCTION THIRD ENGINEERING BUREA CO. LTD, -CCCC DEL PERU S.A.C. -CHINA RAILWAY FIRST SURVEY & DESING INSTITUTE GROUP CO. LTD SUCURSAL DEL PERU
21	20/12/2019	MTC	SNIP 2436642 2436638 2436641 2436646 2436637 2436642 2436638 2436641 2436646 2436637	078-2019-MTC/10	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 4 LA LIBERTAD - OBRA 2	OBRA	15,899,496.95	CONSORCIO NUEVA LIBERTAD -CHINA CONSTRUCTION THIRD ENGINEERING BUREA CO. LTD, - CCCC DEL PERU S.A.C. -CHINA RAILWAY FIRST SURVEY & DESING INSTITUTE GROUP CO. LTD SUCURSAL DEL PERU
22	20/12/2019	MTC	SNIP 2436642 2436638 2436641 2436646 2436637 2436642 2436638 2436641 2436646 2436637	079-2019-MTC/10	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 4 LA LIBERTAD - OBRA 3	OBRA	25,254,819.37	CONSORCIO NUEVA LIBERTAD -CHINA CONSTRUCTION THIRD ENGINEERING BUREA CO. LTD, -CCCC DEL PERU S.A.C. -CHINA RAILWAY FIRST SURVEY & DESING INSTITUTE GROUP CO. LTD SUCURSAL DEL PERU
23	21/12/2018	MTC	2001621	176-2018- MTC/10	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO COMPLEMENTARIO AL ESTUDIO PRE INVERSIÓN A NIVEL DEL PERFIL DEL PROYECTO CORREDOR FERROVIARIO BIOCEANICO CENTRAL: ACCESO FERROVIARIO Y UBICACIÓN, DIMENSIONAMIENTO Y PREDISEÑO DEL PUERTO	SERVICIO	9,909,283.37	CONSORCIO RUPA RUPA - DOHWA ENGINEERING CO., LTD. SUCURSAL DEL PERU - PRW INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. S.A.C. FIGUEROA TORRES EDGAR ORLANDO S.A.C

24	21/12/2022	MTC	SNIP S/N	139-2022-MTC/10.02	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (PI) ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO AEROPORTUARIO EN LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO; MEDIANTE LA REUBICACIÓN DEL AEROPUERTO DE TINGO MARÍA	SERVICIO	4,299,999.99	CONSORCIO RUPA RUPA - DOHWA ENGINEERING CO., LTD. SUCURSAL DEL PERU - META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DEL PERÚ
25	26/06/2019	MTC	2042345	058-2019-MTC/10.02	CONTRATACION DEL SALDO PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO REHABILITACION DEL TERMINAL PORTUARIO DE PUCALLPA	CONSULTORIA DE OBRA	4,956,008.60	CONSORCIO - PUCALLPA COPE - PRW INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. - DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU
26	30/10/2018	MTC	2001621	135-2018-MTC/10	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL REFORZADO DE LA CREACION DEL PROYECTO: "FERROCARRIL PUERTO SAN JUAN DE MARCONA - ANDAHUAYLAS"	SERVICIO	30,990,000.53	CONSORCIO FERROCARRIL DEL SUR - DOHWA ENGINEERING CO., LTD. SUCURSAL DEL PERU - SERGIO EDUARDO AVILES
27	3/04/2019	MTC	SNIP S/N	035-2019-MTC/10	PAQUETE 7 SERVICIO DE CONSERVACION PARA LA RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 7 EMP.PE 1N HUAURA SAYAN CHURIN OYON Y EMP.PE 1N RIO SECO SAYAN	SERVICIO	18,096,182.67	CONSORCIO COANSA DEL PERU - WEIHAI CONSTRUCTION GROUP COMPANY LIMITED - COANSA DEL PERU INGENIEROS SAC

ANEXO V CONTRATOS PROVIAS DESENTRALIZADO CON LAS EMPRESAS CHINAS

EMPRESAS CHINAS QUE HAN CONTRATADO CON EL ESTADO DESDE EL 2018 AL 2022

N	Fecha Contrato	Entidad Contratante	CUI/SNIP	CONTRATO	Descripcion del Proyecto	Tipo de Contratacion	Monto Adj. S/.	Contratista
1	30/11/2020	PROVIAS DESCENTRALIZADO	CUI:2458796	254-2020-MTC/21	Servicio de Gestión, Mejoramiento y Conservación Vial Por Niveles de Servicio de la Carretera Emp Pe 32a Dv Querobamba Dv San Salvador de Quije Paico Santiago de Paucaray Atihuara Autama Soras San Pedro de Larcaj Emp Pe 30b San Pablo de Chicha Emp Pe 30b San Juan de Ayapampa Torohuichccaña Pucahuasi Sañayca Emp Pe 30a Dv Chacapunte Por Niveles de Servicio Distrito de Querobamba Provincia de Sucre Departamento de Ayacucho Y Apurímac	SERVICIO	86,579,184.95	CONSORCIO PUCAHUSI -CHINA RAILWAY N: 10 ENGINEERING GROUP LIMITED -GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR ASOCIADOS S.A.C. – GC Y C.A. SAC.
2	28/09/2021	PROVIAS DESCENTRALIZADO	CUI 2210922	048-2021-MTC/21	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SARAMIRIZA - BORJA, DISTRITO DE MANSERICHE, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN, DEPARTAMENTO DE LORETO	OBRA	76,035,686.51	CONSORCIO LORETO -CHINA RAILWAY N: 10 ENGINEERING GROUP LIMITED -GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR ASOCIADOS S.A.C. – GC Y C.A. SAC.
3	29/01/2020	PROVIAS DESCENTRALIZADO	CUI:2447282	033-2020 - MTC/21	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR: EMP. PE-1S D (DV. ITE) ITE EMP. PE-1S (PTE. CAMIARA) LOCUMBA, SAGOLLO, OCONCHAY, MIRAVE, ILABAYA, CHULULUNI, DV. ALTO CAMILACA, COTAÑA, VILALACA, YARABAMBA, CALACALA, CHARIPU	SERVICIO	152,793,798.20	CHINA RAILWAY N: 10 ENGINEERING GROUP LIMITED
4	9/12/2021	PROVIAS DESCENTRALIZADO		114-2021-MTC/20.2	SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: DV. LAS VEGAS - TARMA - LA MERCED - SATIPO - MAZAMARI - PTO. OCOPA / JAUJA LOMO LARGO / PTE. STUART - JAUJA - HUANCAYO	SERVICIO	51,960,769.52	CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERU
5	12/11/2020	PROVIAS DESCENTRALIZADO	Snip:2464852	235-2020 - MTC/21	SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL N° 7 - TRAMO I: EMP PE-1S (DV. LOS AQUIJES) - LOS AQUIJES - DV. COCHARCAS - HUAMBO; POR NIVELES DE SERVICIO, DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROV Y DEP DE ICA	SERVICIO	205,491,418.01	CONSORCIO VIAL SIETE UNO -CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERU -GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR ASOCIADOS S.A.C. - G.C. Y C.A. S.A.C.

6	24/09/2020	PROVIAS DESCENTRALIZADO	Snip:2468445	175-2020 - MTC/21	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-3SD (DV SALCABAMBA)-DV SAN JUAN DE PALTARUMI-SALCABAMBA-NVA ESPERANZA-SURCUBAMBA-TINTAY-PTO SAN ANTONIO; EMP HV-101-DV SAN MARCOS DE ROCCHAC-HUARI; EMP PE-3SD (DV JABONILLO)-COLCABAMBA-DV CALLQUI-EMP PE-3SD (MILPO); EMP HV-102(DV JABONILLO)-LLOCCE HUANTACCERO-EMP HV-102 (CHAUQUIMARCA); EMP PE-3SD-EMP HV-102(COLCABAMBA)-CAMPO ARMINO-PICHIU, POR NIVELES DE SERVICIO; DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	SERVICIO	140,494,131.61	CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERU
7	1/12/2020	PROVIAS DESCENTRALIZADO	Snip:2466445	255-2020 - MTC/21	Servicio de Gestion, Mejoramiento y Conservacion Vial Por Niveles de Servicio del Corredor Vial Nro. 9: NINACACA - DV. HUANCA - CARHUAC - HUACHON - QUIPARACRA - PUAGMARAY - MALLAN, LA SUIZA - DV. TINGO - CHONTABAMBA - LA FLORIDA - OXAPAMPA, EMP. PE-5NA ABRA - SANTA CRUZ - VILLA RICA, CARHUAMAYO	SERVICIO	127,011,954.03	CONSORCIO CORREDOR NUEVE -CHINA RAILWAY N: 10 ENGINEERING GROUP LIMITED - GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR ASOCIADOS S.A.C. - G.C. Y C.A. S.A.C.
8	1/12/2020	PROVIAS DESCENTRALIZADO	Snip:2464852	256-2020 - MTC/21	Servicio de Gestión, Mejoramiento y Conservación Vial Por Niveles de Servicio de La Carretera TRAMO II CARRETERA EMP HV 118 HUAMBO EMP PE 1S C CHAULISMA SAUCE IC-106 EMP PE 28D DV SINTO EMP PE 28A DV. HUAYACUNDO ARMA UBICADO EN LA PROVINCIA DE HUAYTARA Y CASTROVIRREYNA EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	SERVICIO	182,920,313.28	CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERU
9	23/12/2020	PROVIAS DESCENTRALIZADO	SNIP 2459159	271-2020-TMC/21	SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL N° 11: EMP. PE-3NC (DV. CHIGUIRIP) - CHIGUIRIP - CONCHAN - DV. LA PALMA - EMP. PE-3N (DV. CHOTA); EMP. PE-3N (CUTERVO) - DV. CONDAY - LIBERTAD DE NARANJIT	SERVICIO	175,073,286.10	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU
10	1/12/2020	PROVIAS DESCENTRALIZADO	SNIP 250986	258-2020-TMC/21	Mejoramiento de la carretera Shupluy - Primorpampa - Bellavista - Anta - San Isidro - Poncos - Kochayoc - Chachhuain - Pampamarca, departamento de Ancash	OBRA	53,840,242.21	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU

11	3/01/2020	PROVIAS DESCENTRALIZADO	-	26-2020-MTC/21	Servicio de Gestion, Mejoramiento y Conservaci3n Vial Por Niveles de Servicio de La Carretera Emp. PE 1N (Bocapan) Emp. TU 105 (Tamarindo) Emp. PE 1N2 (Pte. Mayor Novoa) Higuer3n Rica Playa Emp. TU 107 (Tamarindo) Ca3averal Pampas de Hospital Francos Emp. PE1N (Tumbes) Cabuyal El Naranjo Emp. PE 1N (Zarumilla) Matapalo El Tutumo Cafeter3a Cerro Blanco Emp. PE 1N (Dv. Puerto Pizarro) Puerto Pizarro, por niveles de servicio, distrito de Zorritos provincia de Contralmirante Villar	SERVICIO	108,367,116.11	CONSORCIO CCECC Per3 -CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU -ROAD SOLUTIONS E.I.R.L
12	7/01/2020	PROVIAS DESCENTRALIZADO	-	07-2020-MTC/21	Servicio de Gest3n, Mejoramiento y Conservaci3n Vial por Niveles de Servicio de la Carretera Emp. PE 28B (Pisac) Dv. Ruinas Cuyo Grande Chahuaytiri Colquepata...por Niveles de Servicio -Pisac -Calca -Cusco y Madre de Dios	SERVICIO	205,858,234.16	CONSORCIO CCECC Per3 -CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU -ROAD SOLUTIONS E.I.R.L
13	27/11/2020	PROVIAS DESCENTRALIZADO	SNIP 2471070	253-2020-MTC/21	Servicio de Gestion, Mejoramiento y Conservacion Vial Por Niveles de Servicio del Corredor Vial Nro. 6 - T B EMP. PE-26B REPARTICION HUAPA - CARHUAPATA, CARHUAPATA - PAMPAHUASI, PAMPAHUASI - EMP. PE-28A L1CAPA, EMP. PE-28A DV. PARAS - CHICCHIPATA, CHICCHIPATA - ROSASPATA, ROSASPATA - EMP. PE-28A DV. ARIZONA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE ANGARAES, HUAYTARA, CANGALLO Y HUAMANGA EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUANCVELICA Y AYACUCHO.	SERVICIO	171,041,154.08	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU
14	25/09/2020	PROVIAS DESCENTRALIZADO	SNIP 2465317	176-2020-MTC/21	Mejoramiento y Recuperacion del Camino Vecinal MO-590: Emp. PE-36A. (Samegua) - Emp. MO-602, distrito de Samegua, provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua	OBRA	63,556,105.85	CONSORCIO VIAL SAMEGUA -CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU - CORPORACION IMAGINACION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
15	21/05/2021	PROVIAS DESCENTRALIZADO	SNIP S/N	18-2021-MTC/21	Ficha T3cnica Est3andar y Expediente T3cnico de obra del Proyecto Creaci3n del Puente Alto Chira y accesos distrito de Querocotilloprovincia de Sullana Piura	CONSULTORIA DE OBRA	2,197,928.16	CONSORCIO VIAL QUERECOTILLO - DOHWA ENGINEERING CO., LTD. SUCURSAL DEL PERU - AZIZE INGENIEROS S.A.C.

16	10/02/2021	PROVIAS DESCENTRALIZADO	2471070	005-2021-MTC/21	Supervision del Servicio de Gestion, Mejoramiento y Conservacion Vial Por Niveles de Servicio del Corredor Vial Nro. 6 - T B EMP. PE-26B REPARTICIÓN HUAPA - CARHUAPATA, CARHUAPATA - PAMPAHUASI, PAMPAHUASI - EMP. PE-28A L1CAPA, EMP. PE-28A DV. PARAS - CHICCHIPATA, CHICCHIPATA - ROSASPATA, ROSASPATA - EMP. PE- 28A DV. ARIZONA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE ANGARAES, HUAYTARA , CANGALLO Y HUAMANGA EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUANCVELICA Y AYACUCHO.	SERVICIO	13,746,394.93	CONSORCIO SUPERVISOR AYACUCHO - DOHWA ENGINEERING CO., LTD. SUCURSAL DEL PERU - VERA & MORENO CONSULTORES DE INGENIERIA.
17	14/10/2021	PROVIAS DESCENTRALIZADO	2239036	56-2021-MTC/21	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE TARATA SOBRE EL RIO HUALLAGA, EN LA PROVINCIA DE MARISCAL CÁCERES, REGIÓN SAN MARTÍN	CONSULTORIA DE OBRA	14,451,411.41	CONSORCIO RUPA RUPA - DOHWA ENGINEERING CO., LTD. SUCURSAL DEL PERU - CARLOS FERNANDEZ CASADO
18	10/07/2019	PROVIAS DESCENTRALIZADO	2001621	99-2019-MTC/21	Servicio de Consultoría para Estudio de Preinversion a nivel de Perfil por niveles de servicio de los proyectos PAQUETE 10: Corredor Vial Alimentador N° 35: Arequipa, Corredor Vial Alimentador N° 36: Cusco- Arequipa, Corredor Vial 38: Cusco - Puno.	SERVICIO	8,396,194.93	CONSORCIO RUPA RUPA - DOHWA ENGINEERING CO., LTD. SUCURSAL DEL PERU - LUSDA PERU S.A.C. -CARE INGENIEROS S.A.
18	15/11/2019	PROVIAS DESCENTRALIZADO	2001621	181-2019-MTC/21	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL POR NIVELES DE SERVICIO DE LOS PROYECTOS PAQUETE: 06: CORREDOR VIAL 27: LIMA, CORREDOR VIAL 29: JUNÍN-HUANCVELICA.	SERVICIO	7,335,262.26	CONSORCIO CORREDOR VIAL P6 - DOHWA ENGINEERING CO., LTD. SUCURSAL DEL PERU - ALPHA CONSULT S.A.
20	3/11/2020	PROVIAS DESCENTRALIZADO	2327139	222-2020-MTC/21	Elaboración de Expediente Tecnico de Obra del Proyecto de Mejoramiento y Construcción de la carretera Jenaro Herrera - Colonia Angamos (Frontera con Brasil), distrito de Jenaro Herrera - Provincia de Requena - Region Loreto, Longitud=97.40 Km.	CONSULTORIA DE OBRA	6,983,392.10	CONSORCIO ILO COPE - DOHWA ENGINEERING CO., LTD. SUCURSAL DEL PERU - PROY - INTER S.R.L.
21	12/06/2019	PROVIAS DESCENTRALIZADO	2001621	77-2019-MTC/21	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL POR NIVELES DE SERVICIO DE LOS PROYECTOS PAQUETE 01: CORREDOR VIAL 13: LAMBAYEQUE ¿ CAJAMARCA; CORREDOR VIAL 14: LA LIBERTAD 1	SERVICIO	8,755,413.25	CONSORCIO RUPA RUPA - DOHWA ENGINEERING CO., LTD. SUCURSAL DEL PERU - WILLIAN SALVATIERRA VEGA -CARE INGENIEROS S.A.

22	13/12/2019	PROVIAS DESCENTRALIZADO	2391609	222-2019-MTC/21	REACION DEL PUENTE CARLOS Y ACCESOS, DISTRITO DE INAMBARI - PROVINCIA DE TAMBOPATA - REGIÓN MADRE DE DIOS	CONSULTORIA DE OBRA	7,693,263.21	CONSORCIO VIAL QUERECOTILLO - DOHWA ENGINEERING CO., LTD. SUCURSAL DEL PERU - AZIZE INGENIEROS S.A.C.
23	-	PROVIAS DESCENTRALIZADO	2413430	FALTA CONTRATO	SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3S (COMBAPATA) - HUATUCCANE - JAYUNBAMBA - PTE. CIRCUITO SALLCA - EMP. CU-1452 (CULLCUYRE), EMP. PE-3S - DV. HUANTURA - CHIARA - DV. LAULLINI - CULLCUYRE - EMP. CU-1450, DISTRITO DE COMBAPATA - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	CONSULTORIA DE OBRA	2,565,299.87	CONSORCIO SUPERVISOR CUSCO - DOHWA ENGINEERING CO., LTD. SUCURSAL DEL PERU - ANA BERTHA RIOS PADILLA
24		PROVIAS DESCENTRALIZADO	SNIP S/N	FALTA CONTRATO	Elaboración de la ficha técnica estándar y expediente técnico de obra del proyecto: Mejoramiento del camino vecinal Emp. HV-124 (Santa Cruz de Ila) ¿ Carapampa ¿ Pichus ¿ Manzanapampa ¿ Pongora ¿ Santa Cruz de Inyacc; en los distritos de Pazos, Huaribamba y Pichos de la provincia de Tayacaja ¿ depar	CONSULTORIA DE OBRA		CONSORCIO - CONSORCIO TAYACAJA - DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU - DREMC CONSULTORES S.A.
25	2/09/2019	PROVIAS DESCENTRALIZADO	2001621	131-2019-MTC/21	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL POR NIVELES DE SERVICIO DE LOS PROYECTOS PAQUETE: 05: CORREDOR VIAL 23: CORREDOR SAN MARTIN-HUÁNUCO-UCAYALI, CORREDOR VIAL 24: UCAYALI, CORREDOR VIAL 25: HUÁNUCO-PASCO, CORREDOR VIAL 26: JUNIN, CORREDOR VIAL	SERVICIO	10,780,745.01	CONSORCIO VIAL P5 - DOHWA ENGINEERING CO., LTD. SUCURSAL DEL PERU - CONSULTORA DE ESTUDIOS Y SUPERVISION S.A.
26	23/08/2019	PROVIAS DESCENTRALIZADO	2001621	129-2019-MTC/21	Servicio de Estudios de Preinversión a nivel de Perfil por niveles de servicio de los proyectos PAQUETE 11: Corredor Vial N°40: Puno II, Corredor Vial N°41: Arequipa - Moquegua II, Corredor Vial N°42: Tacna II, Corredor Vial N°39: Puno I	SERVICIO	7,249,111.00	CONSORCIO VIAL AD - DOHWA ENGINEERING CO., LTD. SUCURSAL DEL PERU - WILLIAN SALVATIERRA VEGA
27	-	PROVIAS DESCENTRALIZADO	2001621	FALTA CONTRATO	Servicio de Estudio de Preinversión a nivel de Perfil por niveles de servicio de los proyectos PAQUETE 09: Corredor Vial N° 33: Ica, Corredor Vial N° 34: Ica-Ayacucho - Arequipa		7,212,877.79	CONSORCIO CORREDOR VIAL P6 - FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL - ALPHA CONSULT S.A.

28	25/10/2022	PROVIAS DESCENTRALIZADO	2426993	194-2022-MTC/21	CREACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ANDA - YACUSISA PACAE - MONTERO TABACALERA - CERRO AZUL - PACAE ALTO SANGAPILLA - ALTO BELEN, EN LOS DISTRITOS DE SANTO DOMINGO DE ANDA , JOSE CRESPO Y CASTILLO Y PUEBLO NUEVO DE LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	CONSULTORIA DE OBRA	4,795,323.10	PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL PERU
29	23/07/2019	PROVIAS DESCENTRALIZADO	CUI 2001621	107-2019-MTC/21	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL POR NIVELES DE SERVICIO DE LOS PROYECTOS, PAQUETE 02: CORREDOR VIAL 15: AMAZONAS - CAJAMARCA, CORREDOR VIAL 16: LORETO, CORREDOR VIAL 17: CAJAMARCA, CORREDOR VIAL 19: LA LIBERTAD	SERVICIO	7,780,070.00	CONSORCIO CORREDOR SANTA ANA - PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL PERU - TOPOCAD INGENIEROS SRL
30	19/08/2019	PROVIAS DESCENTRALIZADO	CUI 2001621	124-2019-MTC/21	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL POR NIVELES DE SERVICIO DE LOS PROYECTOS, PAQUETE 03: CORREDOR VIAL 18: CAJAMARCA - LA LIBERTAD II, CORREDOR VIAL ALIMENTADOR 20: LA LIBERTAD III, CAJAMARCA - LA LIBERTAD	SERVICIO	7,802,956.00	CONSORCIO CORREDOR SAN JOSE - TOPOCAD INGENIEROS SRL - PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL PERU
31	6/08/2019	PROVIAS DESCENTRALIZADO	CUI 2001621	115-2019-MTC/21	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL POR NIVELES DE SERVICIO DE LOS PROYECTOS PAQUETE: 08: CORREDOR VIAL 37: CUSCO II	SERVICIO	7,237,248.11	CONSORCIO CORREDORES VIALES - PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL PERU - HIDROENERGIA CONSULTORES EN INGENIERIA S RL - SUTAY E.I.R.L.
32	23/08/2019	PROVIAS DESCENTRALIZADO	CUI 2001621	128-2019-MTC/21	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL POR NIVELES DE SERVICIO DE LOS PROYECTOS PAQUETE: 07: CORREDOR VIAL 28: LIMA-ICA-HUANCAVELICA, CORREDOR VIAL 31: CUSCO-MADRE DE DIOS II, CORREDOR VIAL 32: CUSCO-	SERVICIO	7,788,142.00	CONSORCIO CORREDOR SAN MIGUEL - PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL PERU - TOPOCAD INGENIEROS SRL - EPCM CONSULTING SAC

33	27/09/2019	PROVIAS DESCENTRALIZADO	SNIP 242482	149-2019- MTC/21	Mantenimiento Periódico del camino vecinal Dv. Saywite - Cachora, Distrito de SanPedro de Cachora, Provincia de Abancay, Región Apurímac	OBRA	7,242,768.98	CONSORCIO VIAL APURIMAC - WEIHAI CONSTRUCTION GROUP COMPANY LIMITED - JAGUI S.A.C.
34	10/10/2019	PROVIAS DESCENTRALIZADO	SNIP 222275	155-2019-MTC/21	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SALLIQUE- CHALANMACHE.	OBRA	26,385,131.05	CONSORCIO SACHA - CONSTRUCTORA ATLANTICO S.A.C. - WEIHAI CONSTRUCTION GROUP COMPANY LIMITED - BLUE HORIZON S.A.C.

ANEXO VI CONTRATOS PROVIAS NACIONAL CON LAS EMPRESAS CHINAS

EMPRESAS CHINAS QUE HAN CONTRATADO CON EL ESTADO DESDE EL 2018 AL 2022

N	Fecha Contrato	Entidad Contratante	CUI/SNIP	CONTRATO	Descripcion del Proyecto	Tipo de Contratacion	Monto Adj. S/.	Contratista
1	28/01/2021	PROVIAS NACIONAL	CUI 2392866		SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: MOLINOPAMPA - PTE. HUARACHIRI - PASACANCHA - ANDAYMAYO - POMABAMBA - PISCOBAMBA - SAN LUIS - EMP. PE-14B (HUARI)	SERVICIO	199,734,934.04	CONSORCIO CARRETERA MOLINOPAMPA -CHINA RAILWAY N: 10 ENGINEERING GROUP LIMITED -GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR ASOCIADOS S.A.C. – GC Y C.A. SAC
2	19/10/2021	PROVIAS NACIONAL	CUI:2393145	103-2021-MTC/20.2	SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: CHAMAYA (DV. OLMOS) - JAÉN- otros	SERVICIO	15,834,752.18	CONSORCIO BELLAVISTA -CHINA RAILWAY N: 10 ENGINEERING GROUP LIMITED -GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR ASOCIADOS S.A.C. – GC Y C.A. SAC.
3	9/11/2020	PROVIAS NACIONAL	CUI:2392901		CONTRATACION DEL SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO)- CUMBA-DV. YAMON-LONYA GRANDE - CAMPO REDONDO- OCALLI- PROVIDENCIA-COHECHAN-LONYA CHICO-EMP. AM -108(DV. LUYA)/CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA- ABRA LAJAS / EL DORADO - SELVA ALEGRE -SORITOR -EMP.PE - 5N (LA CALZADA)	SERVICIO	244,096,634.07	CONSORCIO ABRA LAJAS -CHINA RAILWAY N: 10 ENGINEERING GROUP LIMITED -GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR ASOCIADOS S.A.C. – GC Y C.A. SAC.
4	6/11/2019	PROVIAS NACIONAL	-	130-2019 - MTC/20.2	SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL PATIVILCA - CONOCOCHA - HUARAZ - CARAZ - MOLINOPAMPA y EMP 3N - CHIQUIAN - AQUIA - EMP 3N.	SERVICIO	41,794,110.96	CHINA RAILWAY N: 10 ENGINEERING GROUP LIMITED
5	24/01/2020	PROVIAS NACIONAL	-	010-2020 - MTC/20.2	CONTRATACION DEL SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: MOLINOPAMPA - PTE. HUARACHIRI - PASACANCHA-ANDAYMAYO-POMABAMBA-PISCOBAMBA-SAN LUIS-EMP.PE-14 B (HUARI)	SERVICIO	195,295,162.15	CONSORCIO POMABAMBA -CHINA RAILWAY N: 10 ENGINEERING GROUP LIMITED -CANTON LIMA SAC

6	10/09/2018	PROVIAS NACIONAL	-	103-2018 - MTC/20.2	SERVICIO DE GESTIÓN Y, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: PRO REGIÓN PUNO PAQUETE 03: PE - 34R, PE - 35Q Y PE - 3SR	SERVICIO	137,629,167.53	CONSORCIO VIAL SUR PERU -CHINA RAILWAY N: 10 ENGINEERING GROUP LIMITED -CONSTRUCTORA & CONTRATISTAS GENERALES PHILADELFIA S.A.C. - CONPHIL S.A.C.
7	30/12/2021	PROVIAS NACIONAL	-	124-2021 - MTC/20.2	SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: EMP.PE-3S (DV ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA - DV CHALLHUAHUACHO - SANTO TOMAS - VELILLE - YAURI - HECTOR TEJADA - EMP.PE-3S (AYAVIRI)	SERVICIO	180,582,158.74	CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERU
8	7/07/2021	PROVIAS NACIONAL	CUI:2282760	057-2021 - MTC/20.2	CONSTRUCCION DE TUNEL Y ACCESOS	OBRA	166,167,111.89	CONSORCIO CARRETERA CUSCO -CHINA RAILWAY N: 10 ENGINEERING GROUP LIMITED -CONSTRUCTORA & CONTRATISTAS GENERALES PHILADELFIA S.A.C. - CONPHIL S.A.C.
9	15/04/2021	PROVIAS NACIONAL	Snip: 268229	044-2021-MTC/20.2	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUENTE PICHARI EN EL KM. 15+825 DE LA VIA NACIONAL PE-28C	OBRA	17,215,644.90	CONSORCIO CUSCO PUENTE PICHARI -EEA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. - CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU
10	12/04/2021	PROVIAS NACIONAL	-	043-2021-MTC/20.2	SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: EMP. PE-1S (DV. SAN VICENTE DE CAÑETE) - DV. AUTOPISTA LA QUEBRADA - LUNAHUANA - DV. YAUYOS - RONCHAS - CHUPACA - HUANCAYO - DV. PAMPAS	SERVICIO	62,560,511.12	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU
11	9/11/2021	PROVIAS NACIONAL	-	110-2021-MTC/20.2	SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: EMP. PE- 04B -SONDOR - SOCCHABAMBA - VADO GRANDE.	SERVICIO	125,466,346.27	CONSORCIO VIAL SONDOR VADO GRANDE -INIP INGENIERIA INTEGRACION DE PROYECTOS S.A.C. -CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU

12	-	PROVIAS NACIONAL	RES-PROC-1-2020-MTC/20.UZAYA-2	FALTA CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO - SAMUGARI / SAMUGARI - CHIQUINTIRCA / CHIQUINTIRCA - SAN MIGUEL	SERVICIO	34,800,175.20	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU
13	14/10/2020	PROVIAS NACIONAL	-	056-2020-MTC/20.2	SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: EMP. PE-3SF (QUEHUIRA) - PTE ICHURAY - PTE SAYHUA - DV. CCAPACMARCA - DV. COLQUEMARCA - DV. HUINCHO	SERVICIO	151,131,833.17	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU
14	26/03/2021	PROVIAS NACIONAL	-	038-2021 -MTC/20.2	SERVICIO DE RECICLADO Y RECAPEO DE LA CARRETERA PANAMERICANA SUR, TRAMO: ATICO - DV. QUILCA (KM 709+000 - KM 852+500)	SERVICIO	100,054,277.09	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU
15	8/06/2021	PROVIAS NACIONAL	Snip: 172973	FALTA CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA	OBRA	333,898,191.36	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU
16	19/10/2021	PROVIAS NACIONAL		104-2021- MTC/20.2	SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: SULLANA - TUMBES - PUENTE LA PAZ / OVALO ZARUMILLA - AGUAS VERDES / SULLANA - EL ALAMOR / SULLANA - TAMBOGRANDE	SERVICIO	105,981,236.16	CONSORCIO VIAL SULLANA TAMBOGRANDE -INIP INGENIERIA INTEGRACION DE PROYECTOS S.A.C. - CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU
17	23/08/2021	PROVIAS NACIONAL	-	083-2021-MTC/20.2	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: ILO - TACNA - TRIPARTITO y OVALO TRIPARTITO - COLLPA	SERVICIO	65,744,448.41	CONSORCIO VIAL GOUPO TRIPARTITO -INIP INGENIERIA INTEGRACION DE PROYECTOS S.A.C. - CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU

18	8/11/2021	PROVIAS NACIONAL		109-2021-MTC/20.2	SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: "DV. HUMAJALSO - DESAGUADERO Y TACNA - TARATA - CAPAZO - MAZOCRUZ"	SERVICIO	116,510,080.93	CONSORCIO CONSERVACION VIAL MAZOCRUZ -INIP INGENIERIA INTEGRACION DE PROYECTOS S.A.C. - CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU
19	-	PROVIAS NACIONAL	(PROCESO) CP-SM-30-2019-MTC/20-	FALTA CONTRATO	(PROCESO) CP-SM-30-2019-MTC/20-	SERVICIO	195,295,162.15	CONSORCIO POMABAMBA CANTOM
20	20/12/2018	PROVIAS NACIONAL	SNIP 116051 CUI 2234355	167-2018-MTC/20.2	OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYÓN - AMBO, TRAMO II: DESVIO CERRO DE PASCO (KM.181+000) - DV. CHACAYÁN (KM.230+000).	OBRA	444,229,695.84	CONSORCIO VIAL SAMEGUA -CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED -EIVI SAC
21	6/10/2021	PROVIAS NACIONAL	2327694	100-2021-MTC/20.2	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO CREACIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUÍ	CONSULTORIA DE OBRA	3,173,063.24	CONSORCIO RUPA RUPA - DOHWA ENGINEERING CO., LTD. SUCURSAL DEL PERU - AZIZE INGENIEROS S.A.C.
22	20/07/2021	PROVIAS NACIONAL	2188523	070-2021-MTC/20.2	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUENTE PICHARI EN EL KM. 15+852 DE LA VIA NACIONAL PE-28C	CONSULTORIA DE OBRA	3,266,166.65	CONSORCIO RUPA RUPA - DOHWA ENGINEERING CO., LTD. SUCURSAL DEL PERU - VERA & MORENO CONSULTORES DE INGENIERIA.
23	8/05/2019	PROVIAS NACIONAL	2253253	001-2020-MTC/20.2	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ACOS-HUAYLLAY PROVINCIA DE HUARAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA Y LA PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	CONSULTORIA DE OBRA	6,170,629.19	CONSORCIO - CONSORCIO VIAL AD - DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU - ALPHA CONSULT S.A.

24	7/04/2021	PROVIAS NACIONAL	SNIP 355479	040-2021-MTC/20.2	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: REEMPLAZO DEL PUENTE SAN FRANCISCO EN LA RED VIAL NACIONAL RUTA PE-28B - LA QUINUA - TAMBO - SAN FRANCISCO	CONSULTORIA DE OBRA	2,996,127.35	CONSORCIO VIAL PUENTE NACIONAL SAN FRANCISCO - DOHWA ENGINEERING CO., LTD. SUCURSAL DEL PERU - ANA BERTHA RIOS PADILLA
25	5/08/2021	PROVIAS NACIONAL	2266239	77-2021-MTC/20.2	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO CREACIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO DE TUMBES	CONSULTORIA DE OBRA	5,306,577.58	CONSORCIO VIAL TUMBES - DOHWA ENGINEERING CO., LTD. SUCURSAL DEL PERU - LEON & GODOY CONSULTORES CIA. LTDA - VERA & MORENO S.A. CONSULTORES DE INGENIERIA
26	28/12/2021	PROVIAS NACIONAL	SNIP S/N	119-2021-MTC/20.2.	ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL PARA LA RUTA NACIONAL PE-1N: CARRETERA LONGITUDINAL DE LA COSTA, TRAMO: SULLANA - DV. PUENTE INTERNACIONAL	SERVICIO	6,500,000.00	CONSORCIO RUTA LONGITUDINAL - PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL PERU - HARIUS CONSULTING ENGINEERS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - HARIUS S.A.C.
27	7/01/2019	PROVIAS NACIONAL	SNIP S/N	001-2019-MTC/20.2	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL "PRO REGIÓN PUNO - PAQUETE 03: PE-34R, PE-3SQ y PE-3SR".	SERVICIO	14,592,809.82	CONSORCIO PUNO 3 - NAYLAMP INGENIEROS S.A.C. - TOPOCAD INGENIEROS SRL - PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL PERU
28	9/11/2020	PROVIAS NACIONAL	SNIP 2478179	062-2020-MTC/20.2	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. TORATA - LIMITE REGIONAL AREQUIPA - MOQUEGUA, TRAMO: PUQUINA - CHACAHUAYO	CONSULTORIA DE OBRA	2,424,127.24	PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL PERU

29	16/01/2019	PROVIAS NACIONAL	SNIP S/N	04-2019-MTC/20.2	SERVICIO DE SUPERVISIÒN DE LA GESTIÒN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÒN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: "EMP. PE-3S (CONCEPCIÒN) - COMAS - EMP. PE-5S (SATIOPO) / EMP. PE-5S (PTO. OCOPA) - ATALAYA / EMP. PE-5S (DV. BAJO KIMIRIKI) - BUENOS AIRES - PTO. PRADO - MAZAROBENI - CAMAJENI - POYENI".	SERVICIO	15,112,277.84	CONSORCIO VIAL SATIPO - PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL PERU - TOPOCAD INGENIEROS SRL - NAYLAMP INGENIEROS S.A.C.
30	24/06/2021	PROVIAS NACIONAL	SNIP 2434	063-2021-MTC/20.2	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO CULMINACIÒN DE LA OBRA REHABILITACIÒN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA - PUCALLPA Tramo: Puente Chino - Aguaytia, Sectores Dañados	CONSULTORIA DE OBRA	2,235,852.56	PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL PERU
31	12/10/2021	PROVIAS NACIONAL	SNIP 10447	101-2021-MTC/20.2	ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CULMINACIÒN DE LAS OBRAS DE LA CARRETERA LONGITUDINAL DE LA SIERRA (PE-3N), TRAMOS: SAN MARCOS -CAJABAMBA, COCHABAMBA - CHOTA, HUALGAYOC - DV. YANACOCOA, EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA Y EL SECTOR: HUAMACHUCO - SACSACOCOA - PUENTE PALLAR EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	CONSULTORIA DE OBRA	4,586,245.83	PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL PERU
32	21/05/2018	PROVIAS NACIONAL	CUI 2001621	043-2018-MTC/20	REFORMULACIÒN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÒN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÒN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUBANTA - ANAPATI - YOYATO - VALLE ESMERALDA - PICHARI - EMP. PE 28 B (QUIMBIRI), INCLUYE PUENTE SOBRE RIO ENE	SERVICIO	2,473,623.92	CONSORCIO CUBANTIA - PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL PERU - MTV PERU E.I.R.L.

33	16/03/2021	PROVIAS NACIONAL	SNIP 2392866	032-2021-MTC/20.2	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA GENERAL PARA LA SUPERVISION DEL SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL DE LA CARRETERA MOLINOPAMPA - PTE. HUARACHIRI - PASACANCHA - ANDAYMAYO - POMABAMBA - PISCOBAMBA - SAN LUIS - EMP. PE - 14B (HUARI) POR NIVELES DE SERVICIO	SERVICIO	19,000,570.19	CONSORCIO VIAL MOLINOPAMPA - ELEVE PROJECT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL PERU
34	19/02/2021	PROVIAS NACIONAL	SNIP 2392901	029-2021-MTC/20.2	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA GENERAL PARA LA SUPERVISION DEL SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: EMP. PE - 5N (CORRAL QUEMADO) - CUMBA - DV. YAM¿N - LONYA GRANDE - CAMPO REDONDO - OCALLI - PROVIDENCIA - COHECHAN - LONYA CHICO - EMP. AM. 108 (DV. LUYA) / CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA - ABRA LAJAS / EL DORADO - SELVA ALEGRE - SORITOR - EMP. PE - 5N (LA CALZADA)	SERVICIO	22,503,340.00	CONSORCIO SUPERVISOR LA CALZADA - GEOTECNIA Y MECANICA DE SUELOS S.A.C - PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL PERU
35	19/01/2022	PROVIAS NACIONAL	SNIP 107953	01-2022-MTC/20.2	SUPERVISI¿N DE LA OBRA: CULMINACI¿N DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME PE-5N (LA CALZADA), TRAMO: SELVA ALEGRE - EMPALME PE-5N (LA CALZADA)	CONSULTORIA DE OBRA	3,799,999.63	CONSORCIO SUPERVISOR ALEGRE LA CALZADA - PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL PERU - GEOTECNIA Y MECANICA DE SUELOS S.A.C
36	16/05/2018	PROVIAS NACIONAL	SNIP 4588	040-2018-MTC/20	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO CONSTRUCCI¿N Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHIMBOTE - TOCACHE, SECTOR: YUNGAYPAMPA TRES CRUCES - SIHUAS - HUACRACHUCO - UCHIZA - EMP. RUTA 05N - TOCACHE, TRAMO: PUENTE EL CHORRO - TRES CRUCES - SIHUAS - HUACRACHUCO - UCHIZA - EMP. RUTA 05N - SUBTRAMO: C.P AJENJO - UCHIZA - EMP. RUTA 05N	CONSULTORIA DE OBRA	3,085,800.00	CONSORCIO GEODATA PYUNGHWA - GEODATA ENGINEERING S.P.A. EN EL PERU - PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL PER
37	9/11/2020	PROVIAS NACIONAL	SNIP 336084	061-2020-MTC/20.2	ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUTINA - DV. ANANEA - CUYOCUYO - SANDIA TRAMO I: PUTINA - DV. ANANEA.	CONSULTORIA DE OBRA	4,086,368.85	CONSORCIO VIAL PUTINA - PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL PERU - CATALUÑA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

38	5/12/2019	PROVIAS NACIONAL	SNIP S/N	169-2019-MTC/20.2	SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: EMP. PE-3S (CONCEPCION)-COMAS-EMP. PE 5S (SATIPO) / EMP. PE-5S (PTO. OCOPA)-ATALAYA / EMP. PE-5S (DV. BAJO KIMIRI)-BUENOS AIRES-PTO. PRADO-MAZAROBENI-CAMAJENI-POYENI	SERVICIO	235,016,050.74	CONSORCIO VIAL COMAS - WEIHAI CONSTRUCTION GROUP COMPANY LIMITED - RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA SUCURSAL DEL PERU - TABLEROS Y PUENTES S.A. SUCURSAL DEL PERU - TERMIREX S.A.C.
----	-----------	------------------	----------	-------------------	--	----------	----------------	---

ANEXO VII CONTRATOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES CON LAS EMPRESAS CHINAS

EMPRESAS CHINAS QUE HAN CONTRATADO CON LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES DESDE EL 2018 AL 2022

N	Fecha Contrato	Entidad Contratante	CUI/SNIP	Descripcion del Proyecto	DETALLE	Monto Adj. S/.	Contratista
1	29/12/2021	GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL	CUI 2173359	EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA NINACACA-HUACHON PROVINCIA PASCO-REGION PASCO" CON CUI 2173359	OBRAS	87,979,956.18	CONSORCIO VIAL NINACACA HUACHON -CONSTRUCCION - CONSULTORIA H & AR CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERU
2	24/04/2017	MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	SNIP 128903	CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE TRAMO:RAFAEL ESCARDO-JR VIRU,DISTRITO DE SAN MIGUEL LIMA-LIMA	OBRAS	287,398,848.48	CONSORCIO VIAL COSTA - CORPORACION MAYO S.A.C. - CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERU
3	6/01/2021	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA SEDE CENTRAL	CUI 2193411	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA-YAULI-PAUCAPAMPA(RUTA HV-112)	OBRAS	168,571,515.92	CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERU
4	24/05/2021	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN SEDE CENTRAL	CUI 2200807	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA:"MEJORAMIENTO DE LA I.E. MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO JUNIN"-SALDO DE OBRA 1RA ETAPA	OBRAS	67,245,585.16	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU
5	6/10/2021	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA SEDE CENTRAL	CUI 2331865	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CASTROVIRREYNA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	OBRAS	50,900,000.00	CONSORCIO EJECUTOR DE SALUD CASTROVIRREYNA -CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU -INIP INGENIERIA INTEGRACION DE PROYECTOS S.A.C.
6	10/12/2020	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CUI 2112981	Contratacion de Ejecuci3n de la Obra: Mejoramiento Carretera CA-103: EM. PE-06B (Santa Cruz de Succhubamba) - Romero Circa - La Laguna - Tongod - Catilluc - Emp. PE - 06 C (El Empalme) - Cajamarca.	OBRAS	88,760,837.60	CONSORCIO CARRETERA CAJAMARCA -CHINA RAILWAY N: 10 ENGINEERING GROUP LIMITED - GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR ASOCIADOS S.A.C. – GC Y C.A. SAC.
7	14/02/2019	MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	CUI:	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. SAN LUIS, TRAMO AV. JAVIER PRADO AV. MÉXICO, AV. DEL AIRE Y AV. AGUSTÍN DE LA ROSA TORO, DISTRITO DE SAN BORJA, SAN LUIS Y LA VICTORIA, LIMA LIMA (OBRA)	OBRAS	14,950,080.00	CONSORCIO CC2
8	1/02/2019	GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL	SNIP	Ejecuci3n de Obra: Mejoramiento y ampliaci3n de la Cobertura de los servicios de Salud del Hospital Ernesto Germ3n Guzm3n Gonzales, Distrito y Provincia Oxapampa, Regi3n Pasco	OBRAS	104,783,192.84	CONSORCIO OXAPAMPA SALUD

9	20/12/2018	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAÑADA	CUI	EJECUCIÒN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA CP OTUZCO CP COMBAYO PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA	OBRAS	90,627,170.86	CONSORCIO LA ENCAÑADA
10	7/09/2021	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central	SNIP	EJECUCION DE SALDO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI, CALLALLI, SIBAYO CAYLLOMA; PROVINCIA DE CAYLLOMA REGION AREQUIPA - II ETAPA, TRAMO 01; KM 0+000 - KM 11 + 000 - KM 12+000 - KM 22+000 - KM 23+000 - KM 36+920 Y RAMAL 02 KM 0+	OBRAS	189,820,194.39	CONSORCIO VIAL CAYLLOMA
11	17/01/2019	GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL	SNIP	EjecuciÒn de Obra: Mejoramiento del Acceso de la PoblaciÒn a los Servicios del Centro de Salud Fredy Vallejo Orç, Distrito Yanahuanca, Provincia Daniel Alcides CarriÒn, RegiÒn Pasco	OBRAS	87,571,611.73	CONSORCIO PASCO VIDA
12	28/12/2020	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-GERENCIA SUB-REGIONAL CUTERVO	SNIP	EJECUCION SALDO DE OBRA: ¿CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SANTA MARIA NIVEL II-1- PROVINCIA DE CUTERVO-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	OBRAS	67,789,450.70	CONSORCIO HOSPITALARIO SANTA MARÍA
13	6/10/2021	EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.	SNIP	EjecuciÒn de la Obra del proyecto: ¿MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA PROLONGACIÒN AV. REVOLUCIÒN (PASAMAYITO) TRAMO CA. JULIO CESAR TELLO - AV. MIGUEL	OBRAS	54,793,945.15	CHINA RAILWAY N° 10 ENGINEERING GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERU
14	10/12/2020	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	SNIP	Contratacion de SupervisiÒn de la Obra: Mejoramiento Carretera CA-103: EM. PE-06B (Santa Cruz de Succhubamba) - Romero Circa - La Laguna - Tongod - Catilluc - Emp. PE - 06 C (El Empalme) - Cajamarca.	CONSULTORIAS OBRAS	2,300,023.17	CONSORCIO SUPERVISOR SANTA CRUZ
15	16/07/2020	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUBREGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA	SNIP	CONTRATACIÒN DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA EJECUCIÒN DE OBRA: RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN R70 (EMP.PE-1NT) - SAUSAL DEL QUIROZ,	CONSULTORIAS OBRAS	581,223.46	CONSORCIO VIAL TAMBOGRANDE
16	18/06/2020	GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CUSCO	SNIP 2520169	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL CU-119 TRAMO I: EMP CU-117 (ABRARANRACCASA) - PACCARECTAMBO EMP PE 3SY (DESVIOPACMARCA) EM LOS DISTRITOS DE PARURO, PACCARECTAMBO, CCAPI Y CCAPACMARCA DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS Y PARURO DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO	SERVICIO	3,857,152.63	PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL PERU
17	18/06/2020	GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CUSCO	SNIP	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL CU-119 TRAMO II: EMP. PE 3SY (MUYUORCCO) - COLQUEMARCA EN LOS DISTRITOS DE CCAPAC	SERVICIO	2,383,529.44	PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL PERU

18	6/11/2020	GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS	SNIP 283399	EJECUCION DE LA OBRA:"MEJ. VIAS DEP. AM-106, TRAMO: EMP. PE-5N(BALZAPATA)	OBRAS	223,133,642.43	CONSORCIO VIAL KUELAP - VYH CONTRATISTAS GENERALES EIRL-RUC 20479683728 - NEGOCIOS Y CONSTRUCCIONES LITO E.I.E.L. - CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU
19	27/08/2020	GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS	SNIP 268544	EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERICIO DEL ACCESO A SERVICIOS DE SALUD DE SEGURIDAD NIVEL DE ATENCION EN EL AMBITO DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA DE LA PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA-REGION AMAZONAS"	OBRAS	82,168,819.24	CONSORCIO SAN NICOLAS -CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU -NEGOCIOS Y CONSTRUCCIONES LITO E.I.R.L.
20	2/07/2020	GOBIERNO REGIONAL PUNO	SNIP	EJECUCION DE LA OBRA:FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO	OBRAS	329,373,420.56	CONSORCIO HOSPITALARIO MANUEL NUÑEZ -CHINA RAYLWAY Nº10 ENGINEERING GROUP CO.,LTD SUCURSAL PERU -WEIHAI CONSTRUCTION GROUP COMPANY LIMITED
21	14/01/2020	GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD	SNIP	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL Nº014-2019-GRLL-GRCO, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:"CONTRATACION DE REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL 15.2 KM DE EMP.PE.10A (AGALLPAMPA)CHINCHAGO-JULCAN"	OBRAS	22,022,763.35	CONSORCIO JULCAN -JAGUI S.A.C. -WEIHAI CONSTRUCTION GROUP COMPANY LIMITED
22	22/12/2021	GOBIERNO REGIONAL CALLAO	SNIP 48520	EJECUCION DEL SALDO DE OBRA,CONSTRUCCION DE VIA COSTA VERDE-TRAMO CALLAO	OBRAS	116,308,466.02	CONSORCIO VIAL CALLAO -BIDDLE INC S.A.C. -SINOHYDRO CORPORATION LIMITED,SUCURSAL DEL PERU
23	4/12/2018	GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	SNIP 260477	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN FRANCISCO,SEGUNDO NIVEL DE ATENCION,AYNA-LA MAR-AYACUCHO		86,728,141.47	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED SUCURSAL DEL PERU
24	29/12/2020	GOBIERNO REGIONAL CUSCO	SNIP 245953	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA VIA EXPRESA DE LA CIUDAD DEL CUSCO:OVALO LOS LIBERTADORES-PUENTE COSTANERA-NODO VERSALLES		329,948,109.57	CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU
25	17/10/2018	GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	SNIP 267990 268482	EJECUCION DE LA OBRA:MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS UNIDADES PRODUCTORAS DE OS HOSPITALES DE CORACORA Y CANGALLO,PROV.DE PARINACOCAS Y CANGALLO REGION AYACUCHO	OBRAS	150,281,567.33	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED SUCURSAL DEL PERU

26	4/12/2018	GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	SNIP 260531	EJECUCION DE LA OBRA:MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDADES RESOLUTIVAS DE LOS HOSPITALES SAN MIGUEL Y SAN MIGUEL,SEGUNDOS NIVELES DE ATENCION EN LA PROVINCIA DE LA MAR,REGION AYACUCHO	OBRAS	72,892,309.32	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED SUCURSAL DEL PERU
27	28/10/2019	GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	SNIP 259612	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE HUANTA DANIEL ALCIDES CARRION,DISTRITO DE HUANTA,PROVINCIA DE HUANTA,AYACUCHO	OBRAS	116,233,690.42	MAKIBER S.A. SUCURSAL PERU
28	3/11/2020	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN SEDE CENTRAL	SNIP	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGO, DISTRITO DE PANGO, PROVINCIA DE SATIPO, JUN¿N¿.	OBRAS	94,973,251.09	CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD. SUCURSAL PERU
29	14/09/2020	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUBREGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA	CUI 2450680	CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN PI-676 (EMP. PI-110) - LA ARCANA - SAN JOS¿ DE CALVAS DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - PIURA, CON C¿DIGO ¿NICO DE INVERSIONES (IRI) N¿2450680	OBRAS	15,504,104.58	CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU
30	22/12/2021	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	SNIP	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PUENTE RAMIRO PRIALE, CRUCE AUTOPISTA RAMIRO PRIALE CON EL RIO HUAYCOLORO DEL DISTRITO DE LURIGANCHO - LIMA -LIMA, CUI 2490911	OBRAS	61,971,648.01	CONSORCIO AUTOPISTA PRIALE CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU
31	5/08/2022	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN SEDE CENTRAL	SNIP	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA DISTRITO DE PICHANAQUI PROVINCIA DE CHANCHAMAYO DEPARTAMENTO DE JUNIN	OBRAS	187,075,508.96	CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU
32	8/11/2022	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN SEDE CENTRAL	SNIP	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO-REGI¿N JUN¿N"	OBRAS	179,013,502.43	CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU
33	30/07/2020	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUBREGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA	CUI 2450825	CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN R70 (EMP.PE-1NT) - SAUSAL DEL QUIROZ, DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA ¿ PIURA, con c¿digo ¿nico de inversiones (IRI) N¿2450825	OBRAS	19,320,471.54	CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU
34	10/07/2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO - SAN PEDRO DE LLOC	SNIP	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA CARRETERA A PUEMAPE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PROVINCIA DE PACASMAYO- LA LIBERTAD.	OBRAS	7,791,129.51	CONSORCIO SP WEIHAI CONSTRUCTION GROUP COMPANY LIMITED

35	25/06/2019	GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL	SNIP	Ejecución de la Obra: Construcción de la Carretera Tramo Cerro de Pasco - La Quinua, Distrito Yanacancha, Provincia y Región Pasco	OBRAS	31,009,878.88	CONSORCIO VIAL PASCO WEIHAI CONSTRUCTION GROUP COMPANY LIMITED
36	19/12/2019	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LANCONES	CUI 2458911	EJECUCIÓN DE OBRA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN DE VÍA VECINAL - PANALES - DON DIEGO - SAJINOS, DISTRITO DE LANCONES, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO PIURA", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N°2458911	OBRAS	7,461,934.15	VIA PANALES WEIHAI CONSTRUCTION GROUP COMPANY LIMITED
37	11/09/2020	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE CAURI	SNIP	EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL HUARASNANI - LAURICOCHA - 8 DE DICIEMBRE - INDEPENDENCIA, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CAURI - LAURICOCHA - HUANUCO¿ ¿ CODIGO UNICO 2128762	OBRAS	5,679,434.82	CONSORCIO EJECUTOR LAURICOCHA WEIHAI CONSTRUCTION GROUP COMPANY LIMITED
38	21/12/2018	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO	SNIP	EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL EMPALME R58 - RÍO MOCHE, LOCALIDAD DE LAREDO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN CAMINO VECINAL EMPALME PE - 10A CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL LAREDO - SAN CARLOS - DISTRITO DE LAREDO	OBRAS	4,508,023.04	CONSORCIO LAREDO NORTE WEIHAI CONSTRUCTION GROUP COMPANY LIMITED
39	23/12/2019	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUBREGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA	CUI 2450668	CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL EN RUTA PI-110 EMP. PE-3N (DIV. ESPÍNDOLA) - EL MOLINO - SAMANGUILLA - ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR), DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - PIURA, con código único de inversiones (IRI) N°2450668	OBRAS	66,304,422.05	CONSORCIO VIAL ESPINDOLA WEIHAI CONSTRUCTION GROUP COMPANY LIMITED
40	8/01/2020	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUBREGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA	CUI 2450749	CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN PI-712 (EMP.PI-708) LAGUNAS - ALTO LAGUNAS - LUCUMAL - CRUZ HUACAS - NUEVO PROGRESO - TAPUL - EMP.PI-717 (MÉJICO) DEL DISTRITO DE LAGUNAS - PROVINCIA DE AYABACA- PIURA, con código único de inversiones (IRI) N°2450749	OBRAS	25,742,777.58	CONSORCIO LAGUNAS WEIHAI CONSTRUCTION GROUP COMPANY LIMITED
41	5/09/2019	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI	SNIP	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN DEL NIVEL SECUNDARIO ANGEL LOPEZ CASTRO DE LA CC. NN. CAMANA, ZONAL BAJO URUBAMBA SUR, DISTRITO DE MEGANTONI, LA CONVENCION - CUSCO.	OBRAS	18,656,162.65	CONSORCIO MEGANTONI WEIHAI CONSTRUCTION GROUP COMPANY LIMITED
42	20/12/2019	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LANCONES	CUI 2460233	EJECUCIÓN DE OBRA DENOMINADA:"REHABILITACIÓN DE VÍA VECINAL PUEBLO NUEVO DE ROMEROS - LA MATANZA, DISTRITO DE LANCONES, PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N°2460233	OBRAS	6,852,537.87	CONSORCIO PUEBLO NUEVO WEIHAI CONSTRUCTION GROUP COMPANY LIMITED

43	25/02/2020	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOROS	SNIP	CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO, A NIVEL DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA DE LA CARRETERA CHOROS - EMPALME PE - 4N PUENTE CHAMAYA, DISTRITO DE CHOROS PROVINCIA DE CUTERVO REGION CAJAMARCA.	OBRAS	17,224,947.46	CONSORCIO VIAL AARON WEIHAI CONSTRUCTION GROUP COMPANY LIMITED
44	18/12/2019	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENOS AIRES - PICOTA	SNIP	EJECUCIÒN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CASERIO SANTA ROSILLO AL CASERIO SAN CRISTOBAL DE UPAQUIHUA, DISTRITO DE BUENOS AIRES, PICOTA ¿ SAN MARTIN¿	OBRAS	5,587,603.14	CONSORCIO VIAL JP WEIHAI CONSTRUCTION GROUP COMPANY LIMITED
45	20/12/2019	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LANCONES	CUI 2458916	EJECUCIÒN DE OBRA DENOMINADA: "REHABILITACIÒN DE V¿A VECINAL - CRUCE LA PE¿A - JERGUITAS, DISTRITO DE LANCONES, PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO PIURA", CON C¿DIGO ¿NICO DE INVERSIÒN N¿2458916	OBRAS	4,891,388.58	CONSORCIO VIAL LA PE¿A WEIHAI CONSTRUCTION GROUP COMPANY LIMITED
46	25/06/2019	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central	SNIP	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA VIA DEPARTAMENTAL AR-107, KM 0+000 HASTA KM 17+859, PAMPACOLCA - DV. TAGRE TIPAN - DISTRITO DE PAMPACOLCA - PROVINCIA DE CASTILLA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	OBRAS	11,887,773.52	CONSORCIO CMC WEIHAI CONSTRUCTION GROUP COMPANY LIMITED
47	8/11/2021	GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA	SNIP	EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA CCASAPATA-CHUÑUNAPAMPA-TINQUERCCASA-PADRE RUMI-PAUCARA"	OBRAS	185,751,354.74	CONSORCIO HUANCVELICA CENTRO HYDRO & POWER CONSTRUCTION GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL DEL PERU EMPRESA CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION
48	22/10/2017	GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL	SNIP	ContrataciÒn para EjecuciÒn de Obra: Mejora de la capacidad Resolutiva y Operativa del Hospital Rom¿n Egoavil Pando, Distrito Villa Rica, Provincia Oxapampa, RegiÒn Pasco.	OBRAS	114,318,830.30	CONSORCIO SAN CRISTÒBAL WEIHAI CONSTRUCTION GROUP COMPANY LIMITED
49	7/08/2020	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - PROYECTO ESPECIAL OLMOS - TINAJONES	SNIP	CONTRATACIÒN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÒN DEL EXPEDIENTE T¿CNICO :MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCIÒN TRASVASE HUALLABAMBA, MOTUPE"	SERVICIO	8,469,562.15	DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU
50	21/10/2020	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN SEDE CENTRAL	SNIP	CONTRATACIÒN DEL SERVICIO PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA. "CREACION DEL PUENTE COMUNEROS ENTRE LA AV. DANIEL ALCIDES CARRION Y C.A. MAX HONGLER EN LOS DISTRITOS DE HUANCAYO- HUAMANCACA CHICO, PROVINCIA DE HUANCAYO Y CHUPACA REGION JUNIN"	SERVICIO	3,859,331.22	CONSORCIO SUPERVISOR PUENTE COMUNEROS
51	11/03/2020	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACION HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA	SNIP	SERVICIO DE ELABORACIÒN DE EXPEDIENTE T¿CNICO DEL PROYECTO CREACIÒN DE REPRESA CASCAPAMPA PARA EL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, DISTRITO DE SONDRILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA.	SERVICIO	1,797,643.13	CONSORCIO PIURA COPE

52	11/11/2019	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central	SNIP	FORMULACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION CREACION DE SERVICIOS DE PRTOECCION QUEBRADA DE LEON , DISTRITO LA ESPERANZA- HUANCHACO	SERVICIO	2,260,999	CONSORCIO TRUJILLO COPE
53	22/05/2019	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - PROYECTO ESPECIAL OLMOS - TINAJONES	SNIP	CONTRATACI¿N DEL SERVICIO DE CONSULTOR¿A EN GENERAL PARA LA ELABORACI¿N DEL PLAN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS DE MASA DE LA CUENCA DEL RIO CHANCAY - LAMBAYEQUE	SERVICIO	10,332,977.44	CONSORCIO CHANCAY COPE
54	15/03/2021	GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL	SNIP	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJ. VIAS DEP. AM-106, TRAMO: EMP. PE-5N (BALZAPATA)- JUMBILLA- ASUNCION EMP.PE-8B (MOLINOPAMPA), AM-110: CHACHAPOYAS-LEVANTO: TRAMO: EMP.PE-8B (TINGO) AM- 111: EMP.PE-8B (TINGO)- LONGUITA- MARIA- KUELAP, PROV. CHACHAPOYAS- BONGARA Y LUYA- AMAZONAS"	SERVICIO	11,826,728.94	DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU
55	27/04/2021	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN SEDE CENTRAL	SNIP	AMPLIACION Y MEJORMAIENTO DEL PUENTE NORUEGA DISTRITO DE PERENE SANTA ANA,PROVINCIA DE CHANCHAMAYO,REGION JUNIN.	SERVICIO	3,616,098.74	CONSORCIO SUPERVISOR PUENTE NORUEGA
